





2010

YILI
Faaliyet Raporu
Elazığ İl Özel İdaresi

İL ÖZEL İDARESİ
"HARPUT SÜT KALESİ"
ELAZIĞ



Büyük davamız, en medeni ve en müreffeh millet olarak varlığımızı yükseltmektir.

Bu, yalnız kurumlarında değil, düşüncelerinde temelli bir inkılap yapmış olan büyük

Türk Milletinin dinamik idealidir.

Bu ideali en kısa bir zamanda başarmak için fikir ve hareketi beraber yürütmek mecburiyetindeyiz.

Bu teşebbüste başarı ancak, türeli bir planla ve en rasyonel tarzda çalışmakla mümkün olabilir"

"Ancak geleceği düşünebilen milletler, yaşamak ve ilerlemek imkânlarına kavuşurlar"

Mustafa Kemal Atatürk

ELAZIĞ
İL ÖZEL İDARESİ

2010 YILI
FAALİYET RAPORU

Nazif BİLGİNOĞLU
Genel Sekreter

Ömer YALÇIN
Mali Hizmetler Müdürü

Selçuk HAVUÇGİL
Şef

Mustafa GÜR
Teknik Ressam

Fotoğraf
Şafak MERAL

Grafikkent
dijital baskı merkezi
dijital - serigrafi - ofset - grafik tasarım

Tel.:0424 236 74 95
Adres: İzzetpaşa Mh. Hacı Tevfik Efendi Sk.
No:4/B (A.Paşa Minibüs Durağı Yanı) ELAZIĞ

İÇİNDEKİLER


Üst Yönetici Sunuşu 2


Genel Bilgiler 8


Misyon ve Vizyon 10


Yetki - Görev ve Sorumluluklar 12


İdareye İlişkin Bilgiler 13


Diğer Hususlar 15


İdarenin Amaç ve Hedefleri 56


Temel Politikalar ve Öncelikler 66


Mali Bilgiler 68


Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler 97


Diğer Hususlar 19


Performans Bilgileri 98


Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi 99


Köylere Hizmet Götürme Birlikleri Faaliyetleri 112


Kurumsal Kapasitenin Değerlendirilmesi 180


Değerlendirme 184



5302 sayılı 'İl Özel İdaresi Kanunu' temelde yerel yönetim anlayışının yaygın ve etkin kılınması yaklaşımından hareketle oluşturulmuştur. Bu kanunun uygulamadaki etkinliği ve verimliliği noktasında ciddi katkılar sağlaması beklenen 5018 sayılı 'Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu' ile birlikte düşünüldüğünde, İl Özel İdareleri kurulduğu günden bu yana gerek yasal gerekse yapısal anlamda reform sayılabilecek çok önemli bir dönüşüm yaşamıştır.

5018 Sayılı Kanun, kamuda yapılan her türlü iş ve işlemi denetim altına almayı amaçlayarak, hesap verme sorumluluğu, mali saydamlık, hizmetlerde etkinlik ve verimlilik, doğruluk, tarafsızlık, tutarlılık ilkeleri yönünden yasal bir güvence sağlayarak, çağdaş bir yönetim anlayışının benimsenmesini amaçlamıştır.

Yerel yönetimlerin etkinliğinin arttırıldığı bir dönemde Elazığ İl Özel İdaresi, bütçesini hazırlarken halkın mahalli, müşterek nitelikteki yatırım hizmetlerine öncelik vermekte ve merkezi idarenin görevlerine katkı bağlamında merkezi idarenin ulaşamadığı en ücra köylere dahi hizmetlerin en rasyonel bir şekilde ulaşmasına gayret gösterilmektedir.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası; kanunların çerçevelediği şekilde mali durum, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenmektedir. Hizmetlerin vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulmasına gayret edilmektedir.

İl özel idaresi hizmetlerini, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunar. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Elazığ İl Özel İdaresi Elazığ halkının refah düzeyinin, yaşam kalitesinin ve memnuniyetinin artırılmasına katkı sağlamak amacıyla, çağın gereklerini de dikkate alarak en iyi şekilde hizmet vermenin mücadelesi içerisindedir. 2010 yılı içerisinde, gayet mütevazı bütçesiyle başta eğitim, sağlık ve köye yönelik hizmetler olmak üzere, kültür, turizm, gençlik ve spor, sosyal hizmetler, altyapı hizmetleri, tarım, ruhsat ve denetim hizmetleri, emniyet, afet yönetimi gibi birçok alanda projeler üreterek faaliyetlerine devam etmektedir.

Elazığ'ımız için çok önemli hizmetleri başarıyla gerçekleştiren Elazığ İl Öze İdaremizin, 2010 yılında yaptığı yatırım ve projelerinin kısa bir özeti niteliğinde olan ve bu anlamda bizlere öz eleştiri fırsatı da sunan 2010 Yılı Faaliyet Raporu İl Genel Meclisimizin bilgilerine sunarken, yeni çalışma döneminde başarılar dilerim.

Muammer EROL

Elazığ Valisi



Yerinden yönetim anlayışının öne çıktığı günümüzde, kaynakları etkin ve verimli kullanarak Elazığ'ımıza kaliteli hizmet vermek hepimizin olmazsa olmazıdır.

Günümüz kamu yönetimi anlayışının gereği olarak, sürece demokratik katılımı eklemek, şeffaf ve hesap verebilen bir yönetim oluşturulmasını sağlamak amacıyla yürürlüğe konulan, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, il özel idareleri için stratejik planı bir zorunluluk olarak öngörmektedir.

Bütçe hazırlama ve uygulama sürecinde mali disiplini sağlamak, kaynakları stratejik önceliklere göre dağıtmak, bu kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığını izlemek ve bunun üzerine kurulu bir hesap verme sorumluluğu geliştirmek için stratejik planlamanın en temel unsuru tartışmasız faaliyet raporlarıdır.

2010 yılının özetini yapan verilen hizmetlerin anlatıldığı, kanun ve yönetmelik hükümleri gereği hazırlanmış olan Elazığ İl Özel İdaresi 2010 yılı Faaliyet Raporu takdirlerinize sunulmuştur.

Her gecen gün hizmet kalitesini daha üst düzeye çıkarmak için üstün sorumluluk duygusu ile çalışan İl Özel İdaresi personeline, yapılan bu çalışmalara katkı sağlayan İl Genel Meclisi Üyelerimize, uyumlu bir çalışma ortamı hazırlayarak tüm hizmetlerin gerçekleşmesine vesile olan Sayın Valimiz Muammer EROL'a sonsuz saygı ve şükranlarımı arz ediyorum.

Aydın KARA

İl Genel Meclis Başkanı



Modern ve daha yaşanılabilir bir Elazığ için başlattığımız, devam eden biten ve çalışmalarla Elazığ'ımızın her yeri adeta bir şantiyeye dönmüş durumda.

Her geçen gün gelişerek büyüyen ve bölgesinde önemli bir cazibe merkezi konumunda bulunan şehrimizin çehresi, yaptığımız yatırım ve hizmetlerle ciddi anlamda değişmiş ve bu çalışmalar 2011 yılında da söz verdiğimiz gibi her şeyin en iyisini hak eden değerli hemşerilerimizin hizmetine sunmaya devam edeceğiz.

İnsan merkezli bir anlayıştan hareketle çalışmalarını sürdüren İl Özel İdaremiz, 2010 yılında yoğun bir çalışma temposu sergilemiştir.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarımızla koordineli yapılan çalışmalar neticesinde; içmesuyu, kanalizasyon, sulama suyu ve bununla birlikte afet konutları, 112 acil yardım istasyonları yapımı, toplum sağlık merkezleri, anaokulları, ilköğretim okulları, liseler, devam eden kültür merkezimiz, çocuk yuvalarımız saymakla bitirmeyeceğimiz hizmetlerimiz devam etmektedir.

Yoğun bir şekilde sürdürülen köylerin altyapı çalışmalarının yanı sıra

- Kent bilgi sistemi,
- Elazığ Kültür Merkezi İnşaatı,
- Toplum Sağlık Merkezleri,
- 112 acil yardım istasyonları,
- Afet konutları,
- Tarım faaliyetlerin desteklenmesi,
- Yeşillendirme ve fidan dikim çalışmalarıyla,
- Çocuk yuvaları ve yetiştirme yurdu,
- Semt sahaları yapımları,
- Mikro Kredi Desteğimiz,
- İşgem ve Teknokent desteklerimiz,

Kurumlarla yaptığımız işbirliği içinde devam eden projelerimizden bazılarıdır.

Tüm bunları yaparken kurumsal kapasitenin geliştirilmesi için 2010 yılında başlattığımız ve uzun bir yolculuk sonrası alamaya hak kazandığımız TS EN ISO 9001 2008 Kalite Yönetim Sistemi sertifikasını alamaya hak kazanmış bulunmaktayız.

Tüm bu hizmetleri Elazığ halkının takdirine sunarken, bizden desteklerini esirgemeyen Sayın Valimize, yapacağımız tüm hizmetlerde bize güç veren İl Genel Meclis Üyelerine, Elazığ İl Özel İdaresi ailesine sonsuz şükranlarımı bildirir "Elazığ İl Özel İdaresi 2010 Yılı Faaliyet Raporunu" takdirlerinize arz ederim.

Nazif BİLGİNOĞLU

Genel Sekreter




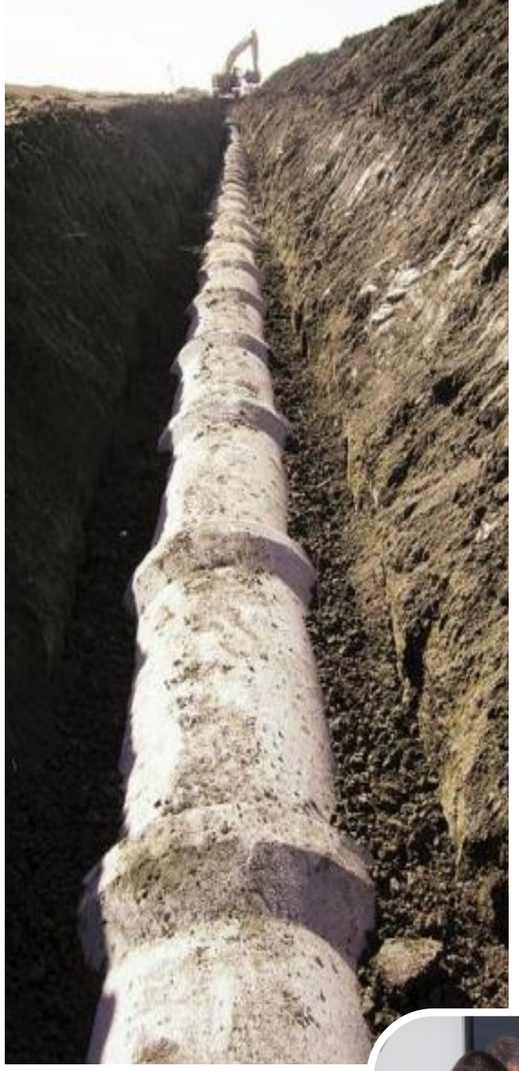







GENEL BİLGİLER

Misyonumuz

Elazığ İl Özel İdaresinin misyonu, kanunların verdiği yetki ve görevler çerçevesinde ildeki kişi ve kuruluşlara yönelik, başta eğitim, sağlık, tarım, çevre ve bayındırlık alanlarında olmak üzere tüm kamu hizmetlerini adil, katılımcılık, etkinlik, saydamlık, hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde yürütmek, ilin kaynaklarının bir plan dâhilinde ve akılcı biçimde dağıtımını ve kullanımını sağlamak ve sürdürülebilir bir kalkınmayı hedefleyerek halkın gelir seviyesini ve ilin refah düzeyini yükseltmektir.

Vizyonumuz

Elazığ İl Özel İdaresinin vizyonu, değişimi ve gelişmeyi benimseyen, toplumun her kesimiyle bütünleşen, bireyleri yaşadığı şehre katkı sağlamak için harekete geçiren, çağdaş, güvenilir, dinamik, insan odaklı yerinden yönetim anlayışını yerleştirmiş, kırsal ve kentsel alanlardaki farklılıkları en aza indirmiş, hizmet sunumunda kaliteyi esas alan ve Elazığ'ı 21.yüzyılda önemine layık olduğu noktaya getirmiş bir kurum olmaktır.

Yetki Görev ve Sorumluluklar

Gençlik ve spor Sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde,

İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında,yapmakla görevli ve yetkilidir.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, il özel idaresinin malî durumu, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir.

İl özel idaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Hizmetlerin diğer mahallî idareler ve kamu kuruluşları arasında bütünlük ve uyum içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon o ilin valisi tarafından sağlanır.



Mikro Kredi Merkezi Açılış Töreni

İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

1 - Fiziksel Yapı

1.1-Gayrimenkuller, Sosyal ve Yardımcı Tesisler

İL ÖZEL İDARESİ TAŞINMAZLARI				
S.No	TAŞINMAZIN ADI	ADRESİ	ALANI m2	AÇIKLAMA
1.	Hizmet Binası (1)	Sürsürü Mahallesi	33.407	Özel İdaresi Genel Sekreterliği
2.	Hizmet Binası (2)	Sürsürü Mahallesi	4.476	Akgün Otel Üstü
3.	Arsa	Sürsürü Mahallesi	4.000	Akgün Üstü
4.	Arsa	Sürsürü Mahallesi	5.902	Akgün Üstü
5.	Arsa	Sürsürü Mahallesi	8.157	Akgün Üstü
6.	Arsa	Sürsürü Mahallesi	10.000	Akgün Üstü
7.	Arsa	Sürsürü Mahallesi	40.552	Akgün Üstü
8.	Arsa	Sürsürü Mahallesi	25.000	Akgün Üstü
9.	Öğrenci Yurdu	Sürsürü Mahallesi	5.000	Akgün Üstü
10.	Arsa	Sürsürü Mahallesi	5.000	Akgün Üstü
11.	Akgün Otel	Sürsürü Mahallesi	22.940	Akgün Otel
12.	Harput Evi	Harput	2.165	Harput Kültür Evi
13.	Huzur Evi	Sürsürü Mahallesi	11.232	Gazi Huzurevi
14.	Vali Muharrem Göktayoğlu İş Merkezi	Rızaiye Mahallesi	680	9 Katlı Bina
15.	Halıcılık Okulu	İcadiye Mahallesi	1.285	Halıcılık Okulu
16.	Altınçevere İlköğretim Okulu	Altınçevre	3.124	Milli Eğitim Müdürlüğü Tahsisli
17.	Elazığ Spor Kompleksi	A.Demirtaş	26.800	117.729 m2 (Hazine)
18.	Vali Konağı	Sürsürü Mahallesi	7.083	2303 m2 (Hazine)
19.	Lojman	Yeni Mahallesi	308	Muzoğlu Apt.(3 Daire)
20.	Lojman	Nailbey Mahallesi	2.043	12 Daire
21.	Kapalı Oto Park	Nailbey Mahallesi		55 Araç Kapasiteli
22.	Lojman	Kültür Mahallesi	194	4 Daire
23.	Lojman	Sürsürü Mahallesi	5.387	Kampus içi lojman (40Daire)
24.	Hükümet Konağı	Harput	2.254	Elazığ Vilayeti
25.	Arsa(Kilise Yeri)	Harput	300	Elazığ Vilayeti
26.	Ermeni Kilse Yeri	Harput	1.180	Elazığ Vilayeti
27.	Zihinsel Engelliler Merkezi	Sürsürü Mahallesi	11.905	Zihinsel Engelliler Merkezi
28.	Atatürk İlköğretim Okulu	Sarayatik Mahallesi	3.639	Milli Eğitim Müdürlüğü Tahsisli
29.	İstiklal İlköğretim Okulu	Sanayi Mahallesi	3.332	Milli Eğitim Müdürlüğü Tahsisli
30.	Kazım Kara Bekir İlköğretim Okulu	Mornik Çatal Çeşme	5.145	Milli Eğitim Müdürlüğü Tahsisli
31.	Yücel İlköğretim Okulu	Rüstempaşa Mahallesi	6.050	Milli Eğitim Müdürlüğü Tahsisli
32.	G.Kamil Ayhan İlköğretim Okulu	Hüseynik Mahallesi	4.000	Milli Eğitim Müdürlüğü Tahsisli
33.	Fevzi Çakmak İlköğretim Okulu	İzzetpaşa Mahallesi	3.378	Milli Eğitim Müdürlüğü Tahsisli
34.	Murat İlköğretim Okulu	İzzetpaşa Mahallesi	7.015	Milli Eğitim Müdürlüğü Tahsisli
35.	Mezre İlköğretim Okulu	İzzetpaşa Mahallesi	4.500	Milli Eğitim Müdürlüğü Tahsisli
36.	Cumhuriyet İlköğretim Okulu	İzzetpaşa Mahallesi	5.111	Milli Eğitim Müdürlüğü Tahsisli
37.	Saim Çotur İlköğretim Okulu	İzzetpaşa Mahallesi	3.995	Milli Eğitim Müdürlüğü Tahsisli
38.	Cemal Gürsel İlköğretim Okulu	İzzetpaşa Mahallesi	4.064	Milli Eğitim Müdürlüğü Tahsisli
39.	Kaya Karakaya İlköğretim Okulu	Mustafapaşa Mahallesi	4.187	Milli Eğitim Müdürlüğü Tahsisli
40.	Namık Kemal İlköğretim Okulu	İzzetpaşa Mahallesi	5.045	Milli Eğitim Müdürlüğü Tahsisli
41.	Selçuklular İlköğretim Okulu	Kültür Mahallesi	1	Milli Eğitim Müdürlüğü Tahsisli
42.	Mehmet Zeki İlköğretim Okulu	Sürsürü Mahallesi	3	Milli Eğitim Müdürlüğü Tahsisli
43.	İsmetpaşa İlköğretim Okulu	İcadiye Mahallesi	5	Milli Eğitim Müdürlüğü Tahsisli
44.	Gazi İlköğretim Okulu	İcadiye Mah	5.562	Milli Eğitim Müdürlüğü Tahsisli
45.	60.Yıl İlköğretim Okulu	Kesrik Mahallesi	4.615	Milli Eğitim Müdürlüğü Tahsisli
46.	M.Mihri İlköğretim Okulu	İzzet Paşa Mahallesi	10.172	Milli Eğitim Müdürlüğü Tahsisli
47.	Koç İlköğretim Okulu	Sürsürü Mahallesi	10.479	Milli Eğitim Müdürlüğü Tahsisli
48.	H.Dağlı İlköğretim Okulu	Sürsürü Mahallesi	2.559	Milli Eğitim Müdürlüğü Tahsisli
49.	17 Kasım İlköğretim Okulu	Sürsürü Mahallesi	9.290	Milli Eğitim Müdürlüğü Tahsisli

İL ÖZEL İDARESİNE TAHSİS EDİLEN MALİYE TAŞINMAZLARI				
S.No	**TAŞINMAZIN ADI**	**ADRESİ**	**ALANI m2**	**AÇIKLAMA**
1.	Kültür Evi	Çarşı Mahallesi	5.840	Eski Hükümet Konağı
2.	Mülga Gurup Müdürlüğü	Sürsürü Mahallesi	115.000	Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi
3.	Mülga Köy Hizmetleri Müdürlüğü	Sürsürü Mahallesi	19.382	
4.	Hazar Gölü Eğtim ve Dinlenme Tesisi	Sivrice	11.740	Eğtim ve Dinlenme Tesisi
5.	P.T.T Kampı	Sivrice	48.904	Eğtim ve Dinlenme Tesisi
6.	Gölardı Köyü	Sivrice	41.432	Arsa
7.	Mesire Yeri	Sürsürü Mahallesi	117.074	
8.	Sebze Hali Lojmanı	Kültür Mahallesi	1.193	Lojman
9.	Sebze Hali Lojmanı Arsası	Kültür Mahallesi	1.513	Arsa
10.	Asfalt Plent Tesisi	Sarıçubuk	35.000	
11.	Ağaçlandırma alanı	Sürsürü Mahallesi	357.226	
12.	Okul Alanı	Hüseynik Mahallesi	1.163	
13.	Okul Alanı	Aksaray Mahallesi	4.884	

ELAZIĞ İL ÖZEL İDARESİ TAŞINMAZLARINA AİT İCMAL				
S.NO		**MERKEZ**	**İLÇELER**	**TOPLAM**
1.	Tarla ve Arsalar	200.959	49.189	250.148
2.	Binalar	78.439	45.465	123.904
3.	Okullar	199.788	193.264	393.052
4.	Spor Tesisleri	26.800	75.980	102.780
5.	Lojmanlar	15.015		15.015
6.	Maşatlık ve Kilise Yeri	3.231		3.231
	GENEL TOPLAM	**524.232**	**363.898**	**888.130**

İşgem

İşgem (İş Geliştirme Merkezleri)

İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM) küçük girişimcilerin iş kurmasını ve geliştirmesini destekleyen ve kolaylaştıran, dolayısıyla da işletmelerin hayatta kalma ve büyüme olanaklarını arttıran bir projedir.

"İşletme Kuluçkaları" veya "KOBİ Fidanlığı" olarak adlandırabileceğimiz İŞGEM'ler, bünyelerinde barındırdıkları yeni işletmelere, yönetim danışmanlığı desteği, finans kaynaklarına erişim imkanı, uygun koşullarda iş yeri mekanı, ortak ofis ekipmanı ve ofis hizmetleri sunarak adeta onları beslemekte ve en zayıf oldukları iş kurma aşamasını sağlıklı bir şekilde aşmalarını ve büyümelerini sağlamaktadır

Bu itibarla İl Genel Meclisinin 09.12.2006 tarih ve 163 sayılı kararı ile Elazığ İŞGEM'e ortak olunmasına karar verilmiştir. Şirketin Sermayesi 100.000.00 TL olarak belirlenmiş İl Özel İdaresi 10.000.00 TL ile işletmenin % 10 hissesine sahip olmuştur.

Şirket sermaye arttırımına giderek 100.000 TL lik sermayesini 1.000.000 TL ye çıkarmıştır.

İl Genel Meclisinin 10.07.2008 tarih ve 105 sayılı kararı ile sermaye arttırımına gidilerek %10 olan hisselerimiz %31 e çıkartılmıştır.

Ön görülen taahhüdün tamamı yerine getirilmiştir.

Teknokent

Teknokent (Teknopark) Nedir?

1950'li yıllarda ABD'de kurulan Silikon Vadisi ile ortaya çıkan teknoparklar, dünyada üniversite sanayi işbirliğini sağlama konusundaki en başarılı model olarak öne çıkmıştır. Günümüzde, birçok sanayileşmiş ülke, teknoparkları teknolojik ve ekonomik gelişmenin en önemli aracı olarak görmektedir. ABD, İngiltere, Fransa, Japonya, Çin, Kore, Hindistan, İsrail, Finlandiya gibi birçok ülkede üretim ve hizmet sektörleri ürettikleri katma değerin önemli bölümü teknoparklar bünyesinde yürütülen AR-GE çalışmalarına borçludur.

Teknoparklar, büyüklüğüne, işlevine, yapısına, bulunduğu ülkeye bağlı olarak farklı isimlerle anılıyor. Bilim parkı, araştırma parkı, endüstri parkı, teknokent, teknopolis kullanılan isimlerden bazıları. 4691 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasasında Teknoloji Geliştirme Bölgesi şeklinde tek bir kavram kullanılmakta.

Teknoparklar, kurulduğu yöre, bölge ve genel olarak ülkedeki bilgiye dayalı kurumlarının ve işletmelerinin teknoloji alanındaki rekabet edebilirliğini ve yenilikçi niteliğini geliştirmek amacıyla; bilgi ve teknolojinin üniversiteler, araştırma merkezleri, şirketler ve pazarlar arasında dolaşmasını teşvik eden ve kolaylaştıran, buluşçuluğa dayalı şirketlerin kurulmasını ve gelişimini destekleyen, paydaşlarına ARGE çalışmalarında kullanılacak yüksek nitelikli ofis alanları ve destek hizmetler sunan, profesyonel anlayışla yönetilen organizasyonlardır. Teknoparklarda ARGE faaliyeti yürüten kuruluşlar; sanayi ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren kuruşlarının ARGE birimleri olabileceği gibi bu kuruluşların kurduğu müstakil ARGE şirketleri, bilgi tabanlı şirketler, öğretim üyelerinin kurduğu ARGE şirketleri, genç girişimciler tarafından kurulmuş bilgiye dayalı çalışmaya odaklanmış ARGE şirketleri olabiliyor.

Teknoparklarda ağırlıklı olarak ileri ve yeni teknoloji alanında ARGE çalışmaları yapılarak yeni ürünler ve yeni teknolojiler üretilmesi amaçlanıyor. ABD, bilgisayar teknolojisi alanındaki üstünlüğünü dünyada kurulmuş ilk teknopark olan Silikon Vadisinde geliştirilen ürünler ve teknolojiye borçludur. Fransız sanayisi, oluşturduğu katma değerin %24'ünü ülkedeki çok sayıda teknoparktan sadece Sophia Antipolis teknoparkında yapılan ARGE çalışmalarına borçlu. Teknoparklarda üretilen teknoloji doğrudan ihraç edilebiliyor. Bugün dünyadaki teknoparkların sayısı 1000'i geçmiştir.

Neden Elazığ Teknokent ?

Teknokent bünyesinde yer almak üzere müracaat eden girişimciler genellikle sağlanan desteklerle ilgileniyor. Oysa girişimcilerin Teknokent'e vergi muafiyeti vb. destekler için değil, Teknokent'te bulunmanın avantajlarını yaşamak için gelmelerini öneriyoruz. Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren kuruluşlar doğal olarak teknoparklar için tanınan muafiyetlerden yararlanacak. Ancak, Teknokent'te yer alan kuruluşlar çok daha farklı avantajlara sahip oluyorlar. Teknoparklar, teknolojik açıdan dünyaya açılan pencerelerdir. Teknoparklar birer teknoloji üssüdür. Teknopark içinde yer alan kuruluşlar, teknoparktaki diğer kuruluşların yaptıklarını görerek teknolojik gelişmeler konusunda yeni eğilimler ve gelişmeleri çok yakından izleyebilecek, benzer konuda çalışan diğer kuruluşlarla işbirliği ve güç birliği yaparak yeni girişimler başlatabilecek, önemli iş potansiyeline sahip olacaklardır. Teknopark içinde yer alan kuruluşlar üniversitedeki laboratuar, kütüphane, sosyal tesisler vb. imkanlardan kolaylıkla yararlanabilecek, üniversite öğretim üyelerini ve öğrencilerinin araştırmacı olarak çalıştırabileceklerdir. Teknoparkların en önemli etkisi cross-fertilization denilen çapraz topaklama. Yani, teknopark içinde yer alan kuruluşlar diğer kuruluşların çalışmalarından ilham alarak çok yeni ve orijinal projeler üretecekler, bu durum rekabet güçlerini artıracak, proje sürelerini kısaltacak. Bunlar çok önemli imkânlardır.

Elazığ Teknokent, yakın gelecekte özkaynaklarını, DPT ve AB hibe programları kaynaklarını kullanarak bölgesel ve teknolojik bazlı gelişme projelerini yürürlüğe koyacak. Teknokent içinde yer alan kuruluşlar bu projelerden önemli kazanımlar elde edecek.

Elazığ Teknokent, Teknokent'te yer alan kuruluşların ARGE projelerine finansal destek sağlayan TÜBİTAK - KOSGEB vb. kurumlardan destek alması için danışmanlık desteği verecektir.

FIRATTEKNOKENT

Sağlanan Avantajlar

Teknokentler üretim ve hizmet sektörüne yeni ürünler, geliştirilmiş ürünler, yeni teknolojiler ve geliştirilmiş teknolojiler üreterek rekabet gücünü artırmaları, kalite ve verimliliği artırmaları konularında önemli destekler sağlamaktadır.

Teknokentler ile üretim ve hizmet sektörü kuruluşları ARGE yapmaya, kendi teknolojilerini üretmeye teşvik edilmektedir. Ülkemizde tekstil sektörü çok gelişmiş olmasına rağmen tekstil teknolojisinin temeli olan tekstil makine sanayinin yetersizliği nedeniyle tekstil sektörü piyasalardaki gelişmelerden çok çabuk etkilenen bir sektör olagelmiştir.

Üniversitelerimizde yapılan bilimsel çalışmalar uluslararası endekslere giren itibarlı dergilerde yer almakta, kütüphane raflarını doldurmakta ancak sanayi ve hizmet sektörüne çok az bir miktarda katma değer girişi sağlamaktadır. Bu durum önemli bir kaynak israfına neden olmaktadır. Teknokentler, üniversite ve sanayinin ARGE çalışması yapması konusunda sağladığı desteklerle üniversitelerimizde yapılan bilimsel çalışmaların teknolojiye dönüştürülmesi, bu çalışmaların üretim ve sanayi sektörleri tarafından ürün ve teknolojiye dönüştürülerek ticarileştirilmesi, milli ekonomiye önemli katma değer sağlaması konusunda hayati önem taşımaktadır.

Birçok gelişmiş ülke katma değeri düşük olan tekstil, makine imalat, otomotiv yedek parça, döküm vb. sanayileri gelişmekte olan ülkelere bırakarak katma değeri yüksek olan ürünleri üretmeyi tercih etmişlerdir. Bu nedenle, Teknokentler, ülkemizde katma değeri yüksek olan ileri teknoloji ürünlerinin geliştirilmesi ve üretimi açısından önemli bir yönlendirme ve destek aracı olarak görev yapacaktır.

Ortağın Ünvanı	:Fırat Üniversitesi
Sahip Olduğu Hisse	:60.000 Adet
Toplam Hisse	:60.000 Adet
Sahip Olunan Hisseye Karşı Gelen Sermaye	:600.000 TL

Ortağın Ünvanı	:Ticaret ve Sanayi Odası
Sahip Olduğu Hisse	:20.000 Adet
Toplam Hisse	:20.000 Adet
Sahip Olunan Hisseye Karşı Gelen Sermaye	:200.000 TL

Ortağın Ünvanı	:Elazığ Belediyesi
Sahip Olduğu Hisse	:10.000 Adet
Toplam Hisse	:10.000 Adet
Sahip Olunan Hisseye Karşı Gelen Sermaye	:100.000 TL

Ortağın Ünvanı	:Ticaret Borsası
Sahip Olduğu Hisse	:5.000 Adet
Toplam Hisse	:5.000 Adet
Sahip Olunan Hisseye Karşı Gelen Sermaye	:50.000 TL

Ortağın Ünvanı	:İl Özel İdaresi
Sahip Olduğu Hisse	:5.000 Adet
Toplam Hisse	:5.000 Adet
Sahip Olunan Hisseye Karşı Gelen Sermaye	:50.000 TL

AVRUPA BİRLİĞİ PROJE OFİSİNİN İLİMİZDEKİ ÖNEMİ

Ülkemizin Ocak 2007 ayı içerisinde imzaladığı AB 7. Çerçeve anlaşması ile Hibe Programları 2013 yılına kadar devam edecektir. Bu anlaşma hükümleri içerisinde Ülkemizin çeşitli AB fonlarında hibe - kredi kullanma imkanı bulunmaktadır. Elazığ ili sahip olduğu avantajlarla birlikte DPT tarafından 2006 yılında cazibe kent ilan edilen Ülkemizdeki 15 ilden biridir ve AB hibe kredilerinden daha üst düzeyde yararlanma imkanı söz konusudur. Bu nedenle İl Özel İdare Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü bünyesinde oluşturulacak olan proje hazırlama ofisi ilin sosyo - ekonomik kalkınmasına önemli bir katkı sağlayabilecektir.

AVRUPA BİRLİĞİ PROJE OFİSİNİN AMAÇI

AB hibe fonlarından yararlanarak ilimizin çözüm bekleyen çeşitli altyapı, ekonomi, turizm, eğitim, sağlık, spor, sosyal ve kültürel amaçlı sorunlarına özellikle hibe kaynak temin ederek çözüm üretmek,

Yerel Yönetimler, Sivil Toplum Kuruluşları, Kobi'ler, Birlikler ve Kurumlar AB fonlarına proje sunabilmektedir. Ancak proje hazırlama aşaması proje hazırlama konusunda ilgililik ve profesyonellik istemektedir. İlimizde proje sunma şansı bulunan kamu kurum ve kuruluşları ,STK vb. kuruluşlar yeterli eleman ve altyapı donanımı yetersizliği nedeniyle bu projelerden istenilen seviyede yararlanamamaktadır. Bu kuruluşlara teknik destek ve danışmanlık hizmeti vermek,

Elazığ ilindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlar ile STK'larda proje kapasitesi oluşturmak,

Avrupa Birliği projeleri, Dünya Bankası projeleri, Birleşmiş Milletler ile ilgili projeler ve çeşitli ülkelerin Büyük elçiliklerin hibe programlarını takip ederek proje hazırlanabilirliliği sağlamak,

Kırsal kalkınma ajansı çalışmalarına il genelinde Proje bazında alt yapı oluşturmak,

İl genelinde çeşitli çevre ve altyapı sorunlarının çözümü, KOBİ'lerin gelişimi, yeni girişimlerin ortaya çıkması ve kaynakların ekonomiye kazandırılmasını sağlamak,

Özel İdare Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü bünyesinde proje hazırlama ve uygulama deneyimi bulunan bir ekiple projelerin takip edilmesi ve hazırlanması Elazığ ilinin sosyo-ekonomik ve kültürel seviyesinin yükseltilmesine önemli ölçüde katkı sağlamaktadır.

AVRUPA BİRLİĞİ PROJE OFİSİNİN ÇALIŞMA ALANI

Elazığ ili ilçe ve köyleri , Diğer kamu kurum ve kuruluşları , Elazığ'a hizmet veren STK' lar , meslek Odaları vs proje ofisinin çalışma alanını oluşturmaktadır.

ELDE EDİLECEK KAZANIMLAR

Proje ile bir çok Yerel Yönetim küçük ve orta ölçekli çevre ve altyapı projelerine kaynak bularak çözüm üretebileceklerdir.

KOBİ'ler yeni makine ve ekipman ile kaynakları daha iyi kullanıp daha fazla istihdam sağlayabileceklerdir.

Sivil Toplum Kuruluşları öncelikle altyapılarını güçlendirecek ve temsil ettiği kitlelere daha iyi hizmet verebilme şansını yakalayabileceklerdir.

Genel manada vatandaşlarımız da daha iyi bir çevre, çeşitli eğitim (mesleki) imkanları ve yeni bir iş bulma imkanlarına kavuşacaklardır.

2013 yılına kadar devam edecek olan AB hibe projeleri kapsamında Elazığ'a önemli bir kaynak aktarımına vesile olacak olan proje ofisi yine Kırsal Kalkınma Projeleri ve Dünya Bankası fon kredileri konusunda da etkili olacaktır. Proje ofisinin etkin çalışmaları sonunda il genelinde çeşitli çevre ve altyapı sorunlarının çözümü, KOBİ'lerin gelişimi, yeni girişimlerin ortaya çıkması ve kaynakların ekonomiye kazandırılması sağlanmış olacaktır.



AVRUPA BİRLİĞİ PROJE OFİSİ ÇALIŞMALARI

İl Özel İdaresi bünyesinde oluşturulan Avrupa Birliği Proje Ofisi Biriminin ilk açılış toplantısını Elazığ Valisi Muammer Erol başkanlığında **21.04.2009** tarihinde gerçekleştiren birim, ilk toplantısını **28.04.2009** tarihinde yaparak ve çalışmalara başlamıştır.

Elazığ ilinin sosyal, kültürel, turizm, altyapı, sağlık ve ekonomi alanlarında gelişmişlik düzeylerine önemli katkı sağlayacak olan bu birim Elazığ'ın bütün Kamu ve Sivil Kurum ve kuruluşlarını bilgilendirme; onlar tarafından yapılacak çalışmalara rehberlik ve danışmanlık yapmak üzere çalışmalarına başlamıştır. Düzenli olarak her ayın ilk salı günü toplantı yapmakta, sonuçları ve gündemi karar defterine geçirerek valiliğimizi bilgilendirmekte, projelerle ilgili beyin fırtınası yapmakta, kabul edilen proje fikirlerini hayata geçirmek için gerekli öneri ve çalışmaları yapmaktadır.

Bu amaçla Elazığ'ın tüm faydalanıcılarına hizmet vermek üzere dijital ortamda bilgi paylaşımının sağlana bilmesi için Elazığ Valiliği Web Sitesinden Link alınmış ve faydalanıcıların her bakımdan yararlanabileceği veri tabanını içeren Proje Ofisi Web sitesi hayata geçirilmiştir. **http://www.elazigproje.org/**

Avrupa Birliği Proje Ofisi Birimi'nin yaptığı tüm çalışmalara, Elazığ'ı ilgilendiren tüm hibe projesi ile ilgili çağrılara, çağrılarla ilgili tüm rehberlik ve danışmanlık hizmetlerine, proje hazırlayacaklar için ulusal, bölgesel, yerel raporlar ve çalışmaları içeren veri tabanına ve proje sürdürülürken ihale mevzuatı, raporlama gb. dokümanlara yukarıdaki adresten ulaşılabilecektir.

Web sitemizin geliştirilmesi ilgili çalışmalar hali hazırda Fırat Üniversitesince yürütülmektedir.

Yapılan toplantılarda Avrupa Birliği Proje Koordinasyon birimi açılan proje başlıkları doğrultusunda açılan hibe başlıkları ile ilgili Elazığ ilinde hazırlanabilecek projelerin neler olduğu tartışır. Proje konusu ile alakalı kuruluşların temsilcileri toplantıya davet ederek yapılabilecekleri projeler konusunda fikir alış verişlerini gerçekleştirir. Açılan başlıkların konusu ile alakalı Kamu kurum ve Kuruluşları ve STK'ların bilgilendirilmelerini yapar. Örneğin: Elazığ'daki proje kapasitesinin arttırılması amacı ile yapılan bilgilendirmelerde Ağın Kaymakamlığının proje hazırlama isteği doğrultusunda Proje birimimiz teknik destek hizmeti sundu ve Ağın ilçesinde kaymakamlıkta üç günlük proje hazırlama seminerini gerçekleştirdi.

Hazırlanan ve hazırlama aşamasında olan projelerin mantıksal çerçeveleri, proje döngüsü ve bütçeleri bu toplantılarda incelenerek projenin çağrı doğrultusunda doğru ve eksiksiz hazırlanması sağlanmaktadır. **ab proje ofisi her ayın ilk salı günleri olağan toplantılarını gerçekleştirir.**

EĞİTİM PROGRAMLARIMIZ

Elazığ ilinde proje hazırlama kapasitesinin arttırılması ve hibe başvuru projelerinden daha fazla faydalanılması amacı ile eğitim seminerleri düzenlenmiştir. Proje çalışmalarında gerek ortaklık gerekse iştirakçi olma noktasında bağlantı kurulabilecek kişiler, resmi kurum ve kuruluşlar ile STK'larda proje kapasitesi oluşturmak amacı ile bu kuruluşlardan Proje hazırlama yetenek ve isteği olan şahıslar eğitim seminerlerine alınmıştır.

Proje Koordinasyon Birimimize değişik kurum ve kuruluşlardan toplam 138 kişinin müracaatı olmuştur.

Bu müracaatlardan 100 kişi üç ayrı dönemlerde gerçekleştirilen seminerlerle eğitime tabi tutularak sertifikaları verilmiştir.



İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ AB PROJE OFİSİ KADIN İSTİHDAMI HİBE PROGRAMINDA 4 PROJE HAZIRLADI



İŞKUR PROJELERİMİZ

Türkiye İş Kurumu Elazığ İl Müdürlüğü Toplum Yararına Çalışma Programı

Elazığ İli Asfalt kaplama olan köy yollarının kaplama onarımlarının yapılarak yol kullanım ömürlerinin uzatılması ve standartlarının yükseltilmesi

Hizmet Vermesi Beklenen Katılımcı Sayısı	10 kişi
Sözleşme Süresi	6 ay(Haftada 5 gün 40 saat
Tahmini Toplam Sözleşme Bütçesi	54.476,70 TL

Elazığ Köy Yollarında küçük sanat yapılarını iyileştirerek daha işlevsel hale getirme projesi

Hizmet Vermesi Beklenen Katılımcı Sayısı	20 kişi
Sözleşme Süresi	6 ay (Haftada 5 gün 40 saat
Tahmini Toplam Sözleşme Bütçesi	109.846,40 TL

ELAZIĞDA TIBBİ AROMATİK BİTKİ ÜRETİM, ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJESİ

Proje Başlangıcı Ve Süresi ŞUBAT-2010 12 AY

Proje Uygulama Bölgeleri Elazığ İli Keban İlçesi Dağlık Köyleri (Meryemana Dikeni) Elazığ İli Ova Köyleri (Ekinezya ve Ak Kekik)

Projenin Amacı Son yıllarda, kozmetik ve gıda sanayinde tıbbi ve aromatik bitkilerin önem kazanması ile birlikte bu grup bitkiler alternatif ürün olarak hem tarımsal hende endüstiriyel olarak önem kazanmaya başlamıştır.

Bu Projenin Amacı Ekolojik özellikleri ve doğal olarak pek çok tıbbi ve aromatik bitkinin yetiştiği, organik tarıma geçişi potansiyel olarak daha uygun olması nedeniyle Elazığ ili kırsal alanlarında alternatif olabilecek bazı tıbbi ve aromatik bitkilerin (Ekinezya, Kekik, Meryemana Dikeni, Adaçayı, Tıbbi Nane, Enginar, Kantaron vb bitkiler) Ar-Ge faaliyetlerin yürütülerek alternatif gelir kaynağı olabilecek verim ve kalite kriterleri belirlenecektir. Elazığ'ın farklı yöreleri için en uygun tıbbi ve aromatik bitkilerin tespit edilerek, Elazığ kırsal alanların kalkınmasına katkıda bulunmaktır.

Sonuç Olarak hem dış pazarda hem de iç pazarda son yıllarda bu bitkilerin kullanım alanlarının hızla artması sonucunda bu grup bitkilere olan talep artmaktadır. Türkiye ihracat edebileceği nitelikli tıbbi ve aromatik bitki yetiştiremediği gibi, iç pazarın bile yeterince talebini karşılayamamaktadır.

Bunun sonucu olarak Türkiye dış pazarlardan bu grup bitkileri ithal etmektedir. Selçuk Üniversitesi Teknokent, İl Özel İdare ve Tarım İl Müdürlüğü işbirliği ile yürütülecek Ar-Ge çalışmaları sonucunda organik tarım tekniklerine - iyi tarım tekniklerine göre tıbbi ve aromatik bitki yetiştirme ve değerlendirilmesine yönelik endüstriyel yapılanmanın oluşturulması **Stratejik Tarımsal Plan** olarak hedeflenmiştir.

Bütün bu hususlar göz önünde bulundurularak Elazığ'da bu projenin uygulanmasının uygun olacağı planlanmaktadır.

Yaklaşık 15 dekar alanda 3 tür üründe aşağıdaki amaçlar için bu proje hazırlanmıştır:

PROJE FAALİYET PLANLARI

Bu proje kapsamında öncelikli olarak iç ve dış pazarlarda sanayi hammaddesi olarak artan talebi olan bazı tıbbi ve aromatik bitkiler seçilmiştir.

Bu bitkiler;

1- Ekinezya (*Echinacea purpurea)* : Son yıllarda ilaç sanayinin en önemli bitkisel ilaç hammaddesi bitkilerden olup, bitkinin tüm kısımları (kök,sap, yaprak,çiçek ve tohumları) ilaç ve kozmetik son zamanlarda gıda sanayinde de bitkisel ekstre ve çay olarak kullanılmaktadır.

2- Meryem Ana Dikeni (*Silybum marianum*): Tek yıllık dikenli bir bitki olup ilaç sanayinde aranılan bitkilerdendir. İlaç hammaddesi olarak tohum ekstreleri kullanılırken, tohum ve bitki artıklarının hayvan beslemede yem katkı maddesi olarak kullanım özellikleri vardır. Ayrıca ohumlarında bulunan sabit yağlar önemli bir kozmetik hammaddesidir. Anadolu'nun yerli bitkisi olup yetiştirilmesinde problem söz konusu değildir.

3- Ak Kekik (*Origanum majorana*): Anadolu'nun yerli bitkisi olup hem ilaç hem de gıda sanayinde ham bitki ve uçucu yağ olarak kullanılmaktadır. Artan talebi olan aromatik bitkilerden olup çok yıllıktır. Türkiye'nin tıbbi ve aromatik bitkiler içerisinde en çok ihraç ettiği bitkilerdendir.

Bu bitkilerin farklı ekolojik (toprak, rakım, nem, sıcaklık vb.) yapılarında Elazığ tarımsal alanlarında verim ve dünya standartlarında istenilen kalite analizleri Fırat Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü "Bitki Ürünleri ve Biyoteknolojisi Araştırma laboratuarında yapılacaktır.

Bu analiz sonuçlarına göre sanayiye elverişlilik özellikleri ortaya konulacaktır.

Elazığ şartlarında bu 3 üründen istenilen verim ve kalite elde edilirse ilimizdeki atıl durumdaki tarım alanlarında üretimi teşvik için çiftçilere gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

Elazığ'da elde edilen ürünlerin sanayiye dolayısıyla yöre ve ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla ilaç, kozmetik, gıda ve yem sanayi ile koordineli işbirliği yapılarak ürünlerin endüstriyel olarak değerlendirilmesi yoluna gidilecektir ve önümüzdeki yılardan itibaren ilgili sektörlerle organik/iyi tarım yöntemleri ile bitki üretim alanlarının artırılarak yaygınlaştırma çalışmalarına girilecektir.

Arıcılık için alt yapısı uygun olan ilimizde bu bitkilerin nektar bitkisi olma ve bal kalitesi ile ilişkileri ortaya konacaktır. Bunun sonucunda yörenin markası olabilecek "Tıbbi Bal" üretimi güçlendirilecektir.

Elazığ ili içinde planlanan 3 yıllık çalışmanın ekonomik analizleri yapılarak ülke sathında kırsal kalkınma programında alternatif tarımsal üretim olarak bitkilerin üretimi ile birlikte endüstriyel olarak katma değerinin yükseltilerek Türkiye kırsal alanları için örnek bir Ar-Ge projesi olarak ortaya konulmuştur.

İL ÖZEL İDARESİ AB PROJE KOORDİNASYON BİRİMİNİN FAALİYET TABLOSU						
PROJE SAHİBİ	HİBE PROGRAMININ ADI	İL ÖZEL İDARESİ PROJE KOORDİNASYON MERKEZİ TARAFINDAN YAPILAN PROJELER	İL ÖZEL İDARESİNİN ORTAK OLDUĞU PROJELER	İL ÖZEL İDARESİNİN İŞTİRAKCİ OLDUĞU PROJELER	İL ÖZEL İDARESİ PROJE KOORDİNASYON MERKEZİNİN TEKNİK YARDIM YAPTIĞI PROJELER	PROJE MALİYETİ (€)
İl Özel İdaresi	Kadın İstihdamının Desteklenmesi	Elazığ Sofrasında Kadın Girişimci Eli				197.771,00
İş Kadınları Derneği	Kadın İstihdamının Desteklenmesi	Elazığa Nitelikli Kadın Satış Elamanı Kazandırılması	Elazığa Nitelikli Kadın Satış Elamanı Kazandırılması			208.270,00
İl Özel İdaresi	Kadın İstihdamının Desteklenmesi	Elazığa Yaşlı - Engelli Kadın Bakıcı ve Girişimci Temini				189.880,00
Elazığ Kuaförler Derneği	Kadın İstihdamının Desteklenmesi	Kuaförlük ve Kişisel Bakım Sektöründe Kadın İstihdamı	Kuaförlük ve Kişisel Bakım Sektöründe Kadın İstihdamı			186.361,00
Elazığ Sağlık Hizmetlerini Geliştirme Ve Güzelleştirme Derneği	Genç İstihdamının Desteklenmesi		Elazığ'daki Hemşirelerin Özel Alanlara Yönelik Yetkinliklerinin Geliştirilmesi		Elazığ'daki Hemşirelerin Özel Alanlara Yönelik Yetkinliklerinin Geliştirilmesi	**265.460,00**
Elazığ Sağlık Hizmetlerini Geliştirme Ve Güzelleştirme Derneği	Genç İstihdamının Desteklenmesi			Doğru Temizlik Hayat Kurtarır	Doğru Temizlik Hayat Kurtarır	**291.990,00**
100. Yıl Endüstri Meslek Lisesi	Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi		Yüksek Gerilim Tesislerine Nitelikli Teknisyen Yetiştirilmesi			**160.048,46**
Gazi Anadolu Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi	Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi		Hayat Boyu Öğrenmede E-Devlet Uygulamaları			**145.119,82**
Ziya Gökalp İlköğretim Okulu	Özellikle Kız Çocuklarının Okullaştırılması Hibe Programı		Engelleri Aşarım Okuluma Koşarım		Engelleri Aşarım Okuluma Koşarım	**164.870,00**
Ağın Kaymakamlığı	Kadın İstihdamının Desteklenmesi		Ev Kadınları Üretiyor Saya Dikim Projesi		Ev Kadınları Üretiyor Saya Dikim Projesi	**323.277,00**
Fırıncılar Odası	Genç İstihdamının Desteklenmesi		Gençlerin Fırıncılık Sektöründe İstihdamı ve Eğitimi			**193.219,10**
Baskil Köyleri Hizmet Götürme Birliği	Kadın İstihdamının Desteklenmesi		Bodur Meyve Yetiştiriciliği Eğitim Projesi			**182.329,00**
Keban Su Ürünleri Yetiştiriciliği Birliği	Kadın İstihdamının Desteklenmesi		Su Ürünleri Yetiştiriciliği Eğitimi projesi			**157.371,49**
Koyun Keçi Yetiştiriciliği Birliği	Kadın İstihdamının Desteklenmesi		Kadın Çobanların Eğitimi Projesi			**191.316,32**
Arıcak Köyleri Hizmet Götürme Birliği	Genç İstihdamının Desteklenmesi		Kırsaldaki Gençlerin Modern Tarım Teknikleri İle İstihdamı			**185.620,34**
Damızlık Sağır Yetiştiricileri Birliği	Kadın İstihdamının Desteklenmesi		Süt Sığırı Yetiştiriciliğinde Kadın Eğitimi Projesi			**200.702,00**
TÜTEV	Genç İstihdamının Desteklenmesi				Genç Mobilya Tasarımcı Yetiştirilmesi	**154.330,00**
Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi	Sivil Toplum Diyaloğu Balıkçılık ve Tarım		Su Ürünlerinin AB Ortak Balıkçılık Politikalarına Adaptasyonu		Su Ürünlerinin AB Ortak Balıkçılık Politikalarına Adaptasyonu	**129.850,00**
Elazığ İli İç Sular Birliği	Sivil Toplum Diyaloğu Balıkçılık ve Tarım		Keban Balıkçılığının AB'ye Entekrasyonu		Keban Balıkçılığının AB'ye Entekrasyonu	
HAGÖKDER (Hazar Gölü Koruma Derneği)	Avrupalı Seçkin Destinasyon Projesi 2010		Elazığ Hazar Gölü'nün Ekonomik Değer Olarak Turizime Kazandırılması			



ELAZIĞ İL ÖZEL İDARESİ

PROJE KOORDİNASYON MERKEZİ

www.elazigproje.org

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Elazığ İl Özel İdaresi; verdiği hizmet kalitesini ve hizmet sunumu yaptığımız vatandaşlarımızın memnuniyetlerini arttırmak için TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemini örnek bir model olarak benimsemiş ve bu bağlamda Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası almak için 01/01/2010 tarihinde çalışmalara başlamıştır. Konu ile ilgili olarak toplanan Birim Müdürleri toplantısında süreçle ilgili olarak Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürü Sebahattin UÇAR tarafından bir sunum yapılmıştır.

Toplantı sonucunda konu ile ilgili bir komisyon kurulmasına, konunun bu komisyon marifetiyle yürütülmesine, haftalık toplantılarla Birim Müdürlerine bilgilendirme yapılmasına karar verilmiştir. Komisyon konu ve mevzuat taraması yapmış, yapılabilecekler konusunda detaylı bir çalışma hazırlanmış, konu Birim Müdürleri toplantısına taşınmıştır. Komisyon tarafından Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarının daha etkin bir şekilde yürütülebilmesi için Kalite Yönetim Temsilcisi ve her Müdürlükten iki kişi olmak kaydıyla Kalite Yönetim Sorumlusu görevlendirilmesine karar verilmiştir.

Yapılan çalışmalar neticesinde Kalite El Kitabı hazırlanarak 08/03/2010 tarihinde Elazığ İl Özel İdaresi Genel Sekreterinin onayı ile yürürlüğe girmiştir. Kalite Yönetim Sisteminin ana hatlarıyla açıklandığı Kalite El kitabı, TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi standardının esasları çerçevesinde yürütülecek faaliyetlerin anayasası niteliğindedir. Kalite El Kitabında açıklanan politikaların ayrıntıları, ilgili bölümlerde atıfta bulunulan prosedür, talimat, proses, iş akış şemaları, bulunmaktadır.

TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarının daha etkin yürütülebilmesi için İdaremiz 07 - 11 Haziran 2010 tarihinde Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi 138 kişi ve 15 saat, 02 - 06 Ağustos 2010 tarihinde Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi (Birim Müdürlüklerindeki Kalite Yönetim Sorumlularına) 12 kişi ve 15 saat, 06 - 08 Aralık 2010 tarihinde Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi 15 kişi ve 9 saat eğitim verilmiştir.

Tüm bu eğitimlerden ve kurumun genel yapısı ile ilgili yenileme çalışmalarından sonra Artıbel Belgelendirme kuruluşu tarafından görevlendirilen Baş Denetçi Erkut DENİZ tarafından yerinde yapılan inceleme neticesinde Kurumumuz TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi sertifikasını almış olup 08 Aralık 2010 tarihinde yapılan sertifika töreni ile sertifika İdaremize takdim edilmiştir.



TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi
T.C. Elazığ İl Özel İdaresi TS EN ISO 9001:2008 Quality Management System

ELAZIĞ İL ÖZEL İDARESİ

İL ÖZEL İDARESİ "HARPUT SÜT KALESİ" ELAZIĞ




MITSUBISHI





ELAZIĞ İL ÖZEL İDARESİ MAKİNE PARKI

S.NO	CİNSİ	TOPLAM
1.	OTOMOBİL	10
2.	PİKAP	21
3.	MİNİBÜS	11
4.	MİDİBÜS	1
5.	AMBULANS	1
6.	KAMYONLAR	44
7.	LAS.TEK.TRAKTÖR	1
8.	DOZER	12
9.	YAPIM GRAYDERİ	19
10.	YÜKLEYİCİ	9
11.	KAZICI-YÜKLEYİCİ	7
12.	EXKAVATÖR	6
13.	SONDAJ MAKİNASI	3
14.	ÇEKİCİ	4
15.	VİNÇ	2
16.	FORKLİFT	2
17.	SEYYAR KOMPRESÖR	2
18.	VİBRASYONLU SİLİNDİR	6
19.	KONKASÖR	1
20.	BAKIM DİSTRÜBÜTÖRÜ	2
21.	YAPIM DİSTRÜBÜTÖRÜ	5
22.	YAKIT TANKERİ	1
23.	SU TANKERİ (ARAZÖZ)	3
24.	ASFALT SÜPÜRGESİ	2
25.	ÇEK.TİP.YAKIT TANKI	15
26.	ÇEK.TİP.YAKIT TREYLERİ	1
27.	SEYYAR YAĞLAMA MAK.	1
28.	SEYYAR KAYNAK MAK.	3
29.	KAR MAKİNASI	4
30.	KAMPTREYLER	18
31.	SEYYAR TAMİR ARACI	1
32.	KASALI TREYLER	1
33.	SEMİ TREYLER	5
34.	TRAKTÖR ROMORKU	1
35.	JENERATÖR	2
36.	AĞAÇ DİKME MAKİNASI	1
	TOPLAM	**228**

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 6 ANA İŞ MAKİNASI

		DOZER	GRAYDER	YÜKLEYİCİ	SİLİNDİR	EXKAVATÖR	STABİLİZEDE ÇALIŞAN DAMPERLİ KAMYON
ÇALIŞMALAR	Makine sayısı	**12**	**19**	**11**	**7**	**6**	**29**
	12 aylık top.çalışma	9.316	17.125	5.675	2.437	5.175	500.509
	12 ayda 1 makinanın çalışması	776	901	516	348	863	17259
	1 makinanın 12aylık ort. çalışması	1200	1200	1200	800	1000	27500
	63%	**65%**	**75%**	**43%**	**44%**	**86%**	**63%**

İŞ MAKİNASI ÇALIŞMA SAATLERİ

YILLAR	DOZER	GREYDER	YÜKLEYİCİ	SİLİNDİR	EKSKAVATÖR
2008	11.589	18.478	8.175	4.213	12.104
2009	10.581	17.939	11.189	2.165	5.118
2010	9.316	17.125	5.675	2.437	5.175

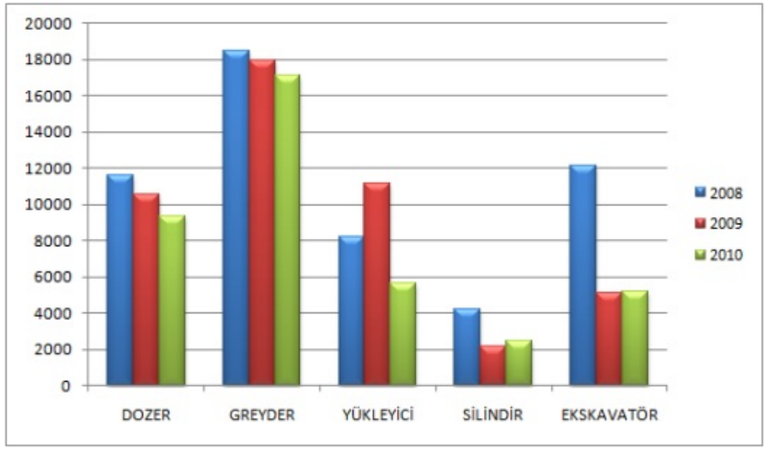

İŞ MAKİNELERİ VERİMLİLİKLERİ

YILLAR	DOZER	GREYDER	YÜKLEYİCİ	SİLİNDİR	EKSKAVATÖR	DAM. KAMYON
2008	74%	81%	62%	75%	93%	56%
2009	68%	79%	52%	39%	85%	78%
2010	65%	75%	43%	44%	86%	63%

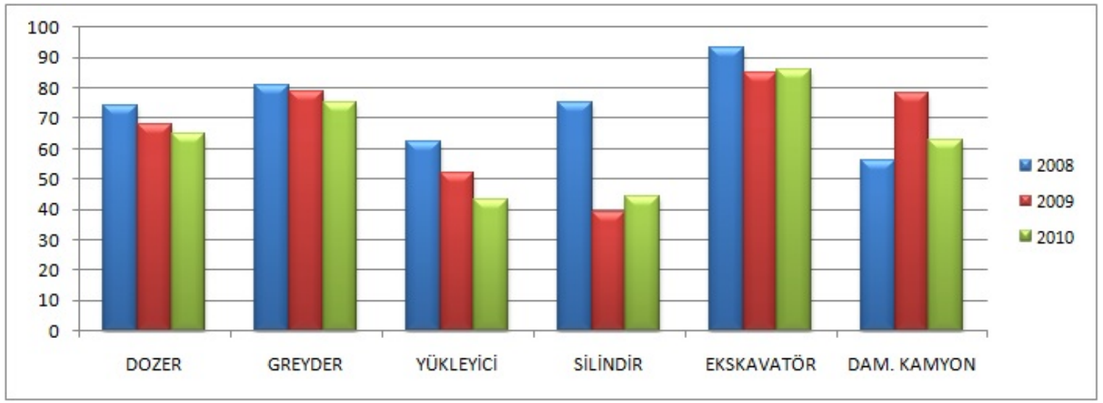

BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

KAYNAK TÜRÜ	İç Denetçiler	Hukuk Müşavirliği	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	Yazı İşleri Müdürlüğü	Mali Hizmetler Müdürlüğü	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Plan-Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	T O P L A M
Server						3					3
Monitör	2	3	17	5	17	33	22	21	33	13	166
Kasa	2	3	17	5	17	32	22	21	33	13	165
Notebook	1	1	6	2	6	5	2	1	2	4	30
Yazıcı	2	3	11	4	9	20	12	9	22	8	100
Fotokopi Makinası			1		1	1		1	2		6
Faks Makinası			1			1			1		3
Tarayıcı			1			1					2
Kamera			2								2
Projeksiyon Cihazı			2				1				3
Güç Kaynağı			1			1					2
TOPLAM	**7**	**10**	**59**	**16**	**50**	**97**	**59**	**53**	**93**	**38**	

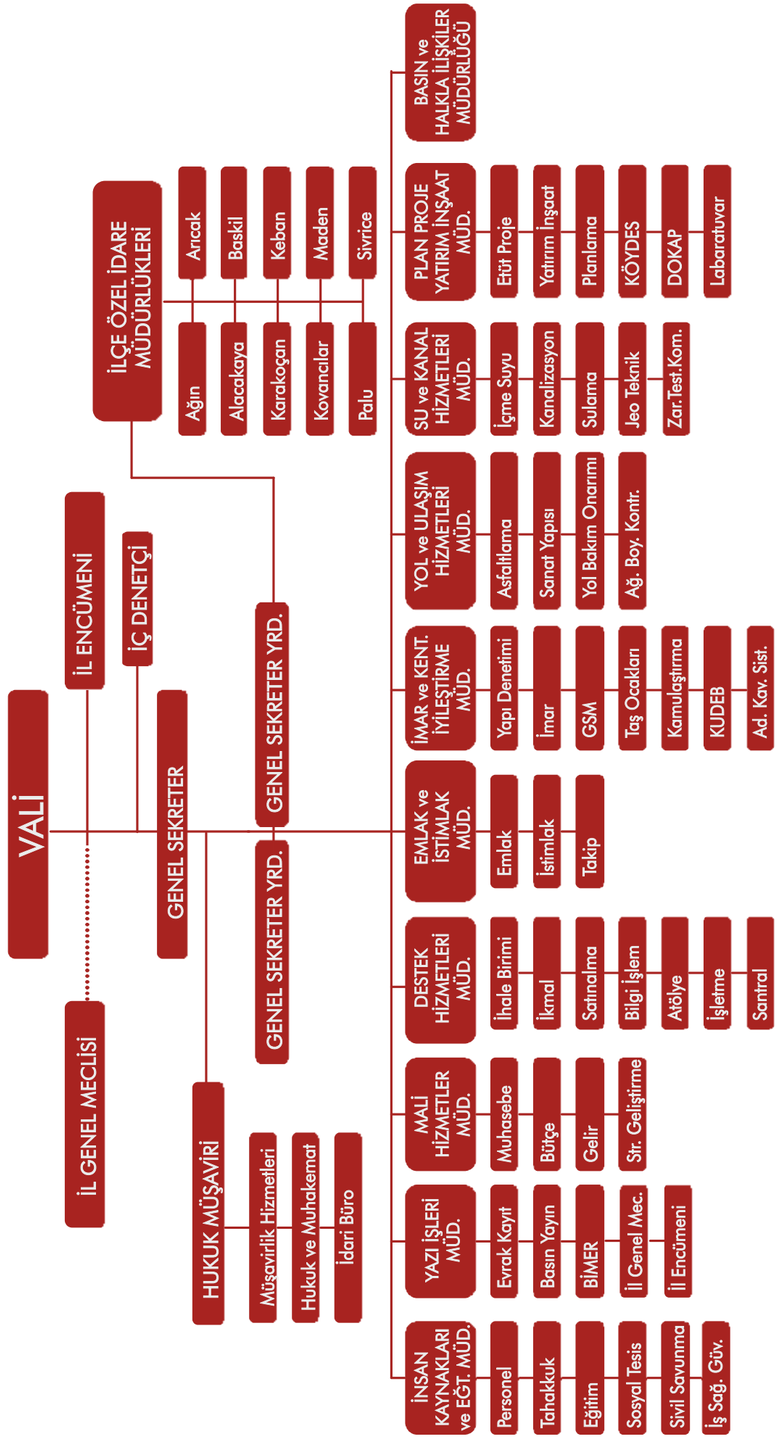

Personelin Statü Dağılımı	
Statü	**Adet**
Memur	156
Daimi İşçi	617
Sözleşmeli Personel	10
Toplam	**783**

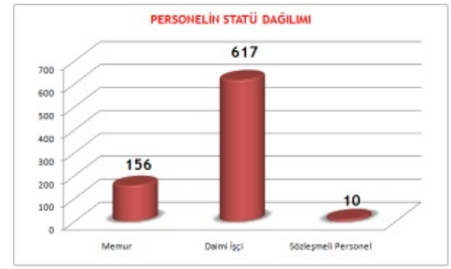



Memur Personelinin Yaş Durumu	
Yaş Grubu	**Adet**
20 - 29	25
30 - 39	61
40 - 49	66
50 - 50 +	14
Toplam	**166**

Memur Personelinin Öğrenim Durumu	
Öğrenim	**Adet**
Yüksek Lisans	5
Lisans	83
Ön Lisans	43
Meslek Lisesi	8
Orta Öğretim	21
İlköğretim	6
Toplam	**166**





İşçi Personelinin Yaş Durumu	
Yaş Grubu	**Adet**
20 - 29	0
30 - 39	45
40 - 49	388
50 - 50 +	184
Toplam	**617**

İşçi Personelinin Öğrenim Durumu	
Öğrenim	**Adet**
Yüksek Lisans	0
Lisans	8
Ön Lisans	17
Meslek Lisesi	14
Orta Öğretim	149
İlköğretim	429
Toplam	**617**

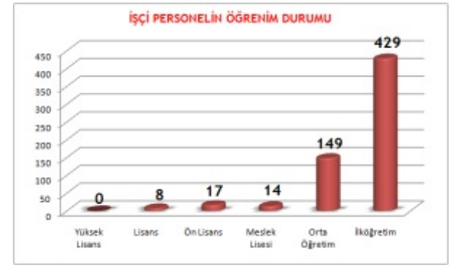

ELAZIĞ İL ÖZEL İDARESİ PERSONEL DURUMU				
Birimi	**Memur**	**Sözleşmeli**	**İşçi**	**Toplam**
Genel Sekreter	1	0	0	**1**
Genel Sekreter Yardımcısı	2	0	0	**2**
İç Denetçi	2	0	0	**2**
Hukuk Müşavirliği	0	2	2	**4**
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	14	0	68	**82**
Yazı İşleri Müdürlüğü	11	1	63	**75**
Mali Hizmetler Müdürlüğü	11	0	3	**14**
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	20	1	293	**314**
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	11	1	8	**20**
Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	15	1	95	**111**
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	29	1	45	**75**
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	21	2	21	**44**
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	2	0	2	**4**
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	1	0	0	**1**
İlçe Özel İdare Müdürlüğü	15	0	0	**15**
Diğer Kurumlar	1	1	17	**19**
TOPLAM	**156**	**10**	**617**	**783**



Unvana Göre Memur Kadroları Sayısı		
S.No	**Kadro Unvanı**	**Kadro Sayısı**
1.	Genel Sekreter	1
2.	Genel Sekreter Yardımcısı	2
3.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü	1
4.	Yazı İşleri Müdürü	1
5.	Mali Hizmetler Müdürü	1
6.	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürü	1
7.	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü	1
8.	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü	1
9.	Emlak İstimlak Müdürü	1
10.	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü	1
11.	Bütçe Müdürü	1
12.	Muhasebe Müdürü	1
13.	Bölge Müdür Yardımcısı	1
14.	İl Özel İdare Müdürü	1
15.	İlçe Özel İdare Müdürü	7
16.	Şube Müdürü	1
17.	İç Denetçi	2
18.	Ambar Memuru	2
19.	Aşçı	1
20.	Avukat	2
21.	Ayniyat Saymanı	1
22.	Bilgisayar İşletmeni	1
23.	Hizmetli	4
24.	Kameraman	1
25.	Memur	1
26.	Mimar	1
27.	Mühendis	57
28.	Proğramcı	2
29.	Sağlık Memuru	1
30.	Şef	8
31.	Şehir Plancısı	1
32.	Tekniker	26
33.	Teknisyen	10
34.	Veri Haz. Kont. İşletmeni	21
TOPLAM		**165**

2010 YILINDA UYGULANAN HİZMET İÇİ EĞİTİM SEMİNERLERİ					
S.No	**Eğitim No**	**Eğitimin Konusu**	**Süresi (Gün)**	**Katılımcı Sayısı (Kişi)**	**Toplam Süre (Saat/Kişi)**
1.	Eğitim 1	İl Özel İdaresini Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi	3	1	6
2.	Eğitim 2	Kamu İhale Kanunu ve Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu	5	2	10
3.	Eğitim 3	Yerel Yönetimler ve Kamu İdarelerinin Kapasitenin Güçlendirilmesi	7	2	14
4.	Eğitim 4	Tıbbı ve Aromatik Bitki Yetiştirme Semineri	5	1	5
5.	Eğitim 5	İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları	6	1	6
6.	Eğitim 6	Kamu İhale Kanunu ve Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu	5	3	15
7.	Eğitim 7	Yurt İçi ve Yurtdışı Ek Finansman Olanaklarının Sağlanması	5	2	10
8.	Eğitim 8	TUHİS Danışma Kurulu	5	1	5
9.	Eğitim 9	Vilayetler Hizmet Birliği Başkanlığı Semineri	3	1	3
10.	Eğitim 10	İş Sağlığı ve İş Güvenliği	5	1	5
11.	Eğitim 11	İçmesuyu Projeleri Hazırlama Eğitimi	4	1	4
12.	Eğitim 12	Hibe İzleme Ekiplerine Yönelik Eğitim	2	1	2
13.	Eğitim 13	Radyoaktif Nem Ölçme Cihazlarını Kullanma Eğitimi	5	3	5
14.	Eğitim 14	Kamu İhale Kanunu İnteraktif ve Uygulama Eğitim	2	4	6
15.	Eğitim 15	e-içişleri projesi eğitimi	5	4	20



Türkiye'de
TS-EN ISO 9001 - 2008
Standartlarında kalitesini arttıran
tek İL ÖZEL İDARE'si

5-Sunulan Hizmetler

5.1.Mikro Kredi Uygulama Merkezi

Mikro Kredi Projesi, fakir insanları özellikle de geleneksel bankacılık sistemi tarafından kapsanmayan kadınları korumayı ve onların iş hayatına girmelerine yardımcı olmayı amaç edinen bir proje olma özeliği taşır. Mikro Kredi Projesi ile kişilere kendi işlerini kurmada mikro ölçekli sermaye yardımlarında bulunulmaktadır.

Mikro Kredi Projesi; iş yapma fikri olup, küçük bir başlangıç sermayesine ihtiyacı olan yoksullara imkân verilmesi projesidir. Sadece güvene dayanan, teminatsız ve kefilsiz küçük sermaye şeklindeki mikro kredi, yoksulların kendi kendilerine yoksulluktan kurtulmalarını öngören bir stratejidir.

Bu bağlamda, Elazığ İl Genel Meclisi Temmuz ayındaki toplantısında Elazığ Valiliğinin gözetim ve denetimde, Elazığ İl Özel İdaresinin koordinasyonunda olmak üzere Türkiye İsrafı Önleme Vakfı aracılığı ile projenin İl'imizde uygulanmasına karar verilmiş ve Elazığ İl Özel İdaresi kendi bütçe imkanlarından 150.000,00TL, Hayır sever İş adamı Vehbi BİLGİN 350.000,00 TL ve HSBC Bank Elazığ Şubesi projeyi 7.500,00 TL desteklemiştir.

Bunun üzerine; 17 Ekim 2009 günü Elazığ Vehbi BİLGİN Şubesi ve Kovancılar Mikro Kredi Uygulama Merkezi açılışı yapılmıştır.

31 Aralık 2010 tarihi itibariyle toplam her grupta 5 kadının bulunduğu 104 grup ile toplam 384 kadına iş kurması 750,00 TL ile 1.000,00 TL arasında kredi verilmiştir.

248.117,50 TL kredi dağıtılmış, kredilerin geri ödenmesi oranı ise % 100 dür.

T.C.
ELAZIĞ VALİLİĞİ
TÜRKİYE GRAMEEN MİKROKREDİ PROGRAMI

VEHBİ BİLGİN ŞUBESİ
2009

T.C.
ELAZIĞ VALİLİĞİ
TÜRKİYE GRAMEEN MİKROKREDİ PROGRAMI

KOVANCILAR ŞUBESİ
2009

6-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

6.1-Vali

Vali, il özel idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Valinin görev ve yetkileri 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 30 uncu maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir:

- İl özel idaresi teşkilâtının en üst amiri olarak il özel idaresi teşkilâtını sevk ve idare etmek, il özel idaresinin hak ve menfaatlerini korumak.
- İl özel idaresini stratejik plâna uygun olarak yönetmek, il özel idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, il özel idaresi faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
- İl özel idaresini Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
- İl encümenine başkanlık etmek.
- İl özel idaresinin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
- İl özel idaresinin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
- Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
- İl genel meclisi ve encümen kararlarını uygulamak.
- Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışında kalan aktarmaları yapmak.
- İl özel idaresi personelini atamak.
- İl özel idaresi, bağlı kuruluşlarını ve işletmelerini denetlemek.
- Şartsız bağışları kabul etmek.
- İl halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
- Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak.
- Kanunlarla il özel idaresine verilen ve il genel meclisi veya il encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

6.2-Genel Sekreter

Genel sekreter, il özel idaresi hizmetlerini vali adına ve onun emirleri yönünde, mevzuat hükümlerine, il genel meclisi ve il encümeni kararlarına, il özel idaresinin amaç ve politikalarına, stratejik plan ve yıllık çalışma programına göre düzenler ve yürütür. Bu amaçla il özel idaresi kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını gözetir ve sağlar. Genel sekreter belirtilen bu hizmetlerin yürütülmesinden valiye karşı sorumludur.

6.3-İl Genel Meclisi

İl genel meclisi, il genel meclisince belirlenecek bir aylık tatil hariç her ayın ilk haftası meclis tarafından önceden belirlenen günde mutat toplantı yerinde toplanır. Kasım ayı toplantısı dönem başı toplantısıdır.

İl genel meclisi, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar verir. Ancak, karar yeter sayısı, üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz. Oylamada eşitlik çıkması durumunda meclis başkanının bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Gizli oylamalarda eşitlik çıkması durumunda oylama tekrarlanır, eşitliğin bozulmaması durumunda meclis başkanı tarafından kur'a çekilir.

Meclisin toplanmasında, üye tam sayısının salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde, başkan, gün ve saatini tespit ederek en geç üç gün içinde toplanmak üzere meclisi tatil eder. Gelecek toplantı, üye tam sayısının dörtte birinden az olmayan üye sayısı ile yapılır.

İl genel meclisi tarafından alınan kararların tam metni, en geç beş gün içinde valiye gönderilir. Vali, hukuka aykırı gördüğü kararları, yedi gün içinde gerekçesini de belirterek yeniden görüşülmek üzere il genel meclisine iade edebilir. Valiye gönderilmeyen meclis kararları yürürlüğe girmez.

Yeniden görüşülmesi istenilmeyen kararlar ile yeniden görüşülmesi istenip de il genel meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğuyla ısrar edilen kararlar kesinleşir.

Vali, meclisin ısrarı ile kesinleşen kararlar aleyhine on gün içinde idarî yargıya başvurabilir.

Kesinleşen il genel meclisi karar özetleri toplantıyı izleyen en geç yedi gün içinde çeşitli yollarla halka duyurulur.

İl Genel Meclisimiz 30 üyeden oluşmaktadır. 2010 yılında 11 toplantı 70 birleşim yaparak 308 karar almıştır.

İl Genel Meclisinin görev ve yetkileri 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesinde şu şekilde belirlenmiştir:

6.3.1-Görevleri

İl genel meclisi, il özel idaresinin karar organıdır ve ildeki seçmenler tarafından seçilmiş üyelerden oluşur. İl genel meclisinin görev ve yetkileri 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10 uncu maddesinde şu şekilde belirlenmiştir:

- Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, il özel idaresi faaliyetlerini ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve karara bağlamak.
- Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- İl çevre düzeni plânı ile belediye sınırları dışındaki alanların imar plânlarını görüşmek ve karara bağlamak.
- Borçlanmaya karar vermek.
- Bütçe içi işletmeler ile Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.
- Taşınmaz mal alımına, satımına, trampa edilmesine, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın akar haline getirilmesine izin; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi yirmileş yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.
- Şartlı bağışları kabul etmek.
- Vergi, resim ve harç dışında kalan miktarı beş milyardan yirmibeş milyar Türk Lirasına kadar ihtilaf konusu olan özel idare alacaklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.
- İl özel idaresi adına imtiyaz verilmesine ve il özel idaresi yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına, il özel idaresine ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.
- Encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
- İl özel idaresi tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
- Norm kadro çerçevesinde il özel idaresinin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
- Yurt içindeki ve yurt dışındaki mahallî idareler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı işbirliği yapılmasına karar vermek.
- Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.
- İl özel idaresine kanunlarla verilen görev ve hizmetler dışında kalan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.

6.4-İl Encümeni

İl encümeni valinin başkanlığında, il genel meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur. Valinin katılamadığı encümen toplantısına genel sekreter başkanlık eder.

Encümen, haftada en az bir defa olmak üzere üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar verir. Oyların eşitliği durumunda başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Çekimser oy kullanılamaz.

Encümen gündemi vali tarafından hazırlanır. Encümen üyeleri gündem maddesi teklif edebilir. Encümen, gündemindeki konuları en geç bir hafta içinde görüşüp karara bağlar. Alınan kararlar başkan ve toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır. Karara muhalif kalanlar gerekçelerini de açıklar.

Vali kanun, tüzük, yönetmelik ve il genel meclisi kararlarına aykırı gördüğü encümen kararının bir sonraki toplantıda tekrar görüşülmesini isteyebilir. Encümen, kararında ısrar ederse karar kesinleşir. Bu takdirde, vali, kesinleşen encümen kararının uygulanmasını durdurur ve idari yargı mercilerine yürütmeyi durdurma talebi ile birlikte on gün içinde başvurur. İtiraz Danıştay'ca en geç altmış gün içinde karara bağlanır.

05 Nisan 2010 Tarihinde 2011 Nisan ayına kadar görev yapmak üzere seçilen encümen üyelerimiz 2010 yılında 50 toplantı yaparak toplamda 329 adet karar almıştır.

İl Encümeninin görev ve yetkileri 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 26. maddesinde şu şekilde belirlenmiştir:

6.4.1-Görevleri

- Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip il genel meclisine görüş bildirmek.
- Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.
- Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
- Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
- Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş milyar Türk Lirasına kadar olan ihtilafların sulhen halline karar vermek.
- Taşınmaz mal satımına, trampa edilmesine ve tahsisine ilişkin kararları uygulamak, süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
- Belediye sınırları dışındaki umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.
- Vali tarafından havale edilen konularda görüş bildirmek.
- Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

6.5.İhtisas Komisyonları

5302 sayılı yasanın 16. Maddesi İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmernliğinin 20.Maddesi uyarınca İl Genel Meclisi, bir yıl görev yapmak üzere üyeleri arasından seçilecek en az 3 en çok 5 üyeden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir ancak bunların dışında Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu en çok 7 kişiden oluşur.

İhtisas komisyonları her siyasi parti grubunun ve bağamsız üyelerin İl Genel Meclisindeki üye sayısının oranlanması suretiyle oluşturulur.

2009 yılında görev yapan komisyonlarımız üyeleri ve almış oldukları karar sayıları aşağıdaki gibidir.

Plan ve Bütçe Komisyonu	
Komisyon Başkanı	Mesut VAROL
Komisyon Başkan Yardımcısı	Mehmet Reşat AKGÜL
Üye	Mehmet Ali ÖZDEMİR
Üye	Kemal DURMUŞ
Üye	Burhanettin UĞRAŞ

Plan ve Bütçe Komisyonu 2010 yılında 5 kez toplanmış olup, 5 karar almıştır.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu	
Komisyon Başkanı	Abbas YEĞEN
Komisyon Başkan Yardımcısı	Metin Baki ÖLÇÜCÜ
Üye	Necatin ÜZEK
Üye	Muzaffer BULUT
Üye	H.Mahmut AKALIN

İmar ve Bayındırlık Komisyonu 2010 yılında 49 kez toplanmış olup, 49 karar almıştır.

Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu	
Komisyon Başkanı	Ebubekir AKGÖL
Komisyon Başkan Yardımcısı	Halil GÖRGÖZ
Üye	Fevzi UZUNOĞLU
Üye	Zülküf ÇOBANOĞLU
Üye	Cemal YILDIRIM

Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu 2010 yılında 15 kez toplanmış olup, 15 karar almıştır.

Çevre ve Sağlık Komisyonu	
Komisyon Başkanı	Mehmet SALTIK
Komisyon Başkan Yardımcısı	Mehmet Zeki ÖZÇELİK
Üye	Nadir CAN
Üye	Hüseyin SAYLAN
Üye	Selami SARIPOLAT

Çevre ve Sağlık Komisyonu 2010 yılında 17 kez toplanmış olup, 17 karar almıştır.

Sulama ve İçmesuyu Komisyonu	
Komisyon Başkanı	Mesut VAROL
Komisyon Başkan Yardımcısı	Mehet Reşat AKGÜL
Üye	Mehmet Ali ÖZDEMİR
Üye	Kemal DURMUŞ
Üye	Burhanettin OĞRAŞ

Sulama ve İçmesuyu Komisyonu 2010 yılında 19 kez toplanmış olup, 19 karar almıştır.

Tarım ve Hayvancılık Komisyonu	
Komisyon Başkanı	Mehmet SALTIK
Komisyon Başkan Yardımcısı	Mehmet Zeki ÖZÇELİK
Üye	Nadir CAN
Üye	Hüseyin SAYLAN
Üye	Selami SARIPOLAT

Tarım ve Hayvancılık Komisyonu 2010 yılında 10 kez toplanmış olup, 10 karar almıştır.

6.5-İç ve Dış Denetim

İl özel idarelerinde iç ve dış denetim 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre yapılır. Denetim iş ve işlemlerin hukuka uygunluk, malî ve performans denetimini kapsar.

Diğer taraftan ihdas edilen 3 adet iç denetçi atamaları yapılarak, iç kontrol sisteminin önemli bir parçası olan iç denetim unsuru sağlanmıştır.

Yönetim anlayışının benimsenmesi süreç yönetiminin hayata geçirilmesi, İdarenin amaçlarına göre belirlenmiş politikalara ve menfaatlere uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulması, mali bilgi ve yönetim bilgilerinin zamanında ve güvenilir olarak üretimini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon yöntemlerine ve bu süreçte iç denetimi de kapsayan mali ve diğer kontroller bütünüdür.

İç Kontrolün İdarenin yönetim sorumluluğunda olması nedeniyle, İdarenin iş ve işlemlerin düzenlenmesinde;

Stratejik planın uygulanmasına yönelik faaliyetlerin tamamlanması, Faaliyetlere iş ve işlemlere ait iş akış şemalarının hazırlanması, Süreçler, süreç sahipleri ve sorumluların tanımlanması, Personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile kontrol prosedürlerinin belirlenmesi, Kurumun amaç, hedef ve politikalarının yerine getirilmesinde karşılaşılacak işlere ilişkin risk yönetimlerinin planlanması, Etkileşimli bir bilgi ve yönetim sisteminin kurulması, oto kontrolünün sağlanması, Hususlarının belirlenmesi ile riskli alanların tespit edilerek gerekli önlemlerin alınması sağlanmaya çalışılmıştır.

Bu kapsamda Harcama Yetkilisi Sorumluluğu; Müdürlükler düzeyinde oluşturulmuş olup mal ve hizmet alımları ile yapım ve onarım işleri ile ilgili Destek Hizmetleri Birimince yürütülmekte, işlemler baştan itibaren ardışık sisteme göre süreç kontrolüne, gerçekleştirme görevlisi kontrolüne, harcama yetkilisi kontrolüne, muhasebe yetkilisi kontrolüne tabi tutulmuştur.

Ayrıca; Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 04.02.2009tarih ve 1205 sayılı yazısı ile; 5018 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat uyarınca kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi sorumluluğu esas olarak üst yönetimin sorumluluğunda olmakla birlikte, Maliye Bakanlığı çalışmalarda idarelere rehberlik yapmak üzere Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Rehberi hazırlamıştır.

Söz konusu rehber ile birlikte, çalışmalarının üst yönetici onayıyla başlatılmasının uygun olacağı, çalışmaları yürütmek üzere; bir üst yönetici yardımcısı veya harcama yetkilisinin başkanlığında, harcama yetkilileri veya görevlendirecekleri yardımcılarından oluşan ***İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu*** ile harcama birimlerinden yönetici veya hiyerarşik olarak harcama yetkilisine en yakın düzeydeki temsilcilerden oluşan ***İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu*** oluşturulmuştur.

Konu ile ilgili olarak; İç Kontrol Standartlarına Uyum ve Eylem Planı Hazırlama Grubu üyelerinden tarafından İdaremiz Birim Müdür ve Sorumlularına 17.06.2009 Çarşamba Günü saat 14:00 da İdaremiz toplantı salonunda bilgilendirme sunumu yapılmış, çalışma grubu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planını 23.06.2009 Tarihinde tamamlamış olup gerekli yönlendirmeleri yapmak üzere İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kuruluna sunmuş olup, yönlendirme kurulumuz yapılan eylem planını aynen kabul ederek tasdik edilerek yürürlüğe konulması için Valilik Makamına sunulmuştur. Eylem planı Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne gönderilerek İdaremizde uygulama konulmuştur.




İL ÖZEL İDARESİ
"HARPUT SÜT KALESİ"
ELAZIĞ

İL ENCÜMENİ



Muammer EROL
İl Valisi
İl Encümen Başkanı



Nazif BİLGİNOĞLU
Genel Sekreter
Encümen Üyesi



Ömer YALÇIN
Mali Hizm. Müd.
Encümen Üyesi



Nebi ÇAĞDAŞ
Yol ve Ulş. Hiz. Müd.
Encümen Üyesi



Toroman ÖZPOLAT
Yazı İşleri Müd.
Encümen Üyesi



Müfid ERDEM
İns. Kay. Egt. Müd.
Encümen Üyesi



Ebubekir AKGÜL
İl Gen. Mec. Üyesi
Encümen Üyesi



Halil GÜRGÖZ
İl Gen. Mec. Üyesi
Encümen Üyesi



Yusuf YIĞMATEPE
İl Gen. Mec. Üyesi
Encümen Üyesi
07.02.2001
(Vefaat)



Fevzi UZUNOĞLU
İl Gen. Mec. Üyesi
Encümen Üyesi



Zülküf ÇOBANOĞLU
İl Gen. Mec. Üyesi
Encümen Üyesi

BAŞKANLIK DİVANI



Aydın KARA
Meclis Başkanı



Mesut VAROL
I. Başkan Vekili



Abbas YEGEN
II. Baskan Vekili



Mehmet SALTIK
Katip Üye



Selami SARIPOLAT
Katip Üye



Muzaffer BULUT
Yedek Katip Üye



Cemal YILDIRDIM
Yedek Katip Üye



Aydın KARA
Merkez



Yusuf YIĞMATEPE
Merkez
07.02.2011
(Vefat)



Mehmet SALTIK
Merkez



Mesut VAROL
Merkez



H. Mahmut AKALIN
Merkez



Cemal YILDIRIM
Merkez



Ebubekir AKGÜL
Merkez



Temur PİRİNÇCİ
Merkez

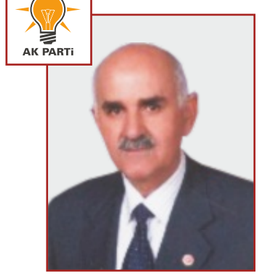

Fevzi UZUNOĞLU
Ağın



Hüseyin YILMAZ
Ağın



Abbas YEGEN
Alacakaya



Nurettin ÇETİNTAŞ
Alacakaya



M. Zeki ÖZÇELİK
Arıcak



Selami IŞIK
Arıcak



Burhanettin OĞRAŞ
Baskil



Halil GÜRGÖZ
Baskil



M. Reşat AKGÜL
Karakoçan



Selam YILDIRIM
Karakoçan



Haci ATEŞ
Karakoçan



Nadir CAN
Keban



Muzaffer BULUT
Keban



Metin Baki ÖLÇÜCÜ
Kovancılar



Mehmet Ali ÖZDEMİR
Kovancılar



Selami SARIPOLAT
Kovancılar



Necatin ÜZEK
Maden



Suphi ÖZAY
Maden



Zülküf ÇOBANOĞLU
Palu



Hüseyin SAYLAN
Palu



Kemal DURMUŞ
Sivrice



Hüseyin YABANCI
Sivrice

ADALET ve KALKINMA PARTİSİ	22
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ	4
SAADET PARTİSİ	2
BARIŞ ve DEMOKRASİ PARTİSİ	1
BAĞIMSIZ	1
TOPLAM	30



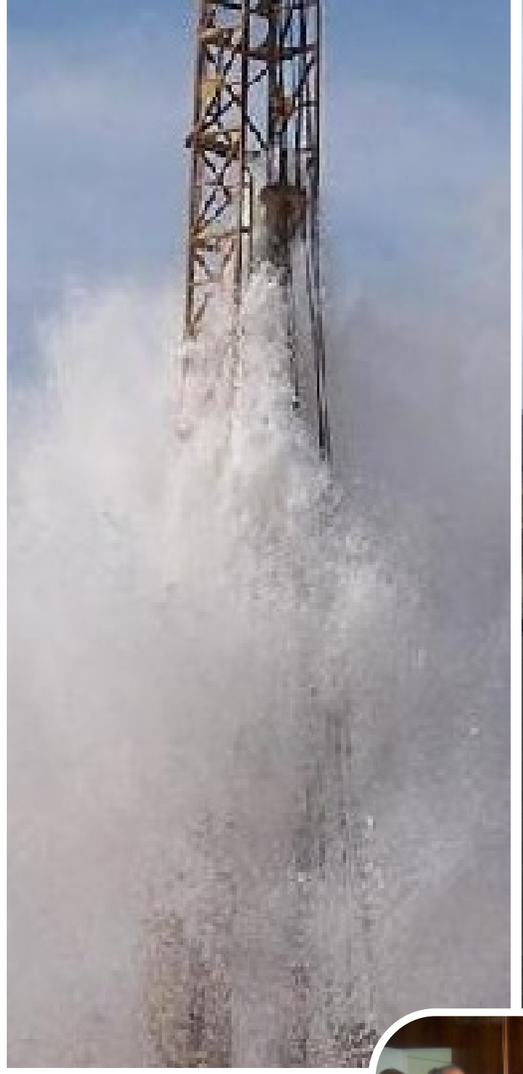
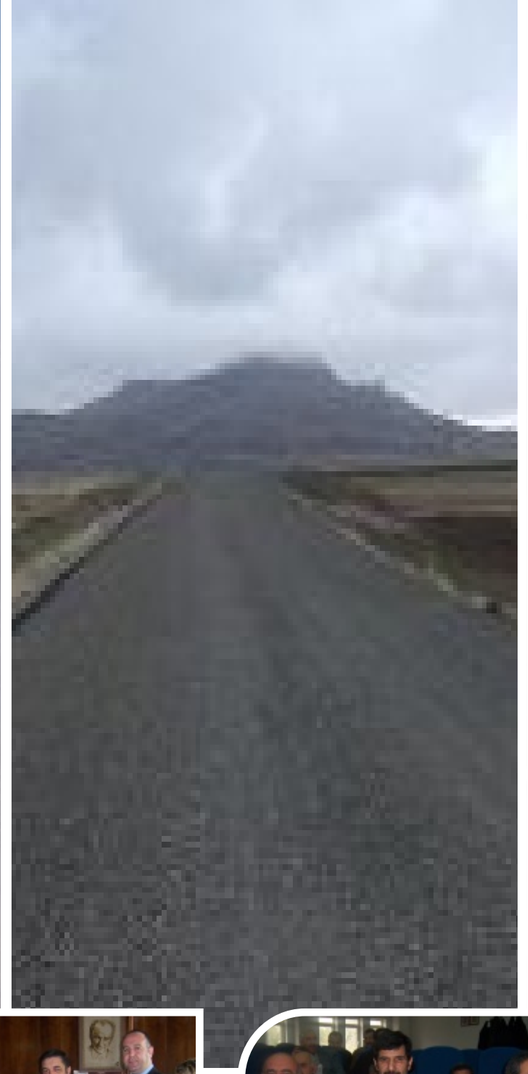





STRATEJİK AMAÇ ve HEDEFLER

AMAÇ VE HEDEFLER

Ülkemizde uygulanan yeni stratejiler doğrultusunda hazırlanan kalkınma ve gelişme planları ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 10 ve 31. maddeleri gereğince İl Özel İdaresi ile bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşların görev ve sorumluluk alanına giren işleri kapsayacak şekilde bir "Stratejik Plan 2010 - 2014" hazırlanmıştır. Stratejik Plan İl Genel Meclisi'nin 18.11.2009 gün ve 106 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.

İl Özel İdaresi Yasasının 31. maddesi gereği 2010 yılı performans planımız da Kasım Ayı toplantısında İl Genel Meclisine sunulmuş, 18/11/2009 gün ve 107 sayılı İl Genel Meclisi kararı ile kabul edilmiştir.

Planlı ve somut programlara dayalı hizmet üretebilmek, kurum kaynaklarının rasyonel kullanılmasını sağlayacak şekilde yatırım programlarının hazırlanmasına ve bütçe çalışmalarına rehberlik etmek amaçları ile 2010 yılı performans programı hazırlanmıştır.

Hedeflenen sonuçların nasıl ve ne ölçüde gerçekleştirildiğinin izlenmesine, değerlendirilmesine ve denetlendirilmesine temel oluşturulması yer almaktadır.

Stratejik planlama sürecinin etkinliğinin artırılması, kurum geleceği ile ilgili yön gösterici ve hedef belirleyici nitelikte olması, idarecilerin ve her düzeyde görev yapan personelin özverili çalışmalarıyla oluşturdukları katkıları, ortak çabası ve desteği ile sağlanacaktır.

Stratejik planlama ile Elazığ İl Özel İdaresi ve bağlı Müdürlüklerin durum analizlerinin yapılmasının ardından; öncelikli ihtiyaç ve projeler belirlenmiş, uzun dönemli planlamalar yapılacak ve kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlayacak yol haritaları çıkartılmıştır. Plan kapsamında çalışanların, ilgili kurum ve kuruluşların stratejik planlama önerileri de paydaş toplantıları ile değerlendirilmiştir. SWOT (Güçlü, zayıf yönler, fırsatlar, tehditler) analizi çalışması yapılmış, kurumumuzun çalışma ilkeleri, vizyonu ve misyonu belirlenmiştir.

Çalışmalardan elde edilen kazançlarımız, İl Özel İdaresi ve İl Müdürlükleri arasında iletişimin gelişmesi, toplantı sistemli ile çalışma alışkanlığının kazanılması, takım çalışmasının faydalarının görülmesi, veri toplamanın plan yapmak için öneminin görülmesi, proje üyelerinin veri analizi yeteneğinin gelişmesi, bütçeleme ve önceliklendirme anlayışını oluşturulması, strateji odaklı düşünme ve hedeflerle yönetim alışkanlığının kazanılmaya başlanması, Elazığ'ın yönetime makro bir bakış açısı getirilmesi olarak sıralanabilir.

İdarenin Amaç ve Hedefleri

KURUMSAL KAPASİTENİN OLUŞTURULMASI VE GELİŞTİRİLMESİ

STRATEJİK AMAÇ 1: İlin ihtiyaçlarının belirlenmesinde ve kaynak kullanımında açık, katılımcı, saydam ve hesap verebilir bir anlayışla hizmet sunmayı benimsemiş, fonksiyonel, akılcı ve çağdaş bir idari yapı oluşturmaktır.

HEDEF 1.1. Kurumsal kapasitenin oluşturulması ve geliştirilmesi amacıyla personele temel, hazırlayıcı ve uygulama eğitimleri verilecek ve eğitimde süreklilik sağlanacaktır.

HEDEF 1.2. İldeki mahalli hizmetlerin etkili ve verimli biçimde planlanması, uygulanması ve sunulmasında zorunlu olan kurumlar arası işbirliği ve koordinasyon, katılımcılık, saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri göz önünde bulundurularak güçlendirilecektir.

HEDEF 1.3. Hizmetlerinin yürütülmesinde etkinliği sağlamak için ilin tüm envanter ve bilgilerinin toplanacağı Yönetim Bilgi Sistemi oluşturulacak ve verilerin analizinin yapılacağı bir merkez kurulacaktır.

KIRSAL KALKINMA

STRATEJİK AMAÇ 2: Kırsal ve kentsel alanlardaki hizmet farklılıklarını azaltan, çağın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla fiziki ve sosyal altyapı çalışmalarını yürütmektir.

HEDEF 2.1. Toplam 3.385 km olan köy yolu ağı her mevsim emniyetli bir şekilde ulaşılabilen, standartlara uygun şekilde yapılarak, köylerin ulaşım sıkıntısı giderilecektir.

HEDEF 2.2. Hizmet alanımızda bulunan 544 köy ve 731 ünite olmak üzere 1.275 yerleşim yerinden içme suyu olmayan veya yetersiz olan 5 hane ve üzerindeki bütün yerleşim birimleri şebekeli ve sağlıklı içme suyuna kavuşturulacaktır.

HEDEF 2.3. Kapalı şebeke içme suyu bulunan, topografik yapısı uygun olan ve mahalli katkı sağlayan büyük yerleşim yerlerine öncelik verilerek, köyler kanalizasyon şebekesine kavuşturulacaktır.

HEDEF 2.4. Yatırım programlarında yer alan hizmetlerin yerine getirilmesi için ihtiyaç duyulan araç, gereç, makine, teçhizat ve ekipmanlar temin edilerek, bunların bakım, onarım ve ikmalleri yapılacaktır.

STRATEJİK AMAÇ 3 :Ulusal tarım politikaları doğrultusunda insan sağlığını ön planda tutan, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir, rekabet gücü olan ve ihracatı hedefleyen tarımsal kalkınmayı katılımcı yaklaşımla geliştirmektir.

HEDEF 3.1. Toprak ve arazi varlığının belirlenmesi, arazi kullanım planlarının yapılması amacıyla tarımsal amaçlı arazi kullanımı ile toprak koruma plan ve projeleri hazırlanarak, erozyona duyarlı alanların ve yeter büyüklükteki tarımsal arazi parsellerinin tespiti yapılacaktır.

HEDEF 3.2. Tarımsal üretimin kalite ve verimliliğinin artırılması için toprak ve sulama suyu envanterleri çıkarılarak, tarım topraklarına ait veri tabanı hazırlanacaktır.

HEDEF 3.3. Organik tarımın ve iyi tarım uygulamaları konusunda il genelinde geliştirilip yaygınlaştırılarak, plan dönemi sonunda toplam tarım alanları içerisindeki payı % 1 seviyesine ulaştırılacaktır

STRATEJİK AMAÇ 4: Bitkisel üretimi, insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek biçimde verim ve kalite artışını sağlayıcı tedbirler alarak yaygınlaştırmak ve çeşitlendirmektir.

HEDEF 4.1. İlimizdeki bitkisel üretim planlamasının "Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli" kapsamına göre yeniden yapılandırılması

HEDEF 4.2. Bitkisel üretimde birim alandan daha fazla verim ve daha kaliteli ürün elde edilebilmesi için sertifikalı tohum ve fidan kullanımı yaygınlaştırılacak, insan ve çevre sağlığını bozmadan üretim yapılması ve ilaçlama, gübreleme, sulama, hasatta en son teknolojilerin kullanımı teşvik edilecektir.

HEDEF 4.3. Ekim alanlarının ekonomik ve bilinçli bir şekilde kullanılması için bitkisel üretimde mahalli potansiyeli bulunan alternatif ürünlerin geliştirilmesi sağlanacaktır.

HEDEF 4.4. Hayvancılığın gelişmesinde önemli yer tutan kaliteli kaba yem üretiminin yaygınlaştırılması için gerekli çalışmalar yapılarak, bununla ilgili projeler hazırlanacak, nadas, kuru ve sulu tarım alanlarında ilimiz ekolojisine uygun yem bitkileri ot ve tohum üretiminin geliştirilmesi için gerekli projeler hazırlanacaktır.

HEDEF 4.5. Meyvecilik işletmelerinde verim ve kalitenin artırılması amacıyla yetiştiriciliğin her aşaması (dikim, bakım, gübreleme, sulama ..vs) ile hasat, depolama ve pazarlama konularında üreticilere gerekli teknik destek sağlanacaktır.

HEDEF 4.6. Bitkisel Üretimin Gen Kaynaklarının Korunması ve Tescili ile İlgili Yönetmelik kapsamında araştırma enstitüleri ve diğer ilgili kurumlarla koordineli çalışılarak, üretimi mahalli önem arz eden bitkilerin tescili yapılacak ve gen kaynakları korunacaktır.

HEDEF 4.7. Gıda güvenliğinin temini, her türlü gıda maddesinin ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin teknik ve hijyenik şekilde üretim, işleme, muhafaza, depolama, pazarlama, üretici ve tüketici menfaatleriyle halk sağlığını korumak üzere gıda üretim ve satış yerleri ile toplu tüketim yerlerinde hijyenik şartların oluşması için denetimler titizlikle yapılacaktır.

STRATEJİK AMAÇ 5 : Hayvancılığı ve hayvansal üretimi geliştirerek, yetiştiricilerin gelir seviyesini yükseltmektir.

HEDEF 5.1. İlimiz hayvancılığını geliştirmek ve üretimini artırmak için ıslah ve geliştirme projeleri hazırlanarak, büyükbaş ve küçükbaş hayvan ırkları geliştirilecek, üretim ve verimlerinin artırılması için suni tohumlama ve diğer biyoteknolojik teknikler uygulanacaktır. Bu konular ile ilgili geliştirme proje ve programları hazırlanarak, teknik yardım sağlanacaktır.

HEDEF 5.2. Kaliteli kaba yem ihtiyacının giderilebilmesi için, yem bitkileri üretiminin artırılması ve geliştirilmesi ile mera ıslah çalışmalarına ağırlık verilecektir.

STRATEJİK AMAÇ 6: Ürünlerinin geliştirilmesi, üretim ve verimliliğinin artırılması, sürdürebilir verimlilikte kullanılması, üretim tesislerinin iyileştirilmesi, yetiştiricilikle ilgili araç ve gereçlerin geliştirilmesiyle ilgili projeler hazırlamak ve uygulamaya koymaktır.

HEDEF 6.1. Yetiştiriciliğe uygun su ürünleri istihsal sahaları belirlenerek, optimum şartlarda kullanımlarını sağlamak amacıyla altyapı tesisleri imar, ıslah ve ihya edilerek, bu yerlerin sınır tespitleri yapılacaktır.

HEDEF 6.2. Su ürünleri üretiminin arttırılmasına ve geliştirilmesine yönelik gerekli yem, yavru, damızlık, araç, gereç, alet, makine ve diğer girdilerin tedarikini sağlayıcı tedbirler alınarak, bunlarla ilgili birimlerle işbirliği ve koordinasyon sağlanacaktır.

HEDEF 6.3. İlimizdeki mevcut su ürünleri üretim tesislerinin tam kapasite ile üretim yapmaları sağlanarak, söz konusu üretimlerin birincil ürün (canlı) olarak değil de işlenerek daha yüksek fiyatlardan satılması amacıyla işleme ve değerlendirme tesislerinin kurulması teşvik edilecektir.

STRATEJİK AMAÇ 7 :Kırsal kesimin ekonomik yönden güçlendirilmesi için tarımsal amaçlı kooperatifler, şirketler, üretici birlikleri ve kooperatif üst birlikleri kurulmasını özendirmek ve mali yönden desteklemektir.

HEDEF 7.1. Tarımsal teşkilatlanma kapsamında faaliyette bulunan çiftçi organizasyonlarının sayısı artırılacaktır.

HEDEF 7.2. Çiftçi organizasyonlarına destek sağlamak suretiyle bitkisel ve hayvansal üretime ve pazarlamaya yönelik makro ve mikro ölçekli projelerin uygulanması ve ortaklarının gelir seviyesinin artırılması sağlanacaktır.

HEDEF 7.3. Tarımsal Verimliliğin artırılması amacıyla arazi toplulaştırmasına muvafakat veren köylerin tesislerine öncelik verilerek, sulama suyu bulunan bölgelerde sulanabilir arazilerin sulamaya açılması sağlanacaktır.

HEDEF 7.4. Tarımsal verimliliğin artırılması için drenaj, arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri, sulama projeleri ile birlikte yürütülmesine ve projelerde çiftçi desteğinin sağlanmasına yönelik modeller geliştirilecektir.

HEDEF 7.5. Erozyon tehlikesi altındaki arazilerde erozyonu önleyici, toprak ve su dengesini sağlayan tedbirler alarak, toprak muhafaza çalışmaları yapılacaktır.

EĞİTİM HİZMETLERİNDE KALİTENİN ARTIRILMASI

STRATEJİK AMAÇ 8. Okul öncesi eğitim-öğretimi yaygınlaştırarak bu alanda daha nitelikli bir eğitim-öğretim hizmeti sunmak ve çağ nüfusunu ilköğretime hazırlamak.

HEDEF 8.1. 2010-2014 yılları arasında İlimizdeki anaokullarının ve anasınıflarının donanım ihtiyacını gidermek.

HEDEF 8.2. 2010-2014 yılları arasında, okul öncesi kurum idarecilerine ve personeline meslekî alanlarında hizmetiçi seminerler vermek.

HEDEF 8.3. 2010-2014 yılları arasında, okul öncesi eğitimin tanıtımını yaparak cazibesini arttırmak ve okul öncesi kurumları toplumsal hayatta aktif hale getirmek.

STRATEJİK AMAÇ 9 İlköğretim düzeyindeki eğitim öğretim kurumlarının daha verimli bir eğitim-öğretim standardına ulaşmasını sağlayarak ilköğretim öğrencilerini bir üst eğitim kurumuna hazırlamak.

HEDEF 9.1. 2010-2014 yılları arasında aşamalı olarak merkez ilköğretim okullarındaki sınıf öğrenci mevcutlarını 30'a düşürmek, aşamalı olarak ikili eğitim yapan okullarımızı normal öğretime geçirmek, % 97,5 olan okullaşma oranını % 100'e çıkarmak.

HEDEF 9.2. 2010-2014 yılları arasında aşamalı olarak ilköğretim okullarımızın yararlanacağı spor salonları ve çok amaçlı salonlar yapmak.

HEDEF 9.3. 2010-2014 yılları arasında aşamalı olarak ilköğretim okullarındaki görevli idareci ve öğretmenlere meslekî psikoloji ve yeterlilik konularında hizmetiçi seminerler vermek.

HEDEF 9.4. 2010-2014 yılları arasında, ilköğretim okullarındaki öğrencileri trafik konusunda bilinçlendirmek.

HEDEF 9.5. 2010-2014 yılları eğitim-öğretim dönemleri içerisinde taşımalı eğitimin kalitesini arttırarak hizmet sunumunu en üst seviyeye çıkarmak.

STRATEJİK AMAÇ 10 Genel Ortaöğretim kurumları öğrencilerini ilgi ve becerileri doğrultusunda yetiştirerek bir üst eğitim kurumuna hazırlamak ve ortaöğretim kurumlarını daha verimli bir eğitim-öğretim standardına ulaştırmak.

HEDEF 10.1. 2010-2014 yılları arasında aşamalı olarak genel liselerin fizikî yapılarını yeterli hale getirmek. Planlama dönemi sonuna kadar bürüt okullaşma oranını %60'tan %90'a çıkarmak Kız-erkek öğrenci okullaşma oranı arasındaki fark % 5,2'den %2'ye düşürmek İ.Ö.O'den o.ö.o 'e geçiş oranını % 87,5 % 95'e çıkarmak.

HEDEF 10.2. 2010 – 2014 yılları arasında ilimizin ihtiyaç duyduğu ortaöğretim okulları ve ortaöğretim kurumlarının kullanacağı pansiyonlar yapmak.

HEDEF 10.3. 2010-2014 yılları eğitim-öğretim dönemleri içinde ortaöğretim düzeyindeki okullarımızda stratejik yönetim ve planlama ekiplerinin oluşturulması, bu ekiplere stratejik yönetim ve planlama seminerlerinin verilmesi ve AB proje ekiplerinin oluşturulmasını sağlamak.

STRATEJİK AMAÇ 11 Ülkemizin ve ilimizin meslekî-teknik açıdan ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştirmek amacıyla İlimizdeki meslekî ve teknik eğitime yönlendirme çalışmalarını geliştirerek meslekî ve teknik eğitimi daha cazip hale getirmek, meslekî ve teknik eğitim olanaklarını iyileştirerek ihtiyaç duyulan okul, derslik, atölye, donanım ihtiyacını gidermek ve okullaşma oranını % 18,4'den % 50'a yükseltmek.

HEDEF 11.1. İlimizdeki ilköğretim okullarından mezun olan öğrencilerin, meslekî ve teknik eğitime yönlendirilebilmeleri için 2010-2014 yılları arasında her yıl II. dönemden itibaren sekizinci sınıflar düzeyinde meslekî ve teknik eğitimi tanıtıcı etkinlikler düzenlemek.

HEDEF 11.2. 2010-2014 yılları arasında meslekî ve teknik liselerdeki derslik, donanım, atölye, araç, çok amaçlı salon ve spor salonu ihtiyacını gidermek.

HEDEF 11.3. 2010-2014 yılları arasında meslekî ve teknik eğitim liselerinden mezun olan öğrencilerin istihdamı için sanayi kuruluşları ile ilişkileri geliştirerek protokoller yapmak.

HEDEF 11.4. 2010-2014 yılları proje dönemleri içinde, meslek lisesindeki meslek öğretmenlerinin ve idarecilerinin, Avrupa Birliği projeleri kapsamında meslekî eğitim ve uygulamada ileri bir ülkeyi ziyaret etmelerini sağlayarak meslekî çalışmaları yerinde görmelerini sağlamak.

STRATEJİK AMAÇ 12. Özel öğretime muhtaç öğrencilere daha kaliteli eğitim-öğretim hizmeti sunarak onları topluma kazandırmak amacıyla özel eğitim ve rehberlik faaliyetlerini iyileştirmek ve niteliklerini arttırmak. Bu doğrultuda, yönlendirme ve rehberlik faaliyetlerinin başarıya ulaşması için gereken ihtiyaçları gidermek.

HEDEF 12.1. 2010-2014 yılları arasında, İl düzeyinde özel eğitim ve rehberlik ihtiyacı duyan her bireye özel eğitim ve rehberlik hizmetlerini sunmak ve ilköğretim-ortaöğretim okullarındaki rehberlik faaliyetlerini iyileştirmek.

HEDEF 12.2. 2010-2011 yılları arasında aşamalı olarak özel eğitim kurumlarının kapasitelerini arttırmak.

STRATEJİK AMAÇ 13.İlimizdeki Halk Eğitim ve Meslekî Eğitim Merkezi faaliyetlerini geliştirme kapsamında yaşam boyu öğrenme ve yaygın eğitim niteliğini arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak. İlimizdeki okur-yazarlık ve meslek edindirme oranını arttırarak bu kapsamda doğacak olan bina, donanım, yönlendirme ve kurs ihtiyacını gidermek.

HEDEF 13.1.2010-2014 yılları arasında her yıl, İlimizde % 85 olan okuma yazma oranını % 95'e çıkarmak.

HEDEF 13.2. 2010-2014 yılları arasında halk eğitim merkezlerinin bina (bina yapımı ve tadilat) ve donanım ihtiyaçlarını gidermek.

HEDEF 13.3. 2010-2014 yılları arasında İlimizdeki halk eğitim merkezlerinin faaliyetlerinin tanıtımını yapmak.

HEDEF 13.4. 2010-2014 yılları arasında Meslekî Eğitim Merkezi'nden mezun olan öğrencilerin istihdam olanaklarının geliştirilebilmesi amacıyla sanayi kuruluşları ve odalarla işbirliğine gitmek.

HEDEF 13.5 2010-2014 yılları arasında her yıl, örgün eğitim fırsatından yoksun bireylere, açık ilköğretim ve açık lise imkânlarını tanıtıcı ve teşvik edici çalışmalar yaparak bu imkânlardan yararlanıcıların sayısını arttırmak ve öğrenim hayatlarını tamamlama fırsatı sunmak

STRATEJİK AMAÇ 14 İlimizdeki eğitim-öğretim faaliyetlerinin niteliklerini arttırmak amacıyla AR-GE koordinatörlüğünde; yerel araştırma, geliştirme ve proje çalışmaları yürütmek. AR-GE biriminin araç, gereç donanım eksikliğini gidermek.

HEDEF 14.1. Planlama dönemi sonuna kadar İlimizin ÖSS ve SBS sınavlarındaki başarı sıramızı her yıl beş basamak arttırmak.

HEDEF 14.2. İlimizin eğitim hayatının geçmişini aydınlatmak ve İl'in kültürel birikimini ortaya koymak amacıyla 2010 yılına kadar "Elazığ Eğitim Tarihi" çalışmasını kitap ve belgesel halinde hazırlamak

HEDEF 14.3. Bakanlık düzeyinde yürütülen Avrupa Birliği Projeleri, Ortaöğretimi Geliştirme Çalışmaları, TÜBİTAK, Bu Benim Eserim ve yerel düzeyde yürütülen projelerle İlimizin eğitim-öğretim hayatının niteliğinin artmasına destek vermek.

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTENİN ARTIRILMASI

STRATEJİK AMAÇ 15 İhtiyaç ve beklentilere uygun çağın gerekleriyle uyumlu, ulaşılabilir, verimli ve kaliteli sağlık hizmeti sunmaktır.

HEDEF 15.1. Sağlık hizmetlerinde kalitenin yükseltilebilmesi için sağlık kurumlarının fiziki alt yapı donanım ihtiyaçları optimum düzeyde karşılanacaktır.

HEDEF 15.2. Mobil Sağlık hizmetleri ile koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinde etkinlik ve yaygınlık artırılacaktır.

HEDEF 15.3. Temel-Birincil Sağlık Sektöründe eksik olan uygulamalı entegre sağlık tesisleri yapılarak, 1. basamak sağlık hizmetleri daha donanımlı birimlerde verilmesi sağlanarak, hizmete ulaşma kolaylaştırılacak ve ikinci basamağa sevkler azaltılıp hastanelerde yığılmalar önlenecektir.

HEDEF 15.4. Plan dönemi içerisinde Acil Yardım ve Kurtarma Hizmetlerinin standartlara uygun hale getirilmesi sağlanacaktır.

STRATEJİK AMAÇ 16: Spor alt yapısını il genelinde dengeli dağılımını sağlayarak, özellikle gençlere yönelik spor hizmetlerini yaygınlaştırmaktır.

HEDEF 16.1. Kentte veya kırsal alanda yaşayan tüm yaş gruplarından insanların spor yapmalarını sağlamak için gerekli altyapı çalışmaları yapılacaktır.

HEDEF 16.2. İlimizde başarılı sporcuların yetişmesi ve sporun yaygınlaştırılması amacıyla başlatılan 'Sporla Tanış Projesi' desteklenecektir.

KÜLTÜR VE TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ

STRATEJİK AMAÇ 17: İldeki kültür ve turizm alanlarını geliştirerek, kültür ve sanat faaliyetlerini desteklemektir.

HEDEF 17.1. Çok sayıda medeniyetin yaşadığı Harput'ta başlatılan arkeolojik kazılar devam ettirilerek, tarihi değerler gün ışığına çıkartılacak, müzelerde veya bulundukları mekânda sergilenecektir.

HEDEF 17.2. Hazar gölünde sular altında kalmış olan eski çağlara ait mimari yapı ve kalıntılarla ilgili başlatılmış olan çalışmalar desteklenecektir.

HEDEF 17.3. Palu İlçesinde inşa edilecek olan HES Barajı ile ilgili olarak sular altında kalabilecek Palu kalesi ve çevresindeki tescilli yapıların belirlenerek bilimsel kazı, kurtarma kazısı ve retorasyon çalışmaları başlatılacak ve bu çalışmalar desteklenecektir.

HEDEF 17.4. Osmanlı Son Dönem örneklerinden biri olan Eski Hükümet Konağı, binasının tarihi mimarisine uygun restorasyon işleri tamamlanmıştır.

HEDEF 17.5 Birlik ve beraberlik. İlimizin turizm değerlerini (tarihi, kültürel ve doğal) ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak amacıyla belediyeler, sivil toplum kuruluşları, diğer kamu kuruluşları ile etkin bir pazarlama faaliyeti yürütülecektir.

HEDEF 17.6. Alternatif turizm alanlarından; turizm amaçlı sportif faaliyetlere öncelik verilecek, bu kapsamda kayak ve su sporları, kamp turizmi, golf sahası, yayla turizmi vb. alanların alt yapı çalışmaları plan dönemi sonuna kadar tamamlanacaktır.

HEDEF 17.7. Her yıl düzenlenen Uluslararası Hazar Şiir Akşamları, kurumsallaştırılarak, ulusal ve uluslar arası kültür ve sanat çevrelerinden daha geniş katılım sağlanacaktır.

HEDEF 17.8. Kültürel Varlıklarımızın tespiti yapılarak, halkımızın faydalanmasına sunulacaktır

HEDEF 17.9. Halkın kültür, sanat ve spor faaliyetlerine katılımını sağlamak amacıyla konser, tiyatro vb. faaliyetler desteklenecek, bu faaliyetlerin sayısının artmasına teşvik edilecektir.

ÇEVRESEL VE MEKÂNSAL GELİŞME

STRATEJİK AMAÇ 18: Çevrenin korunması ve iyileştirmesine yönelik tedbirleri almak ve uygulamak, il genelinde mekânsal gelişmeyi yönlendirecek, uygulanabilir üst ve alt ölçekli planların yapılması ve uygulanmasını sağlamaktır.

HEDEF 18.1. İl genelini kapsayan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve 1/25.000 ölçekli planlar hazırlanacaktır.

HEDEF 18.2. Çevre Düzen Planı ve köylerin nakil ve toplulaştırma talepleri ile gelişme eğilimleri de dikkate alınarak uygulama imar planları hazırlanacak, yapılaşmanın planlı olarak gerçekleşmesi sağlanacaktır.

HEDEF 18.3. Çevreye ilişkin veri ve bilgi işletim sistemleri oluşturulacak, çevre izleme ve ölçüm altyapısı geliştirilecek, ilin çevre envanteri ve istatistik bilgilerini içeren veri tabanı 2012 yılı sonuna kadar hazırlanacaktır.

HEDEF 18.4. İlimizde yoğun olarak yaşanan hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla tedbirler alınacak, yapılan denetimlerin etkinliği artırılacaktır.

HEDEF 18.5. Nehir, tabii ve yapay göller ile yeraltı ve yer üstü sulama suyundaki kirlenmenin önlenmesi için gerekli tedbirler alınacak, projeler geliştirilecek ve uygulanan projelerin devamı sağlanacaktır.

HEDEF 18.6. İl Özel İdaresinin yetki alanı içerisindeki yerleşim yerlerinin katı atık depolama alan yerleri tespit edilerek, %50'sinin katı atık depolama alanlarının yapımı stratejik plan dönemi içerisinde tamamlanacaktır.

HEDEF 18.7. İl Özel İdaresi yetki alanları içerisinde çevreye olumsuz etki yapabilecek tesis ve işletmelerin faaliyetleri incelenecek ve tespit edilen olumsuzlukları giderici tedbirlerin alınması sağlanacaktır.

HEDEF 18.8. Toprağın korunması ve erozyonun önlenmesi amacıyla ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve rehabilitasyon çalışmaları yapılacak ve ağaçlandırma çalışmaları yapılırken gelir getirebilecek türlerin (ceviz, badem,fıstık vb) dikimine öncelik verilecektir.

STRATEJİK AMAÇ 19: İlimizde meydana gelebilecek tabii afetlerin yol açacağı can ve mal kayıplarını en aza indirmek için afet bilinci, teknik bilgi, donanım ve koordinasyonun altyapısını hazırlamaktır.

HEDEF 19.1. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü teşkilatlanmasının tamamlanabilmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

HEDEF 19.2. İl genelinde afet riski taşıyan yerlerin ve afet türlerinin tespiti 2011 yılında yapılarak, tabii afet risk haritası oluşturulacaktır.

HEDEF 19.3. Çığ, heyelan ve su baskını afetlerine maruz kalma ihtimali olan alanlarda bulunan yerleşim yerlerinin güvenli alanlara taşınmaları sağlanacaktır.

SOSYAL REFAHIN ARTIRILMASI

STRATEJİK AMAÇ 20 :Gelirleri yetersiz dezavantajlı grupları; mesleki, sanatsal birikimlerini, gelirlerini ve kabiliyetlerini artırıcı faaliyetlere yöneltmek amacıyla mikro kredilerle destekleyerek işsizliğin azaltılmasını sağlamaktır.

HEDEF 20.1. Hedef kitlenin küçük sermaye gerektiren gelir artırıcı faaliyetlerini desteklemek amacıyla ilgili kuruluşlarla işbirliği yapılarak 2010 yılından itibaren projeler üretilecek, gerçekleştirilmesi istenen projelerin tanıtımı yapılacaktır.

HEDEF 20.2. Hedef kitlenin gelirini artırmak ve işsizliği azaltmak için İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, sivil toplum kuruluşları, AB Proje Ofisi ve özel girişimcilerle işbirliği yapılarak, mahalli potansiyeli bulunan turizm, el sanatları, hayvancılık, dokumacılık, halıcılık ve ipek böcekçiliği gibi alanlardaki girişimler desteklenecektir.

STRATEJİK AMAÇ 21 : Ulusal sosyal hizmet politikaları ve 2828 sayılı Kanun da göz önünde bulundurularak; toplumsal refah ve ferdi mutluluk ile insan sağlığına öncelik veren ilin sosyal ve ekonomik şartlarına göre Elazığ'da korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç fertlere hizmet etmektir.

HEDEF 21.1. Ekonomik, sosyal ve sağlık yönünden yoksunluk içinde bulunan kişilerin kimlik bilgileri, adresleri, dezavantajlı durumları ve ihtiyaçları belirlenerek, gerekli yardımlar yapılacaktır.

HEDEF 21.2. İlimizde korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç bireylere hizmet verebilmek için ihtiyaç duyulan sosyal hizmet tesislerinin mevcut olanlarının şartları iyileştirilecek, olmayanların kurulması sağlanacaktır.

HEDEF 21.3. Elazığ Valiliği bünyesinde hizmet veren Vali Osman Aydın Çocuk ve Gençlik Merkezinin etkinliği artırılacaktır.

HEDEF 21.4. İlimizde engellilere yönelik mevcut özel sosyal hizmet kuruluşlarının sayıları artırılarak, hizmet standartları yükseltilecektir.

HEDEF 21.5. Eğitim ve sağlık alanlarının yanı sıra 2010 yılı sonuna kadar hayırsever vatandaşlarımızın yardım yapabilecekleri diğer alanlar tespit edilerek, yardım alanlarının

çeşitlendirilmesi ve karşılıksız yardım yerine kişilerin üretkenliğini artırıcı yardımlar yapılması sağlanacaktır.

Temel Politikalar ve Öncelikler

1.Köylünün (kırsal kesimin) refah düzeyini artırıcı tedbirler alınmalıdır.

2.Sağlık ve eğitim hizmetlerinde kalite artırılmalıdır.

3.Eğitim, sağlık, spor ve sosyal altyapı çalışmalarına ağırlık verilmelidir.

4.Yeni yapılanma çerçevesinde birimleri oluşturma hazırlığı yapılmalı, ilk etapta ilin coğrafi bilgi sistemini oluşturabilecek birimleri kurulmalı. istatistikçi, şehir plancısı ve sosyolog gibi uzman personelin kurumlardan naklen alınması veya sözleşmeli olarak istihdamı sağlanmalıdır.

5.Yeni kanun ile belirlenen görevleri çerçevesinde personel en kısa zamanda hizmet içi eğitime alınmalıdır.

6.İl Özel İdaresi personeline performansa dayalı, rekabeti sağlayan ücret sistemi getirilmelidir.

7.İnsan kaynakları yönetiminde liyakate dayalı bir kariyer sistemi uygulanmalıdır.

8.Kaynak tasarrufu sağlamak için tarım arazi ve ürün envanteri çıkartılarak yöreye uygun yeni ürünlerin yetiştirilmesi sağlanmalıdır.

9.Organik tarıma yer verilmelidir.

10. Sulama için göletler yapılmalı, sulama projelerinin tamamlanabilmesi için gerekli kaynak sağlanmalıdır.

11.Bağcılık geliştirilmeli, üzüm işleme tesislerinin kurulması için destek verilmelidir.

12. Mera ıslah ve arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanmalıdır.

13.Yetiştirilebilecek alanlarda çam veya meşe yerine ceviz, badem, fıstık v.b. ormanları oluşturulmalıdır.

14.Arıcılık desteklenmelidir.

15.Yarımada şeklinde coğrafi konuma sahip olan ilimizde su ürünleri üretimi teşvik edilmelidir.

16.Hayvancılık ve yem bitkileri üretimi destekleme çalışmaları artırılarak devam etmelidir.

17.Tarımda kullanılan ve çevreye olumsuz etkileri bulunan ilaç ve gübre tüketimi kontrol altına alınmalıdır. Bunun için zirai ilaç satışı reçeteye bağlanmalı, kimyevi gübrenin satışı da toprak analizine göre yapılmalıdır.

18.Yatırım öncesi ilgili kuruluşun teknik elemanları ile birlikte fizibilite çalışması yapılmalıdır.

19. Kontrol mekanizmasının daha sağlıklı çalışması için teknik personel sayısı, araç ve donanım artırılmalıdır.

20. Her yatırım etaplanmalı, projeler yöreye, iklime göre hazırlanmalı ve yaptırılmalıdır.

21. Bütçe imkânlarında önceliği olan yatırımlar yapılmalıdır.

22.Hayırsever vatandaşların yapacağı yardımlar yol, su kanalizasyon, tarımsal alanlar ile turizm alanındaki restorasyon ve onarımlara kaydırılmalıdır.

23.Köy yerleşik alanının dışına çıkılması önlenmeli, kaçak yapılaşmaya göz yumulmamalı, İl Özel idaresinin hizmetleri yerleşik merkezlere yapılmalıdır.

24.Özel idarenin iş ve işlemleri ile ilgili programlara uyulmalıdır.

25.Özel idarenin programına aldığı yatırımlardan önemli ve öncelikli olanları hayata geçirebilmesi için karar organı olan İl Genel Meclisi bilgilendirilmelidir.

26.İl Özel idaresinin gelirleri artırılmalıdır. Taş Ocakları Nizamnamesi ve Maden Kanunu il özel idaresinin gelirlerini artıracak şekilde günümüz şartlarına uyarlanmalıdır.

28.İl özel idaresi yapacağı her yatırımda, gerçekleştireceği faaliyet alanındaki sivil toplum kuruluşlarının görüş ve desteğini almalıdır.

29.Elazığ ilinin Çevre Düzeni Planı yapılmalıdır.

30.Mahalli istatistikî verileri toplayan, mahalli bilgi bankası kurulmalıdır. Tüm birimler ağ ile birbirine bağlantılı hale getirilmelidir.

31.Harput'ta başlatılmış projeler tamamlanmalı ve hayata geçirilmelidir.

32.Harput Kalesinde başlatılan kazı çalışmaları tamamlanmalı, diğer tarihi kalıntılarda da kazı çalışmaları yapılarak tarih günışığına çıkarılmalıdır.

33.Hazar gölünde bulunan batık şehir araştırılarak, turizmin istifadesine sunulmalı ve tanıtımı yapılmalıdır.

34.Hazar gölü ve Keban barajında su sporları geliştirilmeli ve uluslar arası organizasyonlar yapılmalıdır.

35.Kütüphaneler çağdaş teknolojiye kavuşturularak, kitap arşivi genişletilmeli ve güncelleştirilmelidir.

36.Doğalgaz projesi tamamlanarak kısa sürede kullanıma sunulmalıdır.

37.Tehdit boyutlarındaki hava ve su kirliliği çözümlenmelidir.

38.İl genel meclisi üyelerine stratejik planın önemi ve bağlayıcılığı, hizmetlerin bu plandaki yol haritasına göre yürütüleceği toplantılarla anlatılmalıdır.

39.Kaymakamların görüş ve önerileriyle kendi hizmet alanlarında yürütülen diğer kamu ve özel sektör yatırımları da dikkate alınmalıdır.

40.İlçe, belde ve köylere semt sahaları yapılmalıdır.

41.Diğer mahalli idarelerle işbirliğine gidilmelidir.

42.Kurumun hizmetleri kamuoyuna medyadan da faydalanarak daha etkin tanıtılmalıdır.

43.İl özel idaresinin bünyesinde bulunan kurumlarla koordinasyonu sağlanmalı, kurumların ihtiyaç ve sorunları doğru tespit edilmelidir.

44.Üniversite, sendika, sanayi ve ticaret odası, meslek odaları ve ELESKAV gibi kuruluşlarla işbirliği ve koordine içinde çalışılmalı, görüşleri dikkate alınmalıdır.

45.Mevzuatın basitleştirilebilmesi ve yenilenmesi için çalışma alanına giren tüm işlerde, merkezi idareye hazır teklifler götürülmelidir.

46.İlimizin ikinci derece deprem bölgesi olması nedeniyle İl Afet Yönetim Birimi oluşturulmalı, deprem öncesi uyarı sistemi ve erken müdahale imkânları sağlanmalıdır.

















BÜTÇE UYGULAMALARI

BUTCE GELIRLERi KESIN HESAP CETVELI (ÖZ GELİR)

Açıklama	Bütçe İle Tahmin Edilen	Yılı Net Tahsilati
01 Vergi Gelirleri	0,00 TL	15.000,00 TL
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	767.000,00 TL	3.250.093,16 TL
05 Diğer Gelirler	19.233.000,00 TL	27.272.428,61 TL
06 Sermaye Gelirleri	6.000.000,00 TL	29.400,00 TL
TOPLAM	**26.000.000,00 TL**	**30.566.921,77 TL**

İdaremiz 2010 yılında toplam 26.000.000 TL gelir elde etmeyi hedeflemiştir. 2010 yılı sonunda Vergi Gelirlerinde 15.000.000 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde 3.250.093,16 TL Diğer Gelirler gelir türünden 27.272.428,61 TL 29.400 TL si Sermaye Gelirleri olmak üzere toplam 30.566.921,77 TL gelir elde edilmiştir. Gelir Bütçesinin gerçekleşme oranı % 114 olarak gerçekleşmiştir.



BUTCE GELIRLERi KESIN HESAP CETVELI (TOPLAM GELİR)

Açıklama	Bütçe İle Tahmin Edilen	Yılı Net Tahsilati
01 Vergi Gelirleri	0,00	15.000,00
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	767.000,00	3.250.093,16
04 Alınan Yardım ve Bağışlar	0,00	143.556.295,09
05 Diğer Gelirler	19.233.000,00	27.272.428,61
06 Sermaye Gelirleri	6.000.000,00	29.400,00
GENEL TOPLAM	**26.000.000,00**	**174.123.216,86**

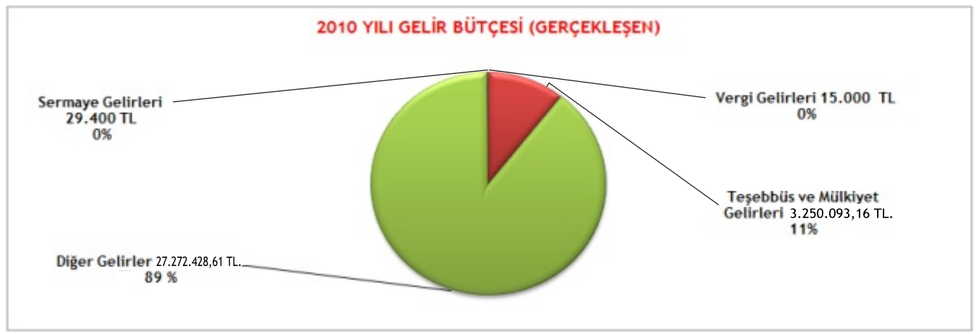

BUTCE GELIRLERi KESIN HESAP CETVELI

EKONOMİK SINIFLANDIRMA	AÇIKLAMA	A	B	TAHAKKUK C	D	TAHSİLAT E	F	G	H
		Bütçe ile Tahmin Edilen	Devreden Gelir Tahakkuku	Yılı Tahakkuku	Toplam Tahakkuk (B+C)	Yılı Tahsilatı	Tahsilattan Red ve İadeler	Yılı Net Tahsilatı (E-F)	Gelecek Yıla Devreden Tahakkuk (D-G)
01.6.9.99	Diğer Harçlar	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
03.1.1.01	Şartname, Basili Evrak, Form Satis Gelirleri	75.000,00	0,00	217.545,00	217.545,00	217.545,00	0,00	217.545,00	0,00
03.1.2.03	Avukatlik Vekalet Ücreti Gelirleri	0,00	0,00	10.258,40	10.258,40	10.258,40	0,00	10.258,40	0,00
03.1.2.06	Laboratuvar Deney ve Analiz Gelirleri	20.000,00	0,00	260.436,00	260.436,00	260.436,00	0,00	260.436,00	0,00
03.1.2.58	Su Hizmetlerine Iliskin Gelirler	117.000,00	0,00	224.296,64	224.296,64	224.296,64	0,00	224.296,64	0,00
03.4.5.53	Egitim Hizmetlerine Iliskin Kurumlar Hasilati	0,00	0,00	10.058,93	10.058,93	10.058,93	0,00	10.058,93	0,00
03.6.1.01	Lojman kira Geliri	200.000,00	0,00	247.726,36	247.726,36	248.675,56	949,20	247.726,36	0,00
03.6.1.02	Ecrimisil Gelirleri	0,00	0,00	102.855,57	102.855,57	102.855,57	0,00	102.855,57	0,00
03.6.1.05	Kültür Amaçli Tesis Kira Gelirleri	60.000,00	0,00	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00
03.6.1.99	Diger Tasinmaz Kira Gelirleri	270.000,00	18.205,48	2.008.527,56	2.026.733,04	2.008.527,56	0,00	2.008.527,56	18.205,48
03.6.2.01	Tasinir Kira Gelirleri	25.000,00	0,00	167.828,70	167.828,70	167.828,70	0,00	167.828,70	0,00
04.2.1.51	Muhtar ödenekleri için genel bütçeden alinan	0,00	0,00	2.958.812,35	2.958.812,35	2.958.812,35	0,00	2.958.812,35	0,00
04.2.1.99	Cari nitelikli diger isler için genel bütçeden alinan	0,00	0,00	46.904.584,00	46.904.584,00	46.904.584,00	0,00	46.904.584,00	0,00
04.2.2.51	Alt yapi hizmetleri i çin genel bütçeden alinan	0,00	0,00	2.974.310,30	2.974.310,30	2.974.310,30	0,00	2.974.310,30	0,00
04.2.2.52	Egitim Hizmetlerine Iliskin Kurumlar Hasilati	0,00	0,00	15.754.894,70	15.754.894,70	15.754.894,70	0,00	15.754.894,70	0,00
04.2.2.99	Sermaye nitelikli diger isler i çin genel bütçeden alinan	0,00	0,00	5.878.855,99	5.878.855,99	5.878.855,99	0,00	5.878.855,99	0,00
04.4.1.01	Kurumlardan alinan yardim ve bagislar	0,00	0,00	154.757,27	154.757,27	154.757,27	0,00	154.757,27	0,00
04.4.2.01	Kurumlardan alinan yardim ve bagislar	0,00	0,00	350.885,00	350.885,00	350.885,00	0,00	350.885,00	0,00
04.4.2.02	Kisilerden alinan yardim ve bagislar	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
04.5.1.01	Genel Bütçeli Idarelerden Alinan Proje Yardimlari	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00
04.5.2.01	Genel Bütçeli Idarelerden Alinan Proje Yardimlari	0,00	0,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00	0,00	765.000,00	0,00
04.5.2.05	Mahalli İdarelerden Alinan Proje Yardimlari	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
04.5.2.09	Digerlerinden Alinan Proje Yardimlari	0,00	0,00	67.536.195,48	67.536.195,48	67.536.195,48	0,00	67.536.195,48	0,00
05.1.9.01	Kisilerden Alacaklar Faizleri	0,00	0,00	162,21	162,21	162,21	0,00	162,21	0,00
05.1.9.03	Mevduat Faizleri	200.000,00	0,00	1.052.714,75	1.052.714,75	1.052.714,75	0,00	1.052.714,75	0,00
05.2.2.51	Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alinan Paylar	18.740.000,00	0,00	23.628.363,84	23.628.363,84	23.628.363,84	0,00	23.628.363,84	0,00
05.2.4.99	Diger Harcamalara Katilma Paylari	0,00	0,00	916.429,00	916.429,00	916.429,00	0,00	916.429,00	0,00
05.2.8.51	Maden Isletmelerinde n Alinan Paylar	293.000,00	0,00	885.189,65	885.189,65	885.189,65	0,00	885.189,65	0,00
05.2.8.99	Mahalli Idarelere Ait Diger Paylar	0,00	0,00	1.790,63	1.790,63	1.790,63	0,00	1.790,63	0,00
05.2.9.01	Tedavi Katılım Payları	0,00	0,00	4.587,00	4.587,00	4.587,00	0,00	4.587,00	0,00
05.2.9.99	Diger Paylar	0,00	65.268,63	177.246,98	242.515,61	201.481,97	0,00	201.481,97	41.033,64
05.3.2.99	Diger İdari Para Cezalari	0,00	0,00	29.546,95	29.546,95	29.546,95	0,00	29.546,95	0,00
05.3.9.99	Yukarida Tanimlanmaya n Diger Para Cezalari	0,00	0,00	14.001,85	14.001,85	14.001,85	0,00	14.001,85	0,00
05.9.1.01	İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	0,00	0,00	18.469,30	18.469,30	18.469,30	0,00	18.469,30	0,00
05.9.1.06	Kisilerden Alacaklar	0,00	6.110,37	8.846,63	14.957,00	13.471,76	0,00	13.471,76	1.485,54
05.9.1.99	Yukarida Tanimlanmaya n Diger Çesitli Gelirler	0,00	0,00	506.219,70	506.219,70	506.219,70	0,00	506.219,70	0,00
06.1.3.01	Diger Bina Satis Gelirleri	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00	0,00
	GENEL TOPLAM:	**26.000.000,00**	**89.584,48**	**174.064.956,74**	**174.154.541,22**	**174.124.166,06**	**949,20**	**174.123.216,86**	**60.724,66**
	TOPLAM	**26.000.000,00**	**89.584,48**	**174.064.956,74**	**174.154.541,22**	**174.124.166,06**	**949,20**	**174.123.216,86**	**60.724,66**

BUTCE GELIRLERi KESIN HESAP CETVELI (ÖZ GELİR)

EKONOMİK SINIFLANDIRMA	AÇIKLAMA		TAHAKKUK			TAHSİLAT			
		A	B	c	D	E	F	G	H
		Bütçe ile Tahmin Edilen	Devreden Gelir Tahakkuku	Yılı Tahakkuku	Toplam Tahakkuk (B+C)	Yılı Tahsilatı	Tahsilattan Red ve İadeler	YılıNet Tahsilatı (E-F)	Gelecek Yıla Devreden Tahakkuk (D-G)
01.6.9.99	Diger Harçlar	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
03.1.1.01	Şartname, Basili Evrak, Form Satis Gelirleri	75.000,00	0,00	217.545,00	217.545,00	217.545,00	0,00	217.545,00	0,00
03.1.2.03	Avukatlik Vekalet Ücreti Gelirleri	0,00	0,00	10.258,40	10.258,40	10.258,40	0,00	10.258,40	0,00
03.1.2.06	Laboratuvar Deney ve Analiz Gelirleri	20.000,00	0,00	260.436,00	260.436,00	260.436,00	0,00	260.436,00	0,00
03.1.2.58	Su Hizmetlerine Iliskin Gelirler	117.000,00	0,00	224.296,64	224.296,64	224.296,64	0,00	224.296,64	0,00
03.4.5.53	Egitim Hizmetlerine Iliskin Kurumlar Hasilati	0,00	0,00	10.058,93	10.058,93	10.058,93	0,00	10.058,93	0,00
03.6.1.01	Lojman kira Geliri	200.000,00	0,00	247.726,36	247.726,36	248.675,56	949,20	247.726,36	0,00
03.6.1.02	Ecrimisil Gelirleri	0,00	0,00	102.855,57	102.855,57	102.855,57	0,00	102.855,57	0,00
03.6.1.05	Kültür Amaçli Tesis Kira Gelirleri	60.000,00	0,00	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00
03.6.1.99	Diger Tasinmaz Kira Gelirleri	270.000,00	18.205,48	2.008.527,56	2.026.733,04	2.008.527,56	0,00	2.008.527,56	18.205,48
03.6.2.01	Tasinir Kira Gelirleri	25.000,00	0,00	167.828,70	167.828,70	167.828,70	0,00	167.828,70	0,00
05.1.9.01	Kisilerden Alacaklar Faizleri	0,00	0,00	162,21	162,21	162,21	0,00	162,21	0,00
05.1.9.03	Mevduat Faizleri	200.000,00	0,00	1.052.714,75	1.052.714,75	1.052.714,75	0,00	1.052.714,75	0,00
05.2.2.51	Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alinan Paylar	18.740.000,00	0,00	23.628.363,84	23.628.363,84	23.628.363,84	0,00	23.628.363,84	0,00
05.2.4.99	Diger Harcamalara Katilma Paylari	0,00	0,00	916.429,00	916.429,00	916.429,00	0,00	916.429,00	0,00
05.2.8.51	Maden Isletmelerinde n Alinan Paylar	293.000,00	0,00	885.189,65	885.189,65	885.189,65	0,00	885.189,65	0,00
05.2.8.99	Mahalli Idarelere Ait Diger Paylar	0,00	0,00	1.790,63	1.790,63	1.790,63	0,00	1.790,63	0,00
05.2.9.01	Tedavi Katılım Payları	0,00	0,00	4.587,00	4.587,00	4.587,00	0,00	4.587,00	0,00
05.2.9.99	Diger Paylar	0,00	65.268,63	177.246,98	242.515,61	201.481,97	0,00	201.481,97	41.033,64
05.3.2.99	Diger İdari Para Cezalari	0,00	0,00	29.546,95	29.546,95	29.546,95	0,00	29.546,95	0,00
05.3.9.99	Yukarida Tanimlanmaya n Diger Para Cezalari	0,00	0,00	14.001,85	14.001,85	14.001,85	0,00	14.001,85	0,00
05.9.1.01	İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	0,00	0,00	18.469,30	18.469,30	18.469,30	0,00	18.469,30	0,00
05.9.1.06	Kisilerden Alacaklar	0,00	6.110,37	8.846,63	14.957,00	13.471,76	0,00	13.471,76	1.485,54
05.9.1.99	Yukarida Tanimlanmaya n Diger Çesitli Gelirler	0,00	0,00	506.219,70	506.219,70	506.219,70	0,00	506.219,70	0,00
06.1.3.01	Diger Bina Satis Gelirleri	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00	0,00
	TOPLAM	**26.000.000,00**	**89.584,48**	**30.508.661,65**	**30.598.246,13**	**30.567.870,97**	**949,20**	**30.566.921,77**	**60.724,66**

31/12/2010 TARİHİ İTİBARİYLE TÜM KURUMLARIN ÖDENEK İCMALİ

	Geçen Yıldan Devreden	Butce İle Verilen	Ek Ve Olağan Üstü	Aktarmayla Eklenen	Aktarmayla Düşülen	Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden
GENEL SEKRETERLİK TOPLAMI	**20.354.535,86**	**3.591.000,00**	**94.133.440,34**	**3.690.191,56**	**3.392.277,08**	**118.376.890,68**	**80.724.077,18**	**105.797,19**	**37.547.016,31**
Sivil Savunma Müdürlüğü	0,00	0,00	66.738.275,00	95.000,00	0,00	66.833.275,00	60.197.917,87	9.975,61	6.625.381,52
İl Emniyet Müdürlüğü	1.252.696,42	0,00	813.000,00	10.750,63	10.750,63	2.065.696,42	1.163.416,71	262,30	902.017,41
İl Tarım Müdürlüğü	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	53.888,00	6.112,00	0,00
Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü	0,00	50.000,00	185.603,40	21.117,37	21.117,37	235.603,40	231.895,09	3.708,31	0,00
İl Sağlık Müdürlüğü	1.356.542,03	55.000,00	4.243.488,78	54.241,49	54.241,49	5.655.030,81	2.992.971,21	22.494,54	2.639.565,06
İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü	37.846,57	20.000,00	390.287,69	15.956,48	0,00	464.090,74	153.548,61	5.036,94	305.505,19
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü	0,00	50.000,00	130.000,00	0,00	0,00	180.000,00	175.000,00	5.000,00	0,00
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü	5.562.578,66	20.000,00	2.226.000,00	1.544.221,86	1.375.913,86	7.976.886,66	3.108.039,32	52.228,81	4.816.618,53
İl Milli Eğitim Müdürlüğü	12.144.872,18	3.336.000,00	19.406.785,47	1.948.903,73	1.930.253,73	34.906.307,65	12.647.400,37	978,68	22.257.928,60
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	300.000,00	0,00	105.000,00	50.000,00	355.000,00	333.656,21	21.343,79	0,00
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	3.368,83	4.480.500,00	171.450,52	273.000,00	1.247.888,00	3.680.431,35	2.979.145,44	608.466,56	92.819,35
İNSAN KAY. VE EĞİTİM MÜD.	143.125,61	6.680.000,00	34.685.173,45	670.000,00	670.000,00	41.508.299,06	41.138.364,16	357.440,56	12.494,34
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	689.000,00	0,00	0,00	0,00	689.000,00	579.444,97	109.555,03	0,00
EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	50.000,00	0,00	23.000,00	0,00	73.000,00	27.073,02	45.926,98	0,00
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	6.166,96	157.500,00	0,00	0,00	0,00	163.666,96	54.224,94	109.442,02	0,00
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	493.301,24	2.985.000,00	3.200.000,00	396.500,00	396.500,00	6.678.301,24	6.407.895,14	38.767,89	231.638,21
İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜD.	600.913,41	105.000,00	50.000,00	373.330,00	3.956,48	1.125.286,93	516.809,55	47.804,33	560.673,05
YOL VE ULAŞIM HİZMETŞERİ MÜD.	747.966,29	8.400.000,00	4.317.815,00	87.700,00	62.700,00	13.490.781,29	11.292.346,66	93.401,52	2.105.033,11
SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜD.	227.186,28	5.630.000,00	1.250.000,00	30.000,00	0,00	7.137.186,28	4.708.899,70	162.970,89	2.265.315,69
PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	32.000,00	50.000,00	150.000,00	121.000,00	16.000,00	337.000,00	118.129,66	68.870,34	150.000,00
TÜM İLÇELER	791.993,13	1.382.000,00	6.875.112,85	90.600,00	21.000,00	9.118.705,98	7.501.004,95	446.705,89	1.170.995,14
TOPLAM	**23.400.557,61**	**34.500.000,00**	**144.832.992,16**	**5.860.321,56**	**5.860.321,56**	**202.733.549,77**	**156.381.071,58**	**2.216.492,99**	**44.135.985,20**

BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ
İL AFET MÜDÜRLÜĞÜ

Fonk.	Fin.	Eko.	Açıklama	Geçen Yıldan Devreden	Butce İle Verilen	Ek Ve Olağan Üstü	Aktarmayla Eklenen	Aktarmayla Düşülen	Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden
02.2.0.00.000	8	01.1	MEMURLAR	0,00	0,00	1.150.500,00	0,00	0,00	1.150.500,00	1.125.381,90	0,00	25.118,10
02.2.0.00.000	8	02.1	MEMURLAR	0,00	0,00	210.500,00	0,00	0,00	210.500,00	207.816,95	0,00	2.683,05
02.2.0.00.000	5	03.2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	35.384,12	615,88	0,00
02.2.0.00.000	8	03.3	YOLLUKLAR	0,00	0,00	50.590,00	0,00	0,00	50.590,00	44.973,25	0,00	5.616,75
02.2.0.00.000	5	03.4	GÖREV GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.023,25	2.976,75	0,00
02.2.0.00.000	5	03.5	HİZMET ALIMLARI	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	27.024,94	5.975,06	0,00
02.2.0.00.000	5	03.7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	15.646,96	353,04	0,00
02.2.0.00.000	5	03.8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.950,00	50,00	0,00
02.2.0.00.000	8	03.9	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0,00	0,00	11.410,00	0,00	0,00	11.410,00	11.405,12	4,88	0,00
02.2.0.00.000	8	07.1	YURT İÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	0,00	2.168.675,00	0,00	0,00	2.168.675,00	1.766.900,00	0,00	401.775,00
02.2.0.02.000	8	06.5	Deprem Konutu Yapım Projesi	0,00	0,00	63.114.000,00	0,00	0,00	63.114.000,00	56.956.411,38	0,00	6.157.588,62
02.2.0.03.000	8	06.5	Seydili Köyü Afet Konutları İstinat Duvarı Yapımı	0,00	0,00	32.600,00	0,00	0,00	32.600,00	0,00	0,00	32.600,00
			TOPLAM	0,00	0,00	66.738.275,00	95.000,00	0,00	66.833.275,00	60.197.917,87	9.975,61	6.625.381,52

BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ
İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Fonk.	Fin.	Eko.	Açıklama	Geçen Yıldan Devreden	Butce İle Verilen	Ek Ve Olağan Üstü	Aktarmayla Eklenen	Aktarmayla Düşülen	Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden
03.1.1.00.000	8	03.2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
03.1.1.00.000	8	03.8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	6.421,00	0,00	6.421,00	6.159,60	261,40	0,00
03.1.1.00.000	8	06.1	MAMUL MAL ALIMLARI	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
03.1.1.01.000	8	06.7	Emniyet Müd.Hizmet Binalari Onarimi	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	35.513,33	0,00	14.486,67
03.1.1.02.000	8	03.8	Zülfü Agar Polis Meslek Yüksek Okulu Onarimi	35.366,43	0,00	0,00	0,00	0,00	35.366,43	0,00	0,00	35.366,43
03.1.1.02.000	8	06.7	Zülfü Agar Polis Meslek Yüksek Okulu Onarimi	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	22.228,65	0,00	177.771,35
03.1.1.05.000	8	03.8	Sivrice Emniyet Müdürlügü Hizmet Binasi Onarimi	13.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.328,00	11.800,00	0,00	1.528,00
03.1.1.06.000	8	06.7	Keban yolu 238 Daireli Polis Lojmanlari Onarimi	4.329,63	0,00	250.000,00	0,00	4.329,63	250.000,00	184.055,90	0,00	65.944,10
03.1.1.15.000	8	03.8	Il Emniyet Müd.Hizmet Binasi Nezarethane ve Ifade Alma Odalari Onarimi	4.602,00	0,00	0,00	0,00	4.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.1.16.000	8	03.2	Kent Izleme Sistemi (Mobese)	0,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00	252.000,00	0,00	0,00
03.1.1.18.000	8	06.7	F.Çakmak, Aksaray Polis Merkezi Nezarethane ve Ifade Alma Odalari Standartlastirma	1.819,90	0,00	0,00	0,00	1.819,00	0,90	0,00	0,90	0,00
03.1.1.19.000	8	06.5	Alacakaya Emniyet Amirligi Hizmet Binasi Yapimi	566.750,46	0,00	0,00	0,00	0,00	566.750,46	473.738,83	0,00	93.011,63
03.1.1.23.000	8	06.7	Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binaları Deprem Güvenliği ve Proje Giderleri	216.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.500,00	0,00	0,00	216.500,00
03.1.1.24.000	8	06.7	Emniyet Müdürlüğü Polis Lojmanları Deprem Güvenliği ve Proje Giderleri	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
03.1.1.26.000	8	06.7	İlçe Emniyet Polis Merkez Amirliği Hizmet Binaları Muhtelif Onarımları	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	137.352,00	0,00	12.648,00
03.1.1.27.000	8	06.7	Kovancılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Lojmanlı Hizmet Binası Onarımı	0,00	0,00	38.000,00	4.329,63	0,00	42.329,63	40.568,40	0,00	1.761,23
03.1.1.28.000	8	06.5	Palu İlçe Emniyet Müdürlüğü TOKİ Polis Lojmanları İhata Duvarı Yapımı	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
			TOPLAM	1.252.696,42	0,00	813.000,00	10.750,63	10.750,63	2.065.696,42	1.163.416,71	262,30	902.017,41

BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ
TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ

Fonk.	Fin.	Eko.	Açıklama	Geçen Yıldan Devreden	Butce İle Verilen	Ek Ve Olağan Üstü	Aktarmayla Eklenen	Aktarmayla Düşülen	Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden
04.2.1.00.000	5	03.2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	53.888,00	1.112,00	0,00
04.2.1.00.000	5	03.5	HİZMET ALIMLARI	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
			TOPLAM	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**53.888,00**	**6.112,00**	**0,00**

BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ
BAYINDIRLIK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Fonk.	Fin.	Eko.	Açıklama	Geçen Yıldan Devreden	Butce İle Verilen	Ek Ve Olağan Üstü	Aktarmayla Eklenen	Aktarmayla Düşülen	Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden
06.1.0.00.000	5	03.2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0,00	35.000,00	0,00	0,00	20.013,32	14.986,68	14.986,68	0,00	0,00
06.1.0.00.000	5	03.4	GÖREV GİDERLERİ	0,00	1.000,00	0,00	0,00	574,17	425,83	425,83	0,00	0,00
06.1.0.00.000	5	03.5	HİZMET ALIMLARI	0,00	1.500,00	0,00	0,00	529,88	970,12	970,12	0,00	0,00
06.1.0.00.000	5	03.7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	0,00	12.500,00	57.209,00	21.117,37	0,00	90.826,37	90.821,63	4,74	0,00
06.1.0.00.000	5	03.8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	0,00	0,00	13.375,30	0,00	0,00	13.375,30	13.375,30	0,00	0,00
06.1.0.01.000	5	06.1	Taşıt Alımı	0,00	0,00	115.019,10	0,00	0,00	115.019,10	111.315,53	3.703,57	0,00
			TOPLAM	**0,00**	**50.000,00**	**185.603,40**	**21.117,37**	**21.117,37**	**235.603,40**	**231.895,09**	**3.708,31**	**0,00**

BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Fonk.	Fin.	Eko.	Açıklama	Geçen Yıldan Devreden	Butce İle Verilen	Ek Ve Olağan Üstü	Aktarmayla Eklenen	Aktarmayla Düşülen	Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden
07.2.1.00.000	8	03.2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	1.008,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,43	0,00	0,00	1.008,43
07.2.1.00.000	5	03.5	HİZMET ALIMLARI	0,00	5.000,00	0,00	25.000,00	0,00	30.000,00	8.256,46	21.743,54	0,00
07.2.1.00.000	5	03.8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	0,00	50.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	24.249,00	751,00	0,00
07.2.1.00.000	8	03.8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	34.742,47	0,00	0,00	0,00	29.241,49	5.500,98	0,00	0,00	5.500,98
07.2.1.00.000	8	06.1	MAMUL MAL ALIMLARI	5.291,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5.291,76	0,00	0,00	5.291,76
07.2.1.09.000	8	03.8	Ruh Sagligi ve Hastaliklari Hastanesi Onarimi	15.576,65	0,00	0,00	0,00	0,00	15.576,65	0,00	0,00	15.576,65
07.2.1.42.000	5	06.5	Alacakaya Toplum Sagligi Merkezi Yapimi	3.554,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554,87	0,00	0,00	3.554,87
07.2.1.42.000	8	06.5	Alacakaya Toplum Sagligi Merkezi Yapimi	1.199,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,87	0,00	0,00	1.199,87
07.2.1.46.000	8	06.5	Acil Sağlık Hiz.Komuta Kontrol Merkezi ve Sağlık Müd.Hizmet Binası Yapımı	1.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
07.2.1.47.000	8	06.5	Karakoçan Toplum Sağlığı Merkezi Yapımı	200.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	540.000,00	524.263,22	0,00	15.736,78
07.2.1.48.000	8	06.7	Sağlık Tesisleri Onarımı	91.740,00	0,00	250.000,00	29.241,49	0,00	370.981,49	343.151,31	0,00	27.830,18
07.2.1.49.000	8	06.5	Maden Toplum Sağlığı Merkezi Yapımı	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
07.2.1.50.000	8	06.7	Kovancılar Devlet Hastahanesi Çevre Düzenlemesi	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
07.2.1.51.000	8	06.1	Kovancılar Devlet Hastanesi Tıbbi Cihaz Alımı	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
07.3.1.00.000	8	03.2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
07.3.1.01.000	8	06.5	Kovancilar Devlet Hastanesi Ek Bina Yapimi	466,36	0,00	2.093.488,78	0,00	0,00	2.093.955,14	2.093.051,22	0,00	903,92
07.3.1.02.000	8	06.5	Palu Devlet Hastanesi Tibbi Atik Deposu Yapimi	2.961,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.961,62	0,00	0,00	2.961,62
			TOPLAM	**1.356.542,03**	**55.000,00**	**4.243.488,78**	**54.241,49**	**54.241,49**	**5.655.030,81**	**2.992.971,21**	**22.494,54**	**2.639.565,06**

BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ
İL SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Fonk.	Fin.	Eko.	Açıklama	Geçen Yıldan Devreden	Butce İle Verilen	Ek Ve Olağan Üstü	Aktarmayla Eklenen	Aktarmayla Düşülen	Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden
07.3.4.00.000	8	03.2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	978,19	0,00	0,00	0,00	0,00	978,19	0,00	0,00	978,19
07.3.4.00.000	5	03.5	HİZMET ALIMLARI	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.250,00	4.750,00	0,00
07.3.4.00.000	5	03.7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	0,00	10.000,00	0,00	12.000,00	0,00	22.000,00	21.747,00	253,00	0,00
07.3.4.00.000	8	06.1	MAMUL MAL ALIMLARI	35.694,38	0,00	240.287,69	0,00	0,00	275.982,07	121.455,07		154.527,00
07.3.4.02.000	8	03.8	Harput Yetistirme Yurdu Binasi Onarimi	1.174,00	0,00	0,00	3.956,48	0,00	5.130,48	5.096,54	33,94	0,00
07.3.4.03.000	8	06.7	Merkez Gazi Huzurevi Onarimi	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
07.3.4.06.000	8	06.5	Spor Sahaları Yapım Giderleri	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
			TOPLAM	37.846,57	20.000,00	390.287,69	15.956,48	0,00	464.090,74	153.548,61	5.036,94	305.505,19

BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ
GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Fonk.	Fin.	Eko.	Açıklama	Geçen Yıldan Devreden	Butce İle Verilen	Ek Ve Olağan Üstü	Aktarmayla Eklenen	Aktarmayla Düşülen	Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Sonraki Yıla Devreden
08.1.0.00.000	5	03.2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
08.1.0.00.000	5	03.5	HİZMET ALIMLARI	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
08.1.0.01.000	5	06.7	Spor Tesisleri Bakim ve Onarim Giderleri	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
08.1.0.02.000	8	06.5	Spor Tesisleri Yapim Giderleri	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
			TOPLAM	0,00	50.000,00	130.000,00	0,00	0,00	180.000,00	175.000,00	0,00

BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ
İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Fonk.	Fin.	Eko.	Açıklama	Geçen Yıldan Devreden	Butce İle Verilen	Ek Ve Olağan Üstü	Aktarmayla Eklenen	Aktarmayla Düşülen	Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden
08.2.0.00.000	5	03.2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0,00	15.000,00	0,00	131.308,00	0,00	146.308,00	94.089,99	52.218,01	0,00
08.2.0.00.000	5	03.5	HİZMET ALIMLARI	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.998,04	1,96	0,00
08.2.0.00.000	8	03.5	HİZMET ALIMLARI	171.418,70	0,00	0,00	0,00	117.913,86	53.504,84	0,00	0,00	53.504,84
08.2.0.00.000	5	03.6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	36.991,51	8,49	0,00
08.2.0.02.000	8	06.5	Kültür Merkezi Binasi Yapimi	1.563.123,64	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	3.063.123,64	0,00	0,00	3.063.123,64
08.2.0.03.000	8	06.7	Harput Kalesi Onarimi	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.061.495,90	0,00	138.504,10
08.2.0.04.000	8	06.5	Harput Yerlesim Merkezi Altyapi Uygulamalari	850.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08.2.0.05.000	8	06.5	Harput Koruma Amaçli Imar Plani Sokak Sagliklastirma	458.000,00	0,00	0,00	0,00	458.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.2.0.06.000	8	06.7	Elazig Müzesi Onarimi	1.225.131,00	0,00	666.000,00	0,00	0,00	1.891.131,00	1.850.125,91	0,00	41.005,09
08.2.0.07.000	8	06.7	Elazig Devlet Klasik Türk Müzigi Korosu Hizmet Binasi Onarimi	440,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.440,00	48.793,00	0,00	1.647,00
08.2.0.08.000	8	03.8	Eski Hükümet Konaginin Kültürevine Dönüstürülmesi	12.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.920,00	0,00	0,00	12.920,00
08.2.0.10.000	8	06.1	Harput İç Kale Kazı Giderleri	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
08.2.0.11.000	8	03.5	Harput Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesinin Geliştirilmesi	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
08.2.0.12.000	8	03.8	Elazığ İl Halk Kütüphanesi Deprem Güçlendirme Prj.Giderleri	1.545,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,32	1.544,97	0,35	0,00
08.2.0.13.000	8	06.5	Harput Altyapı ve Sokak Sağlıklaştırma Uygulamaları	0,00	0,00	0,00	1.375.913,86	0,00	1.375.913,86	0,00	0,00	1.375.913,86
			TOPLAM	5.562.578,66	20.000,00	2.226.000,00	1.544.221,86	1.375.913,86	7.976.886,66	3.108.039,32	52.228,81	4.816.618,53

BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Fonk.	Fin.	Eko.	Açıklama	Geçen Yıldan Devreden	Butce İle Verilen	Ek Ve Olağan Üstü	Aktarmayla Eklenen	Aktarmayla Düşülen	Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden
09.1.1.00.000	8	03.2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	67.214,00	0,00	80.900,00	0,00	0,00	148.114,00	6.433,20	0,00	141.680,80
09.1.1.00.000	8	03.5	HİZMET ALIMLARI	11.180,00	0,00	39.520,00	0,00	0,00	50.700,00	15.777,78	0,00	34.922,22
09.1.1.00.000	8	03.7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALİM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	300,00	0,00	600,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
09.1.1.00.000	8	06.1	MAMUL MAL ALIMLARI	0,00	0,00	102.240,00	0,00	18.600,00	83.640,00	44.087,10	0,00	39.552,90
09.1.1.01.000	5	06.5	Merkez Sürsürü Mah.100 Ögrenci Kapasiteli Ana Okulu Yapimi	95.496,12	0,00	0,00	0,00	0,00	95.496,12	0,00	0,00	95.496,12
09.1.1.01.000	8	06.5	Merkez Sürsürü Mah.100 Ögrenci Kapasiteli Ana Okulu Yapimi	14.238,26	0,00	0,00	0,00	0,00	14.238,26	0,00	0,00	14.238,26
09.1.1.03.000	8	06.5	Okul Öncesi Eğitimi Yeni Yapım ve Ek Yapım İşleri	362.415,20	0,00	758.169,80	0,00	0,00	1.120.585,00	643.638,10	0,00	476.946,90
09.1.1.04.000	8	06.7	Bağımsız Anaokulları Genel Onarımı	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	108.078,47	0,00	19.921,53
09.1.2.00.000	5	03.2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	3.333,68	650.000,00	0,00	15.000,00	0,00	668.333,68	666.248,23	0,00	2.085,45
09.1.2.00.000	8	03.2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	396.772,43	0,00	2.151.645,10	0,00	0,00	2.548.417,53	1.585.861,20	0,00	962.556,33
09.1.2.00.000	8	03.3	YOLLUKLAR	276,10	0,00	0,00	0,00	0,00	276,10	0,00	276,10	0,00
09.1.2.00.000	5	03.4	GÖREV GİDERLERİ	6.956,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6.956,30	4.415,52	0,00	2.540,78
09.1.2.00.000	8	03.4	GÖREV GİDERLERİ	951,25	0,00	0,00	0,00	0,00	951,25	172,26	0,00	778,99
09.1.2.00.000	5	03.5	HİZMET ALIMLARI	143,68	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.143,68	5.251,00	0,00	3.892,68
09.1.2.00.000	8	03.5	HİZMET ALIMLARI	134.752,28	0,00	1.036.900,52	0,00	5.000,00	1.166.652,80	925.376,82	0,00	241.275,98
09.1.2.00.000	8	03.6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	7.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.142,00	0,00	0,00	7.142,00
09.1.2.00.000	5	03.7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALİM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	4.301,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4.301,52	4.130,00	0,00	171,52
09.1.2.00.000	8	03.7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALİM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	5.570,43	0,00	80.885,00	17.000,00	0,00	103.455,43	92.953,68	0,00	10.501,75
09.1.2.00.000	5	03.8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	849,54	0,00	0,00	0,00	0,00	849,54	0,00	0,00	849,54

BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Fonk.	Fin.	Eko.	Açıklama	Geçen Yıldan Devreden	Butce İle Verilen	Ek Ve Olağan Üstü	Aktarmayla Eklenen	Aktarmayla Düşülen	Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden
09.1.2.00.000	8	03.8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	45.114,63	0,00	100.031,00	0,00	0,00	145.145,63	116.448,78	0,00	28.696,85
09.1.2.00.000	5	06.1	MAMUL MAL ALIMLARI	694,78	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.694,78	42.480,00	0,00	3.214,78
09.1.2.00.000	8	06.1	MAMUL MAL ALIMLARI	211.488,82	0,00	292.967,00	0,00	0,00	504.455,82	415.030,90	0,00	89.424,92
09.1.2.03.000	5	06.5	Ilkögretim Derslik ve Ek Derslik Yapimi	2.611.491,77	1.961.000,00	0,00	0,00	0,00	4.572.491,77	0,00	0,00	4.572.491,77
09.1.2.03.000	8	06.5	Ilkögretim Derslik ve Ek Derslik Yapimi	489.099,50	0,00	2.196.457,50	0,00	0,00	2.685.557,00	1.883.540,94	0,00	802.016,06
09.1.2.04.000	5	06.7	Ilkögretim Okullari Onarimi	6.859,78	700.000,00	0,00	0,00	0,00	706.859,78	505.866,47	0,00	200.993,31
09.1.2.04.000	8	06.7	Ilkögretim Okullari Onarimi	776.464,64	0,00	4.536.205,40	0,00	0,00	5.312.670,04	1.259.965,71	0,00	4.052.704,33
09.1.2.08.000	5	06.5	Karakoçan Yolçati 8 Derslik Ilkögretim Okulu Yapimi	0,00	0,00	0,00	5.235,81	0,00	5.235,81	5.235,81	0,00	0,00
09.1.2.08.000	8	06.5	Karakoçan Yolçati 8 Derslik Ilkögretim Okulu Yapimi	3.577,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.577,20	3.577,20	0,00	0,00
09.1.2.18.000	5	06.5	Aricak Merkez 12 Derslik Ilkögretim Okulu Yapimi	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.2.18.000	8	06.5	Aricak Merkez 12 Derslik Ilkögretim Okulu Yapimi	9.935,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.935,80	0,00	0,00	9.935,80
09.1.2.34.000	8	06.4	Ilkögretim Kamulastirma Giderleri	6.977,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6.977,41	2.815,90	0,00	4.161,51
09.1.2.71.000	5	06.5	Merkez 18 Derslik Gazi Ilkögretim Okulu Ek Bina Yapimi	13.316,73	0,00	0,00	0,00	5.235,81	8.080,92	0,00	0,00	8.080,92
09.1.2.73.000	8	06.5	Deprem Güçlendirme Projesi Giderleri	679.403,33	0,00	50.000,00	0,00	0,00	729.403,33	0,00	0,00	729.403,33
09.1.2.81.000	5	06.5	Merkez Yenice 2 Derslik Ilkögretim Okulu Yapimi	25,97	0,00	0,00	0,00	0,00	25,97	0,00	25,97	0,00
09.1.2.81.000	8	06.5	Merkez Yenice 2 Derslik Ilkögretim Okulu Yapimi	4.031,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4.031,82	0,00	0,00	4.031,82
09.1.2.84.000	5	06.5	Baskil Kadiköy 8 Derslik Ilkögretim Okulu Ek Bina Yapimi	6.452,61	0,00	0,00	0,00	0,00	6.452,61	0,00	0,00	6.452,61
09.1.2.84.000	8	06.5	Baskil Kadiköy 8 Derslik Ilkögretim Okulu Ek Bina Yapimi	1.897,00	0,00	3.214,15	0,00	0,00	5.111,15	0,00	0,00	5.111,15
09.1.2.85.000	8	06.5	Mer. Yildizbaglari Iki Derslik Ilkögretim Okulu Yapimi	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00

BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Fonk.	Fin.	Eko.	Açıklama	Geçen Yıldan Devreden	Butce İle Verilen	Ek Ve Olağan Üstü	Aktarmayla Eklenen	Aktarmayla Düşülen	Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden
09.1.2.86.000	8	06.5	Sürsürü Mah.8 Derslikli İlköğretim Okulu (Prefabrik) Yapimi	20.142,65	0,00	0,00	0,00	0,00	20.142,65	0,00	0,00	20.142,65
09.1.2.89.000	5	06.5	Baskil Kulusagi Kot Mezrasi 1 Derslik Prafabrik Okul Yapimi	4.721,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4.721,27	0,00	0,00	4.721,27
09.1.2.92.000	8	06.5	Agin Ilçesi 6 Dairelik Lojman Yapimi	98.464,68	0,00	0,00	0,00	17.000,00	81.464,68	0,00	0,00	81.464,68
09.1.2.96.000	8	06.5	Sürsürü Mah.Fırat Üniversitesi Kampüsü 18 Derslik İlköğretim Okulu Yapımı	76.382,82	0,00	0,00	0,00	0,00	76.382,82	45.284,68	0,00	31.098,14
09.2.1.00.000	8	03.2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
09.2.1.00.000	8	03.5	HİZMET ALIMLARI	51.117,12	0,00	20.000,00	0,00	0,00	71.117,12	29.379,54	0,00	41.737,58
09.2.1.00.000	8	03.7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	10.468,24	0,00	10.468,24	7.858,80	0,00	2.609,44
09.2.1.00.000	5	03.8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	18.250,00	0,00	18.250,00	9.942,71	0,00	8.307,29
09.2.1.00.000	8	06.1	MAMUL MAL ALIMLARI	28.468,24	0,00	0,00	0,00	10.468,24	18.000,00	17.968,32	0,00	31,68
09.2.1.03.000	8	06.5	Merkez Sürsürü Mah.16 Derslik Lise Yapimi	0,00	0,00	0,00	22.462,43	0,00	22.462,43	22.462,43	0,00	0,00
09.2.1.04.000	8	06.5	Kovancilar 16 Derslik Lise yapimi	717.361,37	0,00	0,00	0,00	0,00	717.361,37	129.577,69	0,00	587.783,68
09.2.1.05.000	8	06.5	Merkez 24 Derslik Sarayatik Lisesi Yapimi	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00
09.2.1.06.000	8	06.5	Karakoçan Ögrenci Yurdu Binasi Yapimi	1.202.000,00	0,00	1.000.000,00	903.000,00	0,00	3.105.000,00	702.402,80	0,00	2.402.597,20
09.2.1.13.000	8	06.7	Mer.Balakgazi Lisesi Onarimi	676,28	0,00	0,00	0,00	0,00	676,28	0,00	0,00	676,28
09.2.1.18.000	8	06.5	Merkez Hicret Mah.16 Derslik Lise Yapimi	738.090,88	0,00	0,00	0,00	500.000,00	238.090,88	0,00	0,00	238.090,88
09.2.1.19.000	8	06.7	Imam Hatip Liseleri Onarimi	455.414,14	0,00	229.000,00	0,00	0,00	684.414,14	471.276,68	0,00	213.137,46
09.2.1.20.000	8	06.5	Mer.Sürsürü Mah. 24 Derslik Lise Yapimi	502.885,61	0,00	0,00	0,00	405.461,88	97.423,73	97.423,73	0,00	0,00
09.2.1.21.000	8	06.7	Orta Ögretim Okullari Genel Onarimlari	352.071,22	0,00	882.830,00	0,00	0,00	1.234.901,22	663.062,65	0,00	571.838,57
09.2.1.23.000	8	06.7	Sağlık Meslek Liseleri Onarımı	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	9.263,00	0,00	50.737,00

BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Fonk.	Fin.	Eko.	Açıklama	Geçen Yıldan Devreden	Butce İle Verilen	Ek Ve Olağan Üstü	Aktarmayla Eklenen	Aktarmayla Düşülen	Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden
09.2.1.24.000	8	06.5	Merkez Spor Lisesi Spor Salonu Yapımı	300.000,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	454.000,00	453.431,00	0,00	569,00
09.2.1.25.000	8	06.7	Öğretmen Liseleri Onarımı	5.486,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	245.486,00	160.000,00	0,00	85.486,00
09.2.1.26.000	8	06.5	Merkez Spor Lisesi 200 Öğrenci Kapasiteli Yurt Binası Yapımı	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
09.2.1.27.000	8	06.7	Merkez Anadolu Lisesi ve Pansiyonu Deprem Güçlendirme Prj.	1.342.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342.332,00	0,00	0,00	1.342.332,00
09.2.1.28.000	8	06.5	Karakoçan Anadolu Lisesi Yapımı	0,00	0,00	1.789.000,00	0,00	0,00	1.789.000,00	0,00	0,00	1.789.000,00
09.2.1.29.000	8	06.5	Merkez 200 Öğrenci Kapasiteli Ortaöğretim Pansiyon Yapımı	0,00	0,00	968.000,00	0,00	0,00	968.000,00	0,00	0,00	968.000,00
09.2.1.30.000	8	06.5	Karakoçan 200 Öğrenci Kapasiteli Ortaöğretim Pansiyon Yapımı	0,00	0,00	903.000,00	0,00	903.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.2.1.31.000	8	06.5	Merkez Hıdır Sever Lisesi Ek Bina Yapımı	0,00	0,00	0,00	382.999,45	0,00	382.999,45	382.658,76	0,00	340,69
09.2.1.32.000	8	06.5	Merkez Kaya Karakaya Güzel Sanatlar ve Spor Lisesine 1 Kat İlave Yapımı	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
09.2.2.01.000	8	06.7	Erkek Teknik Öğretim Okulları Onarımı	83.466,01	0,00	200.000,00	0,00	0,00	283.466,01	253.474,40	0,00	29.991,61
09.2.2.02.000	8	06.7	Kız Teknik Öğretim Okulları Onarımı	11.952,55	0,00	956.500,00	0,00	0,00	968.452,55	171.564,64	0,00	796.887,91
09.2.2.03.000	8	06.7	Ticater ve Turizm Okulları Onarımı	1.026,96	0,00	184.000,00	0,00	0,00	185.026,96	32.301,78	0,00	152.725,18
09.2.2.04.000	8	06.7	Halkeğitim ve Mesleki Eğitim Merkezleri Onarımı	10.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	58.000,00	31.894,11	0,00	26.105,89
09.5.0.00.000	5	03.2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0,00	19.500,00	0,00	3.500,00	0,00	23.000,00	22.329,19	670,81	0,00
09.5.0.00.000	5	03.6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.5.0.00.000	5	03.7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.994,20	5,80	0,00

BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Fonk.	Fin.	Eko.	Açıklama	Geçen Yıldan Devreden	Butce İle Verilen	Ek Ve Olağan Üstü	Aktarmayla Eklenen	Aktarmayla Düşülen	Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden
09.5.0.01.000	8	03.8	Özel Egitim Rehberlik ve Danisma Hiz.Okullari Onarimi	16.987,80	0,00	0,00	0,00	16.987,80	0,00	0,00	0,00	0,00
09.5.0.02.000	8	06.7	Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hiz. Okul ve Kurum Onarımları	0,00	0,00	54.720,00	16.987,80	0,00	71.707,80	54.464,19	0,00	17.243,61
09.9.9.01.000	8	06.7	Sivrice Öğretmenevi Onarımı	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
09.9.9.02.000	8	06.7	Baskil Öğretmenevi Onarımı	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			TOPLAM	**12.144.872,18**	**3.336.000,00**	**19.406.785,47**	**1.948.903,73**	**1.930.253,73**	**34.906.307,65**	**12.647.400,37**	**978,68**	**22.257.928,60**

BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Fonk.	Fin.	Eko.	Açıklama	Geçen Yıldan Devreden	Butce İle Verilen	Ek Ve Olağan Üstü	Aktarmayla Eklenen	Aktarmayla Düşülen	Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden
01.1.1.00.000	5	03.2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0,00	129.500,00	0,00	0,00	27.000,00	102.500,00	102.216,55	283,45	0,00
01.1.1.00.000	5	03.3	YOLLUKLAR	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00		0,00
01.1.1.00.000	5	03.4	GÖREV GİDERLERİ	0,00	8.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.000,00	1.034,90	965,10	0,00
01.1.1.00.000	5	03.5	HİZMET ALIMLARI	0,00	36.500,00	0,00	0,00	12.000,00	24.500,00	17.721,77	6.778,23	0,00
01.1.1.00.000	5	03.6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	0,00	80.000,00	0,00	40.000,00	0,00	120.000,00	115.850,54	4.149,46	0,00
01.1.1.00.000	5	03.7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	0,00	26.000,00	0,00	15.000,00	0,00	41.000,00	35.287,36	5.712,64	0,00
01.1.1.00.000	5	03.8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	0,00	15.000,00	0,00	50.000,00	0,00	65.000,00	61.545,09	3.454,91	0,00
			TOPLAM	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**105.000,00**	**50.000,00**	**355.000,00**	**333.656,21**	**21.343,79**	**0,00**

BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Fonk.	Fin.	Eko.	Açıklama	Geçen Yıldan Devreden	Butce İle Verilen	Ek Ve Olağan Üstü	Aktarmayla Eklenen	Aktarmayla Düşülen	Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden
01.3.9.00.000	5	01.1	MEMURLAR	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.085,00	5.915,00	0,00
01.3.9.00.000	5	03.5	HİZMET ALIMLARI	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	50.800,73	199,27	0,00
01.3.9.00.000	5	04.2	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	54.845,55	154,45	0,00
01.6.0.00.000	5	05.3	KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
01.6.0.00.000	5	05.4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
01.6.0.00.000	5	05.8	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	0,00	844.215,00	0,00	0,00	0,00	844.215,00	830.021,76	14.193,24	0,00
01.6.0.00.000	5	07.1	YURT İÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	1.991.285,00	0,00	167.000,00	0,00	2.158.285,00	1.952.392,40	205.892,60	0,00
01.6.0.00.000	8	07.1	YURT İÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	3.368,83	0,00	171.450,52	0,00	0,00	174.819,35	82.000,00		92.819,35
01.6.0.00.000	5	08.1	YURTİÇİ BORÇ VERME	0,00	100.000,00	0,00	0,00	98.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
01.6.0.00.000	5	09.1	PERSONEL YEDEK ÖDENEĞİ	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
01.6.0.00.000	5	09.3	YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00		0,00
01.6.0.00.000	5	09.5	DOĞAL AFET GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
01.6.0.00.000	5	09.6	YEDEK ÖDENEK	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	949.888,00	50.112,00	0,00	50.112,00	0,00
			TOPLAM	**3.368,83**	**4.480.500,00**	**171.450,52**	**273.000,00**	**1.247.888,00**	**3.680.431,35**	**2.979.145,44**	**608.466,56**	**92.819,35**

BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Fonk.	Fin.	Eko.	Açıklama	Geçen Yıldan Devreden	Butce İle Verilen	Ek Ve Olağan Üstü	Aktarmayla Eklenen	Aktarmayla Düşülen	Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden
01.3.9.00.000	5	01.1	MEMURLAR	0,00	1.856.200,00	0,00	0,00	320.000,00	1.536.200,00	1.459.692,67	76.507,33	0,00
01.3.9.00.000	8	01.1	MEMURLAR	97.651,76	0,00	2.567.755,00	0,00	0,00	2.665.406,76	2.665.025,05	381,71	0,00
01.3.9.00.000	5	01.2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	258.944,36	91.055,64	0,00
01.3.9.00.000	5	01.3	İŞÇİLER	0,00	2.053.650,00	0,00	450.000,00	0,00	2.503.650,00	2.487.733,62	15.916,38	0,00
01.3.9.00.000	8	01.3	İŞÇİLER	5.113,70	0,00	24.940.845,85	0,00	0,00	24.945.959,55	24.945.959,55		0,00
01.3.9.00.000	5	01.4	GEÇİCİ PERSONEL	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	9.819,18	4.180,82	0,00
01.3.9.00.000	5	02.1	MEMURLAR	0,00	213.300,00	0,00	70.000,00	0,00	283.300,00	274.269,45	9.030,55	0,00
01.3.9.00.000	8	02.1	MEMURLAR	15.209,37	0,00	499.627,00	0,00	0,00	514.836,37	514.387,82	448,55	0,00
01.3.9.00.000	5	02.2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	52.142,14	24.857,86	0,00
01.3.9.00.000	5	02.3	İŞÇİLER	0,00	792.000,00	0,00	20.000,00	0,00	812.000,00	803.998,34	8.001,66	0,00
01.3.9.00.000	8	02.3	İŞÇİLER	0,00	0,00	5.241.179,42	0,00	0,00	5.241.179,42	5.237.078,79	4.100,63	0,00
01.3.9.00.000	5	03.3	YOLLUKLAR	0,00	45.000,00	0,00	125.000,00	0,00	170.000,00	163.115,47	6.884,53	0,00
01.3.9.00.000	8	03.3	YOLLUKLAR	2.153,05	0,00	582.500,00	0,00	0,00	584.653,05	582.393,58	2.259,47	0,00
01.3.9.00.000	5	03.5	HİZMET ALIMLARI	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	15.000,00	11.252,30	3.747,70	0,00
01.3.9.00.000	5	03.7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.000,01	2.999,99	0,00
01.3.9.00.000	5	03.9	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0,00	72.850,00	0,00	0,00	0,00	72.850,00	33.242,36	39.607,64	0,00
01.3.9.00.000	5	05.1	GÖREV ZARARLARI	0,00	274.000,00	0,00	0,00	200.000,00	74.000,00	45.637,39	28.362,61	0,00
01.3.9.00.000	8	05.1	GÖREV ZARARLARI	740,76	0,00	11.850,00	0,00	0,00	12.590,76	12.580,92	9,84	0,00
01.3.9.00.000	5	05.3	KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	0,00	917.000,00	0,00	0,00	150.000,00	767.000,00	735.226,06	31.773,94	0,00
01.3.9.00.000	8	05.3	KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	7.313,71	0,00	0,00	0,00	0,00	7.313,71	0,00	7.313,71	0,00
01.9.9.00.000	8	01.5	DİĞER PERSONEL	14.943,26	0,00	841.416,18	0,00	0,00	856.359,44	843.865,10		12.494,34
			TOPLAM	143.125,61	6.680.000,00	34.685.173,45	670.000,00	670.000,00	41.508.299,06	41.138.364,16	357.440,56	12.494,34

BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Fonk.	Fin.	Eko.	Açıklama	Geçen Yıldan Devreden	Butce İle Verilen	Ek Ve Olağan Üstü	Aktarmayla Eklenen	Aktarmayla Düşülen	Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden
01.1.1.00.000	5	01.5	DİĞER PERSONEL	0,00	661.000,00	0,00	0,00	0,00	661.000,00	572.391,61	88.608,39	0,00
01.1.1.00.000	5	02.1	MEMURLAR	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	3.369,86	9.630,14	0,00
01.1.1.00.000	5	03.3	YOLLUKLAR	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.683,50	11.316,50	0,00
			TOPLAM	**0,00**	**689.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**689.000,00**	**579.444,97**	**109.555,03**	**0,00**

BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ
EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Fonk.	Fin.	Eko.	Açıklama	Geçen Yıldan Devreden	Butce İle Verilen	Ek Ve Olağan Üstü	Aktarmayla Eklenen	Aktarmayla Düşülen	Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden
01.3.9.00.000	5	03.4	GÖREV GİDERLERİ	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
01.3.9.00.000	5	03.5	HİZMET ALIMLARI	0,00	5.000,00	0,00	23.000,00	0,00	28.000,00	27.073,02	926,98	0,00
01.3.9.00.000	5	06.4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
			TOPLAM	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**23.000,00**	**0,00**	**73.000,00**	**27.073,02**	**45.926,98**	**0,00**

BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

Fonk.	Fin.	Eko.	Açıklama	Geçen Yıldan Devreden	Butce İle Verilen	Ek Ve Olağan Üstü	Aktarmayla Eklenen	Aktarmayla Düşülen	Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden
01.3.9.00.000	5	03.3	YOLLUKLAR	0	5.000,00	0	0	0	5.000,00	1.126,25	3.873,75	0
01.3.9.00.000	5	03.4	GÖREV GİDERLERİ	0	150.000,00	0	0	0	150.000,00	53.098,69	96.901,31	0
01.3.9.00.000	8	03.4	GÖREV GİDERLERİ	6.166,96	0	0	0	0	6.166,96	0	6.166,96	0
01.3.9.00.000	5	03.5	HİZMET ALIMLARI	0	2.500,00	0	0	0	2.500,00	0	2.500,00	0
			TOPLAM	**6.166,96**	**157.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**163.666,96**	**54.224,94**	**109.442,02**	**0,00**

BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Fonk.	Fin.	Eko.	Açıklama	Geçen Yıldan Devreden	Butce İle Verilen	Ek Ve Olağan Üstü	Aktarmayla Eklenen	Aktarmayla Düşülen	Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden
01.3.9.00.000	5	03.2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0,00	1.460.000,00	0,00	0,00	376.500,00	1.083.500,00	1.064.152,67	19.347,33	0,00
01.3.9.00.000	8	03.2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	484.349,33	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	3.184.349,33	3.119.636,90		64.712,43
01.3.9.00.000	5	03.4	GÖREV GİDERLERİ	0,00	20.000,00	0,00	1.500,00	0,00	21.500,00	21.427,85	72,15	0,00
01.3.9.00.000	5	03.5	HİZMET ALIMLARI	0,00	495.000,00	0,00	225.000,00	0,00	720.000,00	715.251,86	4.748,14	0,00
01.3.9.00.000	5	03.7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM,	0,00	935.000,00	0,00	170.000,00	0,00	1.105.000,00	1.104.882,12	117,88	0,00
01.3.9.00.000	8	03.7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM,	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	333.074,22	0,00	166.925,78
01.3.9.00.000	5	03.8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	49.469,52	5.530,48	0,00
01.3.9.00.000	5	06.1	MAMUL MAL ALIMLARI	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.3.9.00.000	8	06.1	MAMUL MAL ALIMLARI	8.951,91	0,00	0,00	0,00	0,00	8.951,91	0,00	8.951,91	0,00
			TOPLAM	**493.301,24**	**2.985.000,00**	**3.200.000,00**	**396.500,00**	**396.500,00**	**6.678.301,24**	**6.407.895,14**	**38.767,89**	**231.638,21**

BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ
İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRMEMÜD.

Fonk.	Fin.	Eko.	Açıklama	Geçen Yıldan Devreden	Butce İle Verilen	Ek Ve Olağan Üstü	Aktarmayla Eklenen	Aktarmayla Düşülen	Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden
01.3.9.00.000	5	03.8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	3.830,00	0,00	3.830,00	3.829,47	0,53	0,00
01.3.9.02.000	8	06.7	Hükümet Konakları Onarımı	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00		0,00
01.3.9.03.000	5	06.5	Maden Kaymakam Lojmanı Yapımı	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00		0,00
06.2.0.00.000	5	03.2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	826,00	34.174,00	0,00
06.2.0.00.000	5	03.4	GÖREV GİDERLERİ	0,00	10.000,00	0,00	46.000,00	0,00	56.000,00	46.135,00	9.865,00	0,00
06.2.0.00.000	5	03.5	HİZMET ALIMLARI	0,00	60.000,00	0,00	13.500,00	0,00	73.500,00	69.735,20	3.764,80	0,00
07.3.4.01.000	8	03.5	Elazig 60 Kisilik Rehabilitasyon Merkezi Insaati Yapimi	2.308,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308,60	0,00		2.308,60
07.3.4.01.000	8	06.5	Elazig 60 Kisilik Rehabilitasyon Merkezi Insaati Yapimi	444.513,74	0,00	0,00	0,00	0,00	444.513,74	0,00		444.513,74
07.3.4.04.000	8	06.7	Harput Yetiştirme Yurdu Onarımı	70.240,36	0,00	0,00	0,00	3.956,48	66.283,88	66.283,88		0,00
07.3.4.05.000	8	06.7	Hazarbaba Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Onarımı	3.850,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,71	0,00		3.850,71
08.1.0.05.000	5	06.5	İl Özel İdaresi Halı Saha Yapımı	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00		60.000,00
09.1.1.05.000	8	06.5	Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu Yapımı	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00		50.000,00
			TOPLAM	**600.913,41**	**105.000,00**	**50.000,00**	**373.330,00**	**3.956,48**	**1.125.286,93**	**516.809,55**	**47.804,33**	**560.673,05**

BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ
YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Fonk.	Fin.	Eko.	Açıklama	Geçen Yıldan Devreden	Butce İle Verilen	Ek Ve Olağan Üstü	Aktarmayla Eklenen	Aktarmayla Düşülen	Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden
04.5.1.00.000	5	03.5	HİZMET ALIMLARI	0,00	5.000,00	0,00	27.700,00	0,00	32.700,00	32.556,20	143,80	0,00
04.5.1.00.000	5	03.8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	0,00	10.000,00	0,00	60.000,00	0,00	70.000,00	40.000,00	30.000,00	0,00
04.5.1.01.000	5	06.5	Asfalt Yol Yapimi	0,00	3.015.000,00	916.429,00	0,00	2.700,00	3.928.729,00	3.926.530,79	2.198,21	0,00
04.5.1.01.000	8	06.5	Asfalt Yol Yapimi	467.081,29	0,00	2.700.501,00	0,00	0,00	3.167.582,29	3.167.579,28	3,01	0,00
04.5.1.02.000	5	06.5	Stabilize Yol Yapimi	0,00	100.000,00	0,00	0,00	60.000,00	40.000,00	22.000,00	18.000,00	0,00
04.5.1.03.000	5	06.5	Köy Yollarina Köprü ve Sanat Yapilari Yapimi	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	158.713,50	41.286,50	0,00
04.5.1.03.000	8	06.5	Köy Yollarina Köprü ve Sanat Yapilari Yapimi	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	289.062,83	0,00	60.937,17
04.5.1.07.000	8	06.5	Merkez Yemişlik - Tadım - Ürünveren Grup Köy Yolu Yapımı	280.885,00	0,00	350.885,00	0,00	0,00	631.770,00	630.000,00	1.770,00	0,00
04.5.1.08.000	5	06.5	Borçlanma ile 8 Adet Asfalt Yapımı	0,00	3.419.000,00	0,00	0,00	0,00	3.419.000,00	1.974.335,92	0,00	1.444.664,08
04.5.1.09.000	5	06.5	Borçlanma ile 16 Adet Köprü ve Sanat Yapıları Yapımı	0,00	1.651.000,00	0,00	0,00	0,00	1.651.000,00	1.051.568,14	0,00	599.431,86
			TOPLAM	**747.966,29**	**8.400.000,00**	**4.317.815,00**	**87.700,00**	**62.700,00**	**13.490.781,29**	**11.292.346,66**	**93.401,52**	**2.105.033,11**

BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ
PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

Fonk.	Fin.	Eko.	Açıklama	Geçen Yıldan Devreden	Butce İle Verilen	Ek Ve Olağan Üstü	Aktarmayla Eklenen	Aktarmayla Düşülen	Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden
01.3.9.00.000	5	03.2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	21.682,74	58.317,26	0,00
01.3.9.00.000	5	03.5	HİZMET ALIMLARI	0,00	20.000,00	0,00	41.000,00	0,00	61.000,00	58.527,05	2.472,95	0,00
01.3.9.00.000	8	03.5	HİZMET ALIMLARI	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00		150.000,00
01.3.9.00.000	5	03.7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	32.000,00	30.000,00	0,00	0,00	16.000,00	46.000,00	37.919,87	8.080,13	0,00
			TOPLAM	**32.000,00**	**50.000,00**	**150.000,00**	**121.000,00**	**16.000,00**	**337.000,00**	**118.129,66**	**68.870,34**	**150.000,00**

BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ
SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Fonk.	Fin.	Eko.	Açıklama	Geçen Yıldan Devreden	Butce İle Verilen	Ek Ve Olağan Üstü	Aktarmayla Eklenen	Aktarmayla Düşülen	Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden
01.3.9.00.000	5	03.5	HİZMET ALIMLARI	0,00	25.000,00	0,00	30.000,00	0,00	55.000,00	36.018,18	18.981,82	0,00
01.3.9.00.000	5	04.2	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	40.037,66	84.962,34	0,00
04.2.1.01.000	5	06.5	Sulama Amaçli Havuz ve Kanalet Yapimi	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.199.366,32	633,68	0,00
04.2.1.01.000	8	06.5	Sulama Amaçli Havuz ve Kanalet Yapimi	2.686,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.686,50	0,00	2.686,50	0,00
04.2.1.12.000	5	06.5	13 Adet Sulama Suyu Yapım Projesi	209.414,41	0,00	0,00	0,00	0,00	209.414,41	186.964,52	0,00	22.449,89
04.2.1.13.000	5	06.5	Borçlanma ile 13 Adet Sulama İnşaatı yapımı	0,00	2.555.000,00	0,00	0,00	0,00	2.555.000,00	1.952.774,09	0,00	602.225,91
05.2.0.01.000	5	06.5	Köylere Kanalizasyon Yapimi	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
05.2.0.02.000	8	06.5	Sivrice Atıksu Arıtma Kanalizasyon Hatları ve Terfi Merkezi Yapımı	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
06.3.0.01.000	5	06.5	Köylere İçme Suyu Temini	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	594.924,74	55.075,26	0,00
06.3.0.01.000	8	06.5	Köylere İçme Suyu Temini	631,29	0,00	0,00	0,00	0,00	631,29	0,00	631,29	0,00
06.3.0.02.000	8	06.5	T.S.K.İçme ve Kullanma Suyu Projesi	14.454,08	0,00	0,00	0,00	0,00	14.454,08	0,00	0,00	14.454,08
06.3.0.14.000	5	06.5	Borçlanma ile 6 Adet İçme Suyu İnşaatı Yapımı	0,00	875.000,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00	498.814,19	0,00	376.185,81
			TOPLAM	**227.186,28**	**5.630.000,00**	**1.250.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**7.137.186,28**	**4.708.899,70**	**162.970,89**	**2.265.315,69**

BİRLİKLERE YARDIM HARCAMA KALEMİNDEN MERKEZ VE 10 İLÇE KAYMAKAMLIĞI KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİKLERİNE AKTARILAN ÖDENEKLER		
S. No	**İlçe Adı**	**Aktarılan Ödenek**
1.	Merkez	235.000,00
2.	Ağın	45.000,00
3.	Alacakaya	108.000,00
4.	Arıcak	66.000,00
5.	Baskil	236.000,00
6.	Karakoçan	57.000,00
7.	Keban	66.000,00
8.	Kovancılar	53.000,00
9.	Maden	68.000,00
10.	Palu	77.000,00
11.	Sivrice	72.000,00
TOPLAM AKTARILAN ÖDENEK		**1.083.000,00 TL**

MERKEZ İLÇE				
S. No	**Karar Tarihi**	**Karar No**	**Ne İçin Verildiği**	**Tutarı**
1.	05.01.2010	4	Merkez İlçeye bağlı köylerin muhtelif ihtiyaçları için	100.000,00 TL
2.	05.01.2010	4	Birliğin genel ihtiyaçları için	100.000,00 TL
3.	27.04.2010	75	Birliğin genel ihtiyaçları için	10.000,00 TL
4.	24.08.2010	159	Birliğin genel ihtiyaçları ve Köye Yönelik Hizmetler için	25.000,00 TL
			TOPLAM	**235.000,00 TL**

AĞIN İLÇESİ				
S. No	**Karar Tarihi**	**Karar No**	**Ne İçin Verildiği**	**Tutarı**
1	16.02.2010	36	Köye Yönelik Hizmetler için	30.000,00 TL
2	24.08.2010	159	Birliğin genel ihtiyaçları ve Köye Yönelik Hizmetler için	15.000,00 TL
			TOPLAM	**45.000,00 TL**

ALACAKAYA İLÇESİ				
S. No	**Karar Tarihi**	**Karar No**	**Ne İçin Verildiği**	**Tutarı**
1	19.01.2010	10	Birliğin iş ve işlemleri için	3.000,00 TL
2	16.02.2010	36	Köye Yönelik Hizmetler için	25.000,00 TL
3	30.03.2010	63	Bakımevinde çalıştırılacak aşçı giderleri	10.000,00 TL
4	17.08.2010	150	Köylere Yönelik hizmetler	55.000,00 TL
5	24.08.2010	159	Birliğin genel ihtiyaçları ve Köye Yönelik Hizmetler için	15.000,00 TL
			TOPLAM	**108.000,00 TL**

ARICAK İLÇESİ				
S. No	**Karar Tarihi**	**Karar No**	**Ne İçin Verildiği**	**Tutarı**
1	05.01.2010	1	Bakımevinde çalıştırılacak aşçı giderleri	10.000,00 TL
2	16.02.2010	36	Köye Yönelik Hizmetler için	18.000,00 TL
3	17.08.2010	149	Bakımevinde çalıştırılacak aşçı giderleri	8.000,00 TL
4	24.08.2010	159	Birliğin genel ihtiyaçları ve Köye Yönelik Hizmetler için	30.000,00 TL
			TOPLAM	**66.000,00 TL**

BASKİL İLÇESİNE AKTARILAN ÖDENEKLER				
S. No	**Karar Tarihi**	**Karar No**	**Ne İçin Verildiği**	**Tutarı**
1	05.01.2010	1	Bakımevinde çalıştırılacak aşçı giderleri	10.000,00 TL
2	16.02.2010	36	Köye Yönelik Hizmetler için	13.000,00 TL
3	17.08.2010	149	Bakımevinde çalıştırılacak aşçı giderleri	8.000,00 TL
4	24.08.2010	159	Birliğin genel ihtiyaçları ve Köye Yönelik Hizmetler için	20.000,00 TL
5	07.09.2010	165	Birliğin genel ihtiyaçları ve Köye Yönelik Hizmetler için	185.000,00 TL
			TOPLAM	**236.000,00 TL**

KARAKOÇAN İLÇESİ				
S. No	**Karar Tarihi**	**Karar No**	**Ne İçin Verildiği**	**Tutarı**
1	05.01.2010	1	Bakımevinde çalıştırılacak aşçı giderleri	10.000,00 TL
2	16.02.2010	36	Köye Yönelik Hizmetler için	24.000,00 TL
3	17.08.2010	149	Bakımevinde çalıştırılacak aşçı giderleri	8.000,00 TL
4	24.08.2010	159	Birliğin genel ihtiyaçları ve Köye Yönelik Hizmetler için	15.000,00 TL
			TOPLAM	**57.000,00 TL**

KEBAN İLÇESİ				
S. No	**Karar Tarihi**	**Karar No**	**Ne İçin Verildiği**	**Tutarı**
1	05.01.2010	1	Bakımevinde çalıştırılacak aşçı giderleri	10.000,00 TL
2	16.02.2010	36	Köye Yönelik Hizmetler için	23.000,00 TL
3	30.03.2010	63	Bakımevinde çalıştırılacak aşçı giderleri	10.000,00 TL
4	17.08.2010	149	Bakımevinde çalıştırılacak aşçı giderleri	8.000,00 TL
5	24.08.2010	159	Birliğin genel ihtiyaçları ve Köye Yönelik Hizmetler için	15.000,00 TL
			TOPLAM	**66.000,00 TL**

KOVANCILAR İLÇESİ				
S. No	**Karar Tarihi**	**Karar No**	**Ne İçin Verildiği**	**Tutarı**
1	16.02.2010	36	Köye Yönelik Hizmetler için	20.000,00 TL
2	24.08.2010	159	Birliğin genel ihtiyaçları ve Köye Yönelik Hizmetler için	30.000,00 TL
3	12.10.2010	186	Aşçı Giderleri	3.000,00 TL
			TOPLAM	**53.000,00 TL**

MADEN İLÇESİ				
S. No	**Karar Tarihi**	**Karar No**	**Ne İçin Verildiği**	**Tutarı**
1	05.01.2010	1	Bakımevinde çalıştırılacak aşçı giderleri	10.000,00 TL
2	16.02.2010	36	Köye Yönelik Hizmetler için	35.000,00 TL
3	17.08.2010	149	Bakımevinde çalıştırılacak aşçı giderleri	8.000,00 TL
4	24.08.2010	159	Birliğin genel ihtiyaçları ve Köye Yönelik Hizmetler için	15.000,00 TL
			TOPLAM	**68.000,00 TL**

PALU İLÇESİ				
S. No	**Karar Tarihi**	**Karar No**	**Ne İçin Verildiği**	**Tutarı**
1	16.02.2010	36	Köye Yönelik Hizmetler için	17.000,00 TL
2	24.08.2010	159	Birliğin genel ihtiyaçları ve Köye Yönelik Hizmetler için	30.000,00 TL
3	28.09.2010	180	Palu İlçesine bağlı köy ve ünitelerin altyapı hizmetleri	30.000,00 TL
			TOPLAM	**77.000,00 TL**

SİVRİCE İLÇESİ				
S. No	**Karar Tarihi**	**Karar No**	**Ne İçin Verildiği**	**Tutarı**
1	16.02.2010	36	Köye Yönelik Hizmetler için	40.000,00 TL
2	23.03.2010	60	Birliğin Genel ihtiyaçları için	7.000,00 TL
3	30.03.2010	63	Bakımevinde çalıştırılacak aşçı giderleri	10.000,00 TL
4	24.08.2010	159	Birliğin genel ihtiyaçları ve Köye Yönelik Hizmetler için	15.000,00 TL
			TOPLAM	**72.000,00 TL**











FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ ve DEĞERLENDİRMELER

İLÇESİ	İÇME SULARI	KÖY YOLLARI	TOPLAM
MERKEZ	445.000,00	1.723.000,00	2.168.000,00
AĞIN	0,00	185.000,00	185.000,00
ALACAKAYA	237.000,00	99.000,00	336.000,00
ARICAK	0,00	257.000,00	257.000,00
BASKİL	0,00	662.000,00	662.000,00
KARAKOÇAN	133.000,00	748.000,00	881.000,00
KEBAN	300.000,00	137.000,00	437.000,00
KOVANCILAR	270.000,00	303.000,00	573.000,00
MADEN	335.000,00	333.000,00	668.000,00
PALU	357.000,00	379.000,00	736.000,00
SİVRİCE	128.000,00	407.000,00	535.000,00
Ortak Alım	6.436.501,00	0,00	6.436.501,00
TOPLAM	8.641.501,00	5.233.000,00	13.874.501,00

Asfalt Bitüm Alımı	1.500.221,00
Akaryakıt Alımı	350.000,00
PVC Boru Alımı	150.000,00
Trafik Levhaları	36.000,00
TOPLAM	2.036.221,00

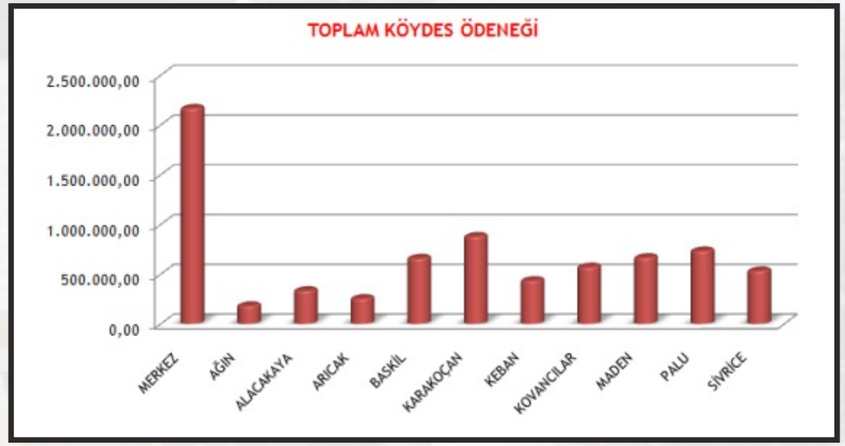

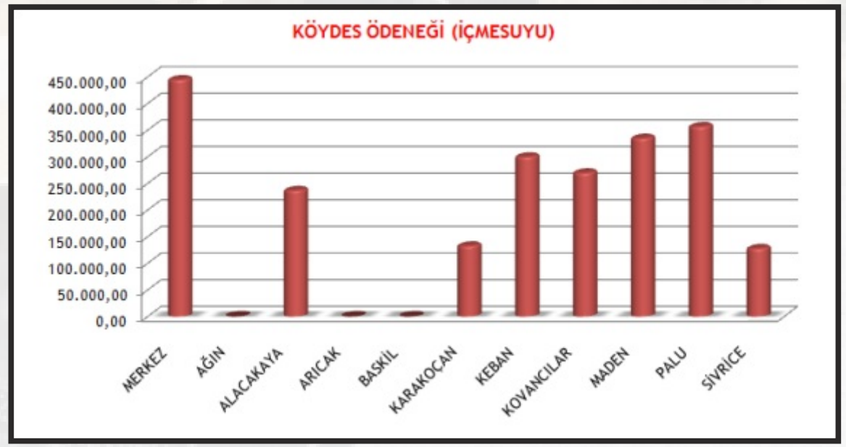

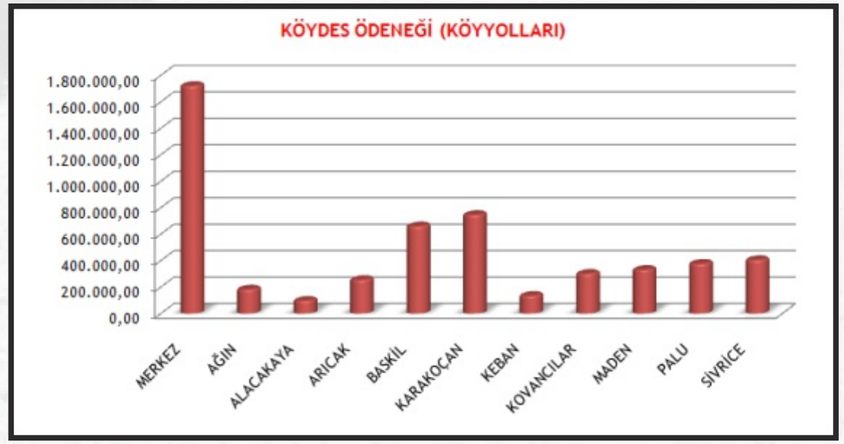

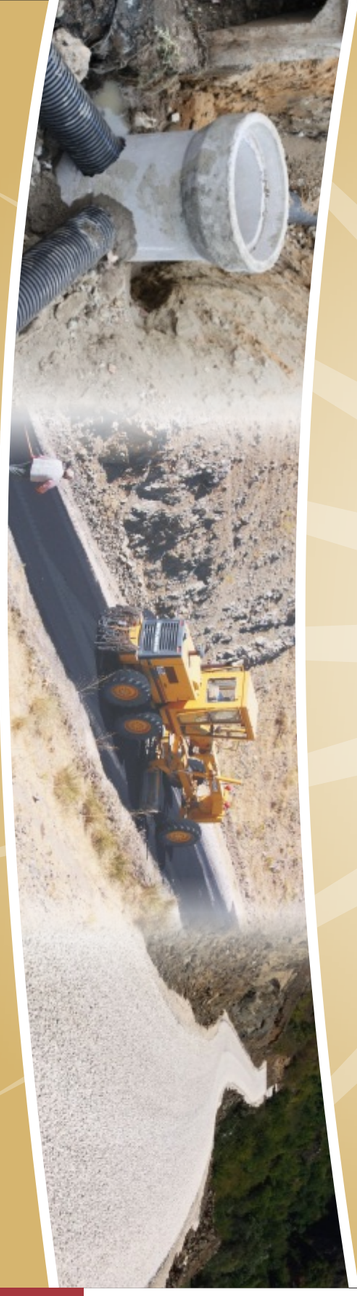

Elazığ'ı Geleceğe Taşıyoruz

İL ÖZEL İDARESİ
"HARPUT SÜT KALESİ"
ELAZIĞ

SAĞLANAN FİNANSMANIN HİZMET TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI						
FİNANSMAN TÜRÜ	SU ve KANAL HİZMETLERİ	YOL ve ULAŞIM HİZMETLERİ	DESTEK HİZMETLERİ	MALZEME ALIMLARI	GENEL PROJELER	TOPLAM
Köydes	2.179.000,00	1.200.280,00	2.700.000,00	500.000,00		6.579.280,00
Özel İdare	2.200.000,00	3.330.000,00	2.985.000,00			8.515.000,00
İller Bankası (Borçlanma)					6.375.000,00	6.375.000,00
İller Bankası (Kar Payı)					1.776.000,00	1.776.000,00
Toplam	**4.379.000,00**	**4.530.280,00**	**5.685.000,00**	**500.000,00**	**8.151.000,00**	**23.245.280,00**

2010 YILI YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ							
HİZMET TÜRÜ		PRG.	EK PRG.	TOPLAM PRG	UYG.	ÖDENEK	HARCAMA
TESVİYE (KM)		32,8	6,5	39,3	37,1		
STABİLİZE (KM)		287,3	38,2	325,5	325,5	405.263 TL	405.263 TL
ASFALT (KM)	Yeni	106	34,3	140,3	113,2	7.795.180 TL	7.795.180 TL
	2. Kat	102	9,5	111,9	93,9	1.810.394 TL	1.810.394 TL
ASFALT BİTÜM ALIMI						3.301.231 TL	3.301.231 TL
ONARIM (KM)		104,8	38,5	143,3	136,8		
KÖPRÜ YAPIMI		2	0		2		
BÜZ DÖŞEME (300 - 600) Metre		4.100	0	4100	4100	81.862 TL	81.862 TL
SANAT YAPILARI		24	0	24	24		
SPİRAL BORU DÖŞEME (Metre)		538	0	538	538	207.200 TL	207.200 TL
Toplam						13.601.130 TL	13.601.130 TL



HİZMET TÜRÜ	2008	2009	2010
Tesviye	21,30 Km	19,40 Km	37,10 Km
Onarım	73,30 Km	108,60 Km	136,80 Km
Stabilize	184,70 Km	313,80 Km	325,50 Km
1. Kat Asfalt	20,30 Km	20,30 Km	113,20 Km
2. Kat Asfalt	7 Km	141 Km	93,90 Km
Asfalt Bakım-Onarım	198,30 Km	202,50 Km	255,2

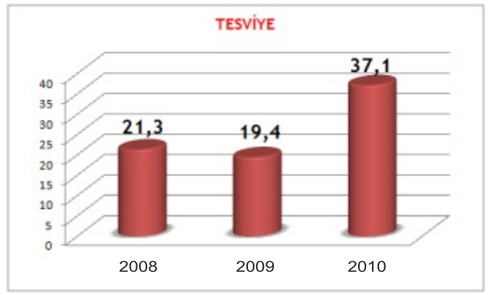

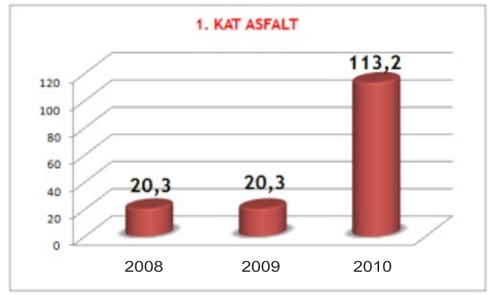

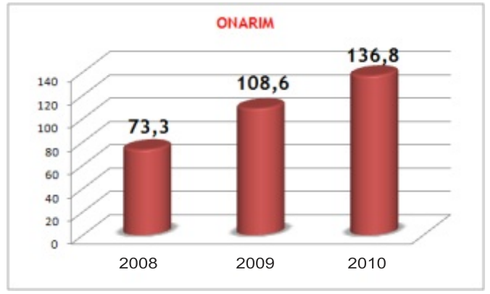

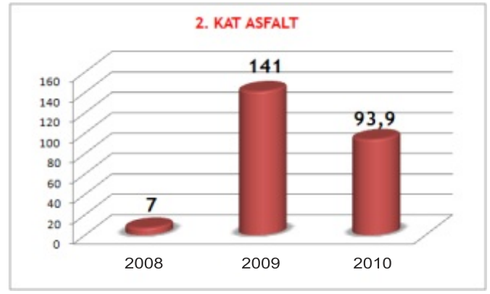

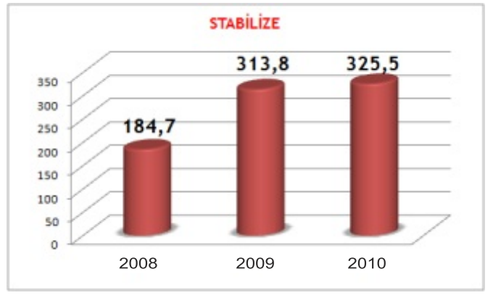

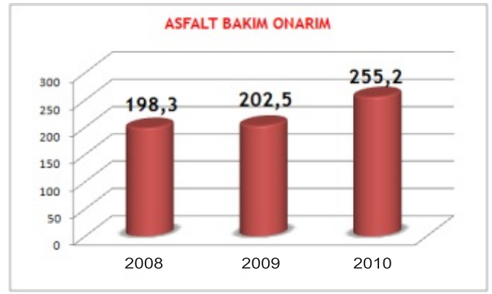

2010 YILI SU KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ÖZEL İDARE FAALİYETLERİ

HİZMET TÜRÜ		PROGRAM	TOPLAM PRG	UYGULAMA	ÖDENEK	HARCAMA
İÇMESUYU	İKMAL ONARIM	130	130	130	P.E.	P.E.
KANALİZASYON	YAPIM (KÖY KALKINMA)	8	8		1.280.000,00	1.280.000,00
	TESİS GELİŞTİRME				200.000,00	200.000,00
	LİMİT	12	12	12	P.E.	P.E.
SULAMA	KREDİLİ				2.555.000,00	2.174.638,44
	AT ve TİGH	1	1	1	600.000,00	138.815,00
	LİMİT (BAKIM ONARIM)	25	25	25	P.E.	P.E.
	KÖY KALKINMA PAYI	3	3	0	486.420,00	0,00
	MALZEME ALIMI				1.200.000,00	1.200.000,00
ASKERİ GARNİZON	YAPIM	3	3	2	104.000,00	63.000,00
	LİMİT (İKMAL)	4	4	4	P.E.	P.E.
İÇMESUYU SONDAJ	YENİ	23	23	7	P.E.	P.E.
	MALZEME ALIMI				650.000,00	248.924,34

2010 YILI SU KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
KÖYDES FAALİYETLERİ

HİZMET TÜRÜ		PROGRAM	TOPLAM PRG	UYGULAMA	ÖDENEK	HARCAMA
YENİ YAPIM		19	19	13	4.183.000,00	2.756.792,68
BAKIM ONARIM		71	71	55		
SULAMA	YAPIM	17	17	8	1.050.000,00	724.879,00
SONDAJ	YENİ	13	13	12	P.E.	P.E.

SU VE KANAL HİZMETLERİ 2008 - 2009 - 2010 YILI UYGULAMALARI

HİZMETİN TÜRÜ		BİRİMİ	2008	2009	2010
YENİ TESİS		Ad.	16	16	13
TESİS GELİŞTİRME	KÖYDES	Ad.	73	45	55
	ÖZEL İDARE	Ad.	0	4	134
	TOPLAM	*Ad.*	*73*	*49*	*189*
SONDAJ	KÖYDES	Ad.	13	8	12
	ÖZEL İDARE	Ad.	12	13	7
	TOPLAM	*Ad.*	*25*	*21*	*19*

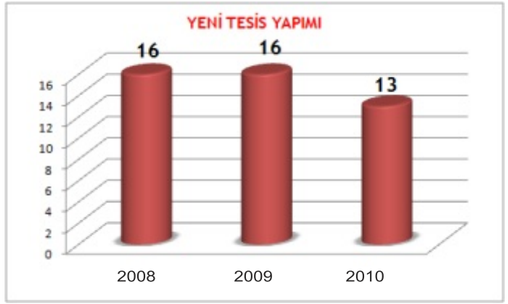

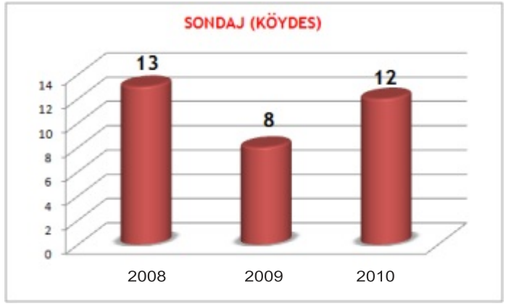

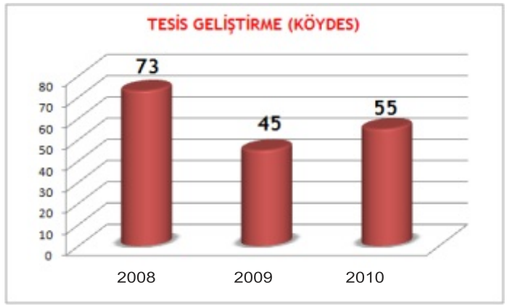

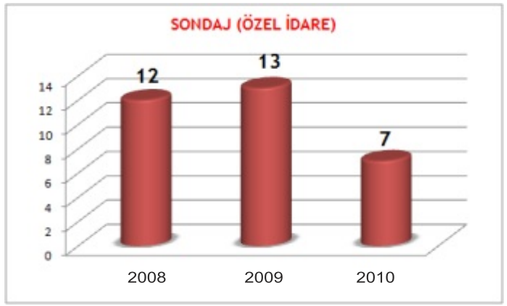

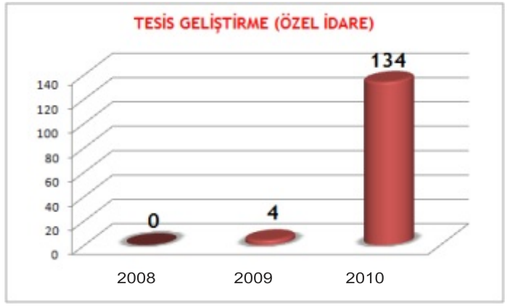

2009 YILI KANALİZASYON TESİSİ YAPIM PROGRAMI					
HİZMET TÜRÜ		BİRİMİ	2008	2009	2010
KANALİZASYON ALTYAPI UYGULAMASI	BAYINDIRLIK BAKANLIĞI	Adet	0	4	8
	ÖZEL İDARE	Adet	0	3	12
	TOPLAM	Adet	0	7	20





SULAMA SUYU TESİSLERİ YAPIM PROGRAMI					
	FİNANS TÜRÜ	BİRİMİ	2008	2009	2010
SULAMA SUYU TESİSLERİ	ÖZEL İDARE	Ad	0	1	1
	BAYINDIRLIK BAKANLIĞI	Ad	0	11	0
	İLLER BANKASI KREDİSİ	Ad	11	9	8
	TOPLAM	*Ad*	*11*	*21*	*9*







HİZMETİN TÜRÜ	BİRİMİ	2008	2009	2010
İÇMESUYU BORUSU DAĞITIMI	METRE	90.458	97.500	97.447
TOPLAM	**METRE**	**90.458**	**97.500**	**97.447**

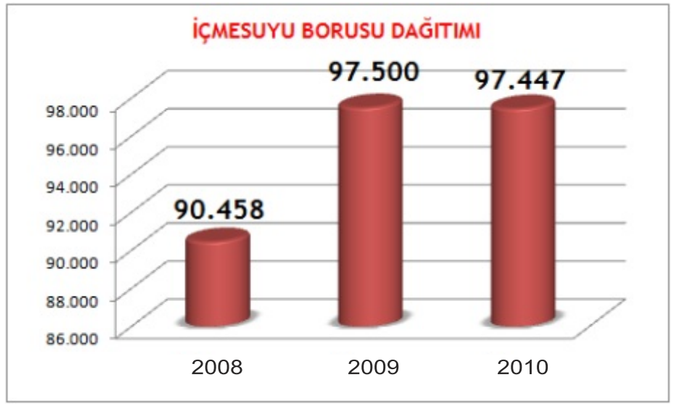

HİZMETİN TÜRÜ	BİRİMİ	2008	2009	2010
SULAMA SUYU BORUSU	METRE	35.156	58.594	64.412
TOPLAM	**METRE**	**35.156**	**58.594**	**64.412**

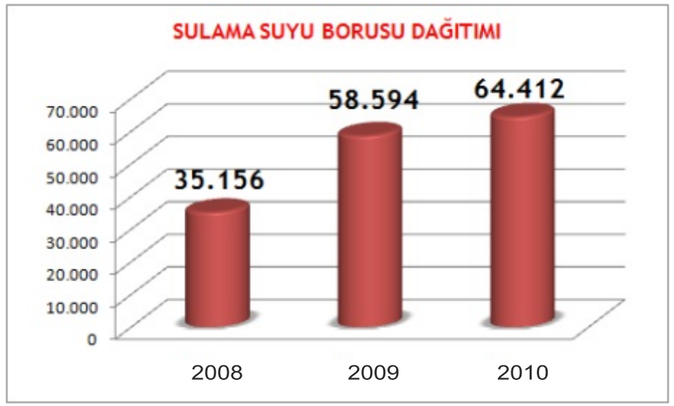

İL ÖZEL İDARESİ 2010 YILI BÜTÇESİNDEN KÖY TÜZEL KİŞİLİKLERİNE YAPILAN YARDIMLAR				
S.No	İlçesi	Köyü	Yardım Konusu	Miktarı
1.	Ağın	Kaşpınar	Cami onarımı	3.000,00
2.	Ağın	Pul	Mezarlık etrafının çevrilmesi	3.000,00
3.	Alacakaya	Çataklı	Köykonağı çevre düzenlemesi ve onarımı	5.000,00
4.	Alacakaya	Sularbaşı	Köykonağı yapımı	3.000,00
5.	Arıcak	Bozçavuş	Köy Camisi onarımı	4.000,00
6.	Arıcak	Kambertepe	Cami onarımı	3.000,00
7.	Arıcak	Kayahisar	Köy Camisinin WC ve bdesthanelerin onarımı	4.000,00
8.	Arıcak	Ormanpınarı	Mezarlık etrafının duvar ve tel ile çevrilmesi	4.000,00
9.	Baskil	Harabakayış	Köy Camisi lojmanının bakım ve onarımı	3.000,00
10.	Baskil	Höyük	İçmesuyu dinamo alımı ve pano onarımı	2.000,00
11.	Baskil	Işıklar	İçmesuyu pompa onarımı	3.000,00
12.	Baskil	Karagedik	Cami Onarımı	4.000,00
13.	Baskil	Koçyolu	Cami yapımı	3.000,00
14.	Baskil	Topaluşağı	Köy camisine lavabo ve abdest alma yeri yapımı	4.000,00
15.	Karakoçan	Bazlama	Köy odası yapımı	3.000,00
16.	Karakoçan	Bulguruk	Köy Camisinin inşaatında	5.000,00
17.	Karakoçan	Gündeğdi	Köy çeşmelerinin onarımı	3.000,00
18.	Karakoçan	Kulundere	Cami onarımı	3.000,00
19.	Keban	Akgömlek	Cami yapımı	3.000,00
20.	Keban	Altınkürek	Cami ve imam evi onarımı	4.000,00
21.	Keban	Aşağıçakmak	Köyodası yapımı	3.000,00
22.	Keban	Beydeğirmeni	Köyevi yapımı ve çeşme boru değişimi	3.000,00
23.	Keban	Koyunuşağı	Köy camisine ek kapalı alan yapılması	3.000,00
24.	Keban	Sağdıçlar	Cami bakım ve onarımı	3.000,00
25.	Keban	Topkıran	Cami cenaze yıkama,abdestalma yeri ve WC yapımı	3.000,00
26.	Keban	Üçpınar	Abdestalma yeri, Wc,Cenaze yıkama yeri ve depo yap.	3.000,00
27.	Kovancılar	Bayramyazı	Taziyeevi yapımı	2.500,00
28.	Kovancılar	Beşpınar	Köy Konağı Yapımı	2.500,00
29.	Kovancılar	Çatakbaşı	Köy Konağı Yapımı	2.500,00
30.	Kovancılar	Fahribey Mez.Köyü	Köy Konağı Yapımı	2.500,00
31.	Kovancılar	Gülçatı	Köy Konağı Yapımı	2.500,00
32.	Kovancılar	Karasungur	Köy Konağı Yapımı	2.500,00
33.	Kovancılar	Kuşcu	Köy Konağı Yapımı	2.500,00

İL ÖZEL İDARESİ 2010 YILI BÜTÇESİNDEN KÖY TÜZEL KİŞİLİKLERİNE YAPILAN YARDIMLAR				
S.No	İlçesi	Köyü	Yardım Konusu	Miktarı
34.	Kovancılar	Taşören	Köy Konağı Yapımı	2.500,00
35.	Maden	Cumhuriyetçi	Cami yapımı	5.000,00
36.	Merkez	Arındık	Cami onarımı ve çevre düzenlemesi	3.000,00
37.	Merkez	Bağlarca	Cami onarımı	4.000,00
38.	Merkez	Balpınarı	Cami lojmanı tadilat ve bakımı	3.000,00
39.	Merkez	Cip	Cami onarımı	5.000,00
40.	Merkez	Çağlar	Cami lojmanı yapımı	3.000,00
41.	Merkez	Dedepınar	İçmesuyu trafo onarımı	2.000,00
42.	Merkez	Gedikyolu	Cami onarımı	4.000,00
43.	Merkez	Gözebaşı	Köyodası bakım ve onarımı	3.000,00
44.	Merkez	Hal	Cami onarımı ve camiye ek bölüm yapılması	2.000,00
45.	Merkez	Hoş	Cami ve Kuran kursu yapımı	4.000,00
46.	Merkez	Koçharman	Mezarlığın etrafının çevrilmesi ve su görürülmesi	4.000,00
47.	Merkez	Koruk	Morg yapımı	4.000,00
48.	Merkez	Körpe	Köy konağı yapımı	3.000,00
49.	Merkez	Kuşhane	Taziyeevi,cami lojmanı onarımı, çeşme yapımı	4.000,00
50.	Merkez	Muratcık	Cami yapımı	4.000,00
51.	Merkez	Sakabaşı	Camilere gasilhane ve abdest alma yeri yapımı	4.000,00
52.	Merkez	Sarıkamış	Taziye evi yapımı	4.000,00
53.	Merkez	Sarıyakup	Cami bakım ve onarımı	3.000,00
54.	Merkez	Şahaplı	Köyodası yapımı ve içmesuyu trafosu tamiri	3.000,00
55.	Merkez	Tepeköy	Cami yapımı	3.000,00
56.	Palu	Andılar	Mezarlık yanına Mescit ve köy içine 2 adet çeşme yap.	4.000,00
57.	Palu	Arındık	Cami yapımı	3.000,00
58.	Palu	Gömeçbağları	Cami ve taziye evi onarımı	3.000,00
59.	Palu	Güllüce	Cami ve Taziye evi onarımı	3.000,00
60.	Palu	Hasbey	Cami onarımı	4.000,00
61.	Palu	Keklikdere	Köy konağı, Cami,okul onarımı ve çevre düzenlemesi	3.000,00
62.	Palu	Köklüce	Taziye evi yapımı	3.000,00
63.	Palu	Örencik	Cami yapımı	3.000,00
64.	Palu	Tarhana	Taziye evi yapımı	3.000,00
65.	Palu	Üçdeğirmenler	Minare yapımı	3.000,00
66.	Palu	Yeşilbayır	Köy Camilerinin onarımının yapılması	3.000,00
			TOPLAM	**216.000,00**

İl Genel Meclisi, İl Encümeni Kararları
ve Tüm İhale İlanları İçin



www.elazigozelidaresi.gov.tr



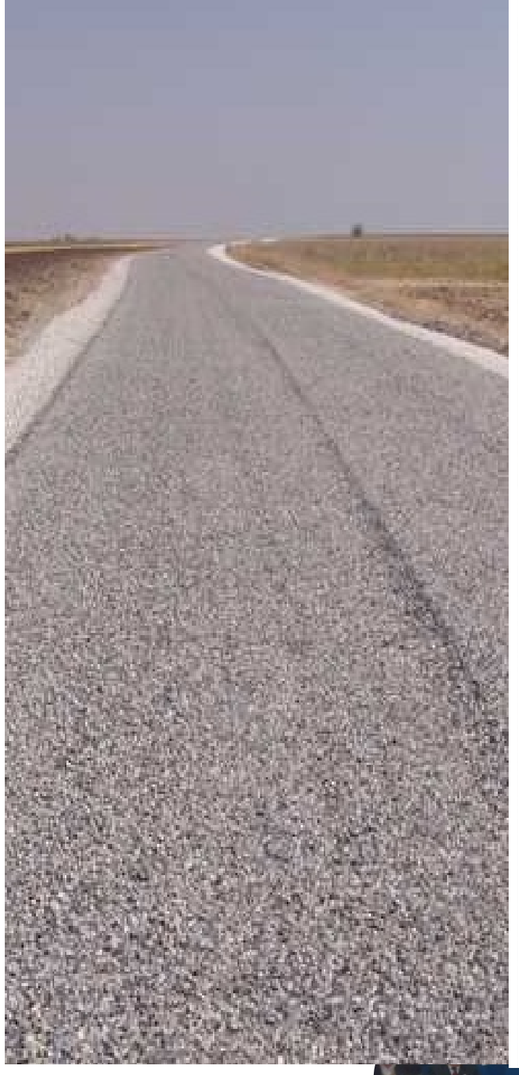

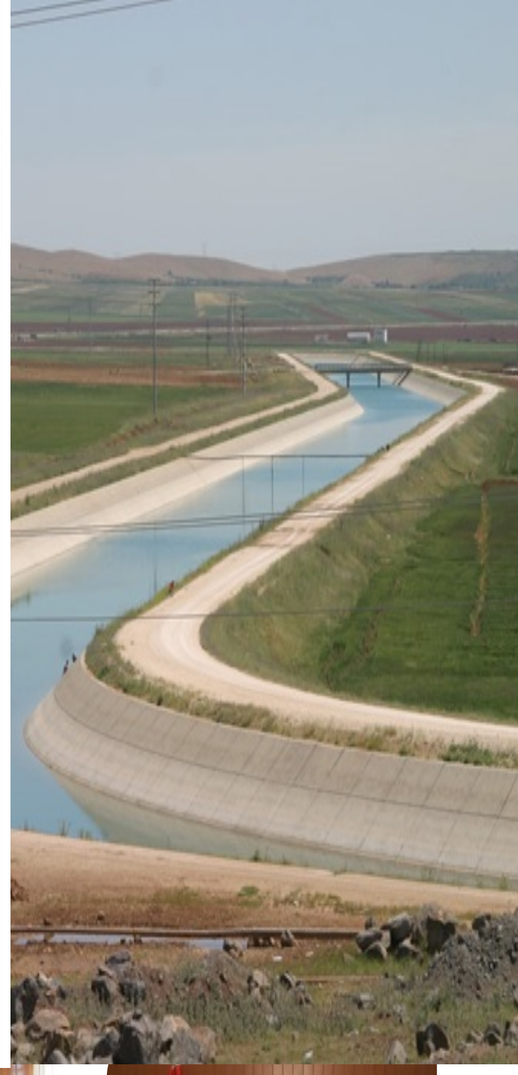




KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİKLERİ FAALİYETLERİ

İli Elazığ
İlçesi Merkez
Yatırımcı Elazığ İli Kalkındırma Ve Köylere Hizmet Götürme Birliği

Sıra No	Yeri	Sektörü	Yatırımın Adı	Bütçe Türü	Harcama Tutarı	Gerçekleşme	Düşünceler
1.	Elazığ Merkez	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	grup yolu stabilize ve düz yapım işi	İl Özel İdaresi	73.039,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
2.	Elazığ Merkez	Labaratuvar	Laboratuvar analiz malzemesi alımı	KHGB	4.248,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
3.	Kavaktepe köyü	Köy Yardımı	wc yapım işi	KHGB	3.000,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
4.	Beşoluk köyü	Köy Yardımı	cami onarımı	KHGB	2.500,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
5.	Karataş köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	sulama suyu kanal ve boruların tamiri ve onarım işi	KHGB	2.500,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
6.	Koçkale köyü	Köy Yardımı	mezarlık etrafının çevrelmesi ve köy konağı	KHGB	2.500,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
7.	Gümüşbağlar köyü	Köy Yardımı	çeşme tamiri imam evi taziye evi yapım işi	KHGB	2.500,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
8.	Pelte köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	içme suyu motopomp alımı	KHGB	2.500,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
9.	Bağdere köyü	Köy Yardımı	mezarlık etrafı çevrelmesi işi	KHGB	2.500,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
10.	Gülmahmut köyü	Köy Yardımı	köy konağı yapım işi	KHGB	2.500,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
11.	Yolaçtı köyü	Köy Yardımı	mezarlık etrafının çevrilmesi işi	KHGB	2.500,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
12.	kuşhane köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	içme suyu tesisi yapım işi	İl Özel İdaresi	6.541,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
13.	tadım grup	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	grup köy yolu stabilize büz yapım işi	İl Özel İdaresi	3.540,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
14.	Gölardı köyü	Köy Yardımı	köy odası bakım ve onarım giderleri	KHGB	2.500,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
15.	Kozluk köyü	Köy Yardımı	mezarlık evi yapım işi	KHGB	2.500,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
16.	Sarılı köyü	Köy Yardımı	köy konağı etrafının çevrilmesi ve malzeme alımı işi	KHGB	2.500,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
17.	Yenikapı köyü	Köy Yardımı	cami ve okul onarımı	KHGB	2.500,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
18.	Örençay köyü	Köy Yardımı	cami onarımı ve mezarlık etrafının çevrilmesi işi	KHGB	2.500,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
19.	Gözpınarı köyü	Köy Yardımı	cami onarımında	KHGB	2.500,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
20.	Dede pınarı köyü	Köy Yardımı	cami lojmanı onarımı	KHGB	2.500,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
21.	Nuralı köyü	Köy Yardımı	çeşme onarım işi	KHGB	2.500,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
22.	Pirinçci köyü	Köy Yardımı	köy konağı onarımı ve köy yolu isnat duvarı yapım işi	KHGB	2.500,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
23.	Yolüstü köyü	Köy Yardımı	mezarlık etrafının çevrilmesi ve sulama kanalı onarımı	KHGB	2.500,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
24.	Elma pınarı Köyü	Köy Yardımı	Köy Konağı yapım ve onarım işi	KHGB	2.500,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
25.	Oymaağaç köyü	Köy Yardımı	orcik ve pestil kurutma yeri yapım işi	KHGB	2.500,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
26.	Sarı yakup köyü	Köy Yardımı	köyü cami lojmanı yapım işi	KHGB	3.000,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
27.	Arındık köyü	Köy Yardımı	köy konağı bakım ve onarım işi	KHGB	2.500,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
28.	Elazığ Merkez	Labaratuvar	Çevre ve orman bakanlığı akredite bedeli	KHGB	10.000,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
29.	Elazığ Merkez	Labaratuvar	TAK çevre ölçüm ve analiz laboratuvarı %1 katkı payı	KHGB	2.597,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
30.	Acıpayam köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	kangal boru ve havuz yapım işi	KHGB	2.500,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
31.	Kumla köyü	Köy Yardımı	mezarlık etrafı çevrilmesi işi	KHGB	2.500,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
32.	Dereboğazı köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	sulama havuzu yapım işi	KHGB	2.500,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
33.	Koçharmanı köyü	Köy Yardımı	cami yapım işi	KHGB	2.500,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
34.	Tepeköy köyü	Köy Yardımı	mezarlık etrafının çevrilmesi	KHGB	2.500,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
35.	Aydınlar köyü	Köy Yardımı	cami ve imamevi çatısı onarım işi	KHGB	2.500,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
36.	Esenkent köyü	Köy Yardımı	mezarlık etrafının çevrilmesi ve mez. Evi yap işi	KHGB	2.500,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
37.	Çallıca köyü	Köy Yardımı	yeni cami mezrası taziye evi yapım işi	KHGB	2.500,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
38.	Kuyulu köyü	Köy Yardımı	mezarlık etrafı çevrilmesi işi	KHGB	2.500,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
39.	Yünlüce köyü	Köy Yardımı	umimi wc yapım işi	KHGB	2.500,00	100%	Proje Tamamlanmıştır

İli Elazığ
İlçesi Merkez
Yatırımcı Elazığ İli Kalkındırma Ve Köylere Hizmet Götürme Birliği

Sıra No	Yeri	Sektörü	Yatırımın Adı	Bütçe Türü	Harcama Tutarı	Gerçekleşme	Düşünceler
40.	Uzuntarla köyü	Köy Yardımı	mezarlık etrafının çevrilmesi işi	KHGB	2.500,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
41.	Kıraç köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	içme suyu motopomp alımı	KHGB	2.500,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
42.	Elazığ Merkez	Spor Hizmetleri	kapalı spor salonu trafo köşkü ve elektrik onarım işi	İl Özel İdaresi	25.818,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
43.	Yünlüce köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	sulama suyu tesisi yapım işi	İl Özel İdaresi	38.232,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
44.	Bölüklü köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	sulama suyu tesisi yapım işi	İller Bankası	45.902,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
45.	Öksüz uşağı köyü	Köy Yardımı	abdest alma yeri ve cami onarım işi	KHGB	2.500,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
46.	Balpınar köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	içme suyu motopomp alımı	KHGB	2.500,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
47.	Körpe köyü	Köy Yardımı	çeşme tamiri ve istinat duvarı yapım işi	KHGB	2.500,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
48.	Korucu köyü	Köy Yardımı	mezarlık etrafının çevrilmesi ve abdest alma yeri	KHGB	2.500,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
49.	Küllük köyü	Köy Yardımı	cami onarım işi	KHGB	2.500,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
50.	Gökçe köyü taşburun mezrası	Su ve Kanal Hizmetleri	içme ve kullanma suyu tesis inşaatı	İller Bankası	38.433,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
51.	Elazığ Merkez	Su ve Kanal Hizmetleri	korige boru ve maşon alım işi	İller Bankası	39.270,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
52.	Kuşhane Köyü Halilağa Mezrası	Su ve Kanal Hizmetleri	içmesuyu tesisi inşaatı yapım işi	KHGB	2.932,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
53.	Elazığ Merkez	Labaratuvar	TSE laboratuvar akredite standart bedeli	KHGB	260,26	100%	Proje Tamamlanmıştır
54.	Sinan köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	sulama suyu tesisi yapım işi	İller Bankası	49.324,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
55.	Elazığ Merkez	Labaratuvar	TSE laboratuvar akredite standart bedeli	KHGB	256,3	100%	Proje Tamamlanmıştır
56.	Sarıçubuk köyü	Köy Yardımı	köy konağı yapım işi	İller Bankası	22.748,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
57.	Doğankuş köyü	Köy Yardımı	köyü köy konağı yapım işi	İller Bankası	37.873,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
58.	Pelte köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	sulama suyu tesisi yapım işi	İller Bankası	61.360,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
59.	Avcılı köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	içme suyu tesisi enh yapım işi	KÖYDES	23.364,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
60.	Avcılı köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	sulama suyu tesisi yapım işi	İller Bankası	14.307,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
61.	Acıpayam köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	sulama suyu tesisi yapım işi	İller Bankası	13.334,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
62.	Avcılı köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	sulama suyu tesisi yapım işi	İller Bankası	52.925,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
63.	Kuyulu köyü	Köy Yardımı	köy konağı yapım işi	İller Bankası	24.721,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
64.	Sarıgül köyü	Köy Yardımı	cami onarım işi	KHGB	2.500,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
65.	Erbildi köyü	Köy Yardımı	imam evi onarım işi	KHGB	2.500,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
66.	Elazığ Merkez	Genel İşler	Hükümet konağı engelli asansörü yapım işi	İl Özel İdaresi	87.084,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
67.	Gözebaşı köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	içmesuyu tesisi yapım işi	İller Bankası	64.664,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
68.	Acıpayam köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	sulama suyu tesisi yapım işi	İller Bankası	44.902,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
69.	Sarıçubuk köyü	Köy Yardımı	köy konağı yapım işi 2. Hakediş	İller Bankası	23.065,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
70.	Doğankuş köyü	Köy Yardımı	iller bankası köy kalkınma payı köy konağı yapım işi	İller Bankası	42.116,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
71.	Yemişlik Tadım Ballıca Ürünveren	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	grup köy yolu asfalt alt yapısı haz. İşi	İl Özel İdaresi	488.996,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
72.	Dallıca köyü	Köy Yardımı	çeşme ve kanallarının onarım işi	KHGB	2.500,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
73.	Kuyulu köyü	Köy Yardımı	köy konağı yapım işi	KHGB	1.545,57	100%	Proje Tamamlanmıştır
74.	Durupınar - Gülmahmut Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	içmesuyu tesis geliştirme yapım işi	KÖYDES	20.220,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
75.	Acıpayam Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	içmesuyu tesisi yapım işi	KÖYDES	5.287,59	100%	Proje Tamamlanmıştır
76.	Salkaya Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	içmesuyu tesisi yapım işi	KÖYDES	21.560,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
77.	Kalkantepe - Kuşhane Köyleri	Su ve Kanal Hizmetleri	içmesuyu tesis geliştirme işi	KÖYDES	33.822,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
78.	Sarıbük Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	içmesuyu tesis geliştirme yapım işi	KÖYDES	43.012,00	100%	Proje Tamamlanmıştır

İli Elazığ
İlçesi Merkez
Yatırımcı Elazığ İli Kalkındırma Ve Köylere Hizmet Götürme Birliği

Sıra No	Yeri	Sektörü	Yatırımın Adı	Bütçe Türü	Harcama Tutarı	Gerçekleşme	Düşünceler
79.	Alpagut köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	kanalizasyon yapım işi	İl Özel İdaresi	77.769,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
80.	Çallıca Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	içme suyu enh ve terfi hattı yapım işi	KÖYDES	53.202,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
81.	Yalındamlar Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	içmesuyu tesisi yapım işi	KÖYDES	16.821,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
82.	İkitepe Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	içme suyu tesi geliştirme yapım işi	KÖYDES	33.556,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
83.	Ortaçalı Küllük Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	içme suyu tesi geliştirme yapım işi	KÖYDES	14.740,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
84.	Serince Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	içme suyu tesi geliştirme yapım işi	KÖYDES	17.644,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
85.	Arındık ve Sarıgül Köyleri	Su ve Kanal Hizmetleri	içme suyu tesi geliştirme yapım işi	KÖYDES	30.760,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
86.	Uzuntarla Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	içme suyu tesi geliştirme yapım işi	KÖYDES	28.906,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
87.	Korucu Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	içme suyu tesi geliştirme yapım işi	KÖYDES	12.165,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
88.	Gümüşbağlar Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	içme suyu tesi geliştirme yapım işi	KÖYDES	41.023,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
89.	Şabanlı Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	içme suyu tesi geliştirme yapım işi	KÖYDES	34,805,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
90.	Hıdırbaba Köyü Muhtarlığı	Köy Yardımı	Köy Camii Bakım onarımı	KHGB	2.500,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
91.	Aydınlar Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	içmesuyu tesis geliştirme yapım işi	KÖYDES	20.306,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
92.	Karataş Beşoluk Beydalı	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	grup köy yolu yapım işi	İl Özel İdaresi	243.994,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
93.	Konakalmaz Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	içmesuyu tesisi yapım işi	KÖYDES	16.057,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
94.	Ballıca Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	içmesuyu tesisi yapım işi	KÖYDES	13.433,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
95.	Sün köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	içmesuyu motopomp ve enh yapım işi	KÖYDES	7.943,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
96.	Sedeftepe Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	içmesuyu enh yapım işi	KÖYDES	7.629,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
97.	Yazıpınar Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	içmesuyu tesisi yapım işi	KÖYDES	16.108,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
98.	Uzuntarla Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	içmesuyu enh yapım işi	KÖYDES	49.334,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
99.	PVC Boru ve fitings malzeme alımı	Su ve Kanal Hizmetleri	pvc boru ve fitings malzeme alımı	KÖYDES	149.975,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
100.	Göl Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	içmesuyu enh yapım işi	KÖYDES	29.325,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
101.	Ballıca Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	içmesuyu tesisi enh yapım işi	KÖYDES	29.489,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
102.	İkitepe Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	enh yapım işi	KÖYDES	41.645,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
103.	Sarıkamış Köyü Kartaldere	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	box menfez yapım işi	İl Özel İdaresi	107.579,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
104.	Sarıkamış Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	sulama suyu tesisi yapım işi	KÖYDES	97.930,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
105.	Yedigöze Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	içmesuyu tesisi yapım işi	KÖYDES	50.535,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
106.	Gümüşbağlar Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	içmesuyu enh ve motopomp grubu yapım işi	KÖYDES	36.754,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
107.	Koçharmanı Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	sulama suyu tesisi yapım işi	KÖYDES	114.751,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
108.	Konakalmaz Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	içmesuyu enh yapım işi	KÖYDES	14.071,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
109.	Cip köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	içmesuyu tesisi yapım işi	KÖYDES	94.258,00	100%	Proje Tamamlanmıştır
110.	Hoş Obuz Meşeli	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	box menfez yapım işi	İl Özel İdaresi	75.253,00	100%	Proje Tamamlanmıştır

İli Elazığ
İlçesi Ağın
Yatırımcı Ağın Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

Sıra No	Yeri	Sektörü	Yatırımın Adı	Bütçe Türü	Proje Tutarı	Harcama Tutarı	Gerçekleşme
1.	Öğrendik Köyü Kurtuluş Tarlabaşı	Su ve Kanal Hizmetleri	Depo Yapımı	KÖYDES	74.776,00	41.890,00	100%
2.	Öğrendik Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	İsale Hattı	KÖYDES	21.507,86	10.525,60	100%
3.	Pul Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	Tesis Geliştirme	KÖYDES	22.851,88	14.750,00	100%
4.	7 Köye Klorlama Cihazı	Su ve Kanal Hizmetleri	Klorlama Cihazı Alımı	KÖYDES	18.419,80	14.868,00	100%
5.	Modanlı - Saraycık	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	2. Kat Asfalt Yapımı	İl Özel İdaresi	186.440,00	140.420,00	100%
6.	Gümüşşu - Armutlu - Salkımlı - Badem Adası	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Stabilize Yol Yapımı	İl Özel İdaresi	79.365,00	57.287,00	100%
7.	Demirçarık Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	Kanalizasyon Tesisi Yapımı	İl Özel İdaresi	143.207,16	108.560,00	100%
8.	Ağın İlçesi	Sağlık Hizmetleri	Sağlık Ocağı Onarımı	İl Özel İdaresi	103.419,00	71.053,70	100%
9.	Kaşpınar Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	Kapalı Sistem Sulama Suyu Tesisi Yapımı	İl Özel İdaresi	78.000,00	50.192,48	100%
10.	Kaşpınar Badem Adası	Su ve Kanal Hizmetleri	Damla Sulama Suyu Tesisi Yapımı	İl Özel İdaresi	198.240,00	132.160,00	Mart 2011 Başlanacak
11.	Ağın İlçesi	Spor Hizmetleri	Spor Sahası Yapımı	Spor Toto	230.183,78	165.200,00	Mart 2011 Başlanacak
12.	Kaşpınar Köyü	Tarım Hizmetleri	Badem Adası Projesi	İl Özel İdaresi	86.900,00	86.900,00	100%

İli Elazığ
İlçesi Alacakaya
Yatırımcı Alacakaya Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

Sıra No	Yeri	Sektörü	Yatırımın Adı	Proje Tutarı	Harcama Tutarı	Gerçekleşme	Düşünceler
1.	Çataklı Köyü	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Menfez Yapımı	35.188,92	25.783,78	100%	Proje Tamamlanmıştır.
2.	Çataklı Köyü	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Yol Yapımı	571.223,84	594.537,10	100%	Proje Tamamlanmıştır.
3.	İncebayır Köyü	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Köprü Yapımı	253.615,16	164.584,21	100%	Proje Tamamlanmıştır.
4.	Esenlik - Bahroboğaz - Yanlızdamlar - Çataklı - Halkalı Köyleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Stabilize Yol Yapımı	50.000,00	42.141,00	100%	Proje Tamamlanmıştır.
5.	Yanlızdamlar	Su ve Kanal Hizmetleri	İçme Suyu Tesisi Yapımı	124.792,78	100.082,00	100%	Proje Tamamlanmıştır.
6.	Bakladamlar Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	İçme Suyu Tesisi Yapımı	256.504,08	0,00		2011 Yılında bitirilecek.

İli Elazığ
İlçesi Arıcak
Yatırımcı Arıcak Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

Sıra No	Yeri	Sektörü	Yatırımın Adı	Bütçe Türü	Proje Tutarı	Harcama Tutarı	Gerçekleşme	Düşünceler
1.	Arıcak İlçesi Köyleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Stabilize Yol Çalışması	İl Özel İdaresi	60.000,00	60.000,00	100%	
2.	Köy İlköğretim Okulları	Eğitim Hizmetleri	Bakım Onarımı	İl Özel İdaresi	2.500,00	2.500,00	100%	
3.	Kambertepe Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	Sulama ve İçme Suyu Tesis Yapımı	İller Bankası	42.000,00	41.900,00	100%	
4.	Ormanpınar Köyü	İskan Hizmetleri	Köy Konağı Yapım İşi	İller Bankası	42.000,00	41.900,00	100%	
5.	Arıcak Merkez İlköğreitm Okulları	Eğitim Hizmetleri	İstinat Duvarı Yapım İşi	İl Özel İdaresi	33.925,00	33.925,00	100%	
6.	Çevrecik Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	Tesis Geliştirme	KÖYDES	17.000,00	28.950,00	100%	
7.	Karakaş Til	Su ve Kanal Hizmetleri	Tesis Geliştirme	KÖYDES	48.000,00		0%	İhale Aşamasında
8.	Küplüce Köyü Ilıca Mezrası	Su ve Kanal Hizmetleri	Tesis Geliştirme	KÖYDES	12.500,00	32.350,88	100%	
9.	Küpülüce Köyü Akyıldız Mezrası	Su ve Kanal Hizmetleri	Tesis Geliştirme	KÖYDES	12.500,00	30.680,00	100%	
10.	9 Köy İçme Suyu Depo Onarımı 17 Adet İçme Suyu Klorlama Cihazı alımı.	Su ve Kanal Hizmetleri	Tesis Geliştirme Klorlama Cihazı Alımı	KÖYDES	66.000,00	59.990,00	100%	
11.	Erbağı Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	Kanalizasyon Tesisi Yapımı	İller Bankası	135.000,00	132.327,62	90%	Yapım Aşamasında
12.	Arıcak Merkez Deştek Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	Sulama Kanalı Yapım İşi	İller Bankası	171.000,00	34.814,96	100%	
13.	Kamberetepe - Ormanpınar - Çevrecik	Su ve Kanal Hizmetleri	Drenaj Çalışması	KÖYDES	17.400,00	14.160,00	90%	Yapım Aşamasında
14.	Erimli Jandarma Karakolu	Su ve Kanal Hizmetleri	İçmesuyu Tesisi Yapımı	İller Bankası	22.000,00	22.000,00	100%	
15.	Erimli	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Stabilize Yol Çalışması	İller Bankası		7.607,50	100%	
16.	Çevrecik Köyü	İskan Hizmetleri	Mezarlık Etrafı Yapımı	KÖYDES		2.652,00	100%	
17.	Yoğunbilek Köyü	İskan Hizmetleri	WC Yapımı	Birlik Bütçesi		5.278,00	100%	
18.	Bozçavuş - Küplüce - Erbağı - Karakaş - Yoğunbilek Ormanpınar - kambertepe - Kayahisar	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Köy İçi İhata Duvarı Yapım İşi	Birlik Bütçesi		16.749,00	100%	

İli Elazığ
İlçesi Baskil
Yatırımcı Baskil Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

Sıra No	Yeri	Sektörü	Yatırımın Adı	Bütçe Türü	Proje Tutarı	Harcama Tutarı	Gerçekleşme	Düşünceler
1.	Topaluşağı Ahimicansız	Su ve Kanal Hizmetleri	Yeni Tesis Yapımı	KÖYDES	141.218,00	35.304,00	100%	% 75 İller Bankası
2.	Sultanyatağı Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	Yeni Tesis Yapımı	KÖYDES	338.555,00	84.167,00	100%	% 75 İller Bankası
3.	Topaluşağı Konak	Su ve Kanal Hizmetleri	Yeni Tesis Yapımı	KÖYDES	20.650,00	20.650,00	100%	Proje Tamamlanmıştır.
4.	Sultanuşağı	Su ve Kanal Hizmetleri	Tesis Geliştirme	KÖYDES	51.569,00	51.569,00	100%	Proje Tamamlanmıştır.
5.	Çavuşlu Kal Mezrası	Su ve Kanal Hizmetleri	Yeni Tesis Yapımı	KÖYDES	152.000,00	101.636,00	100%	Proje Tamamlanmıştır.
6.	Işıklar Tuzluca	Su ve Kanal Hizmetleri	Tesis Geliştirme	KÖYDES	100.000,00	60.303,00	100%	Proje Tamamlanmıştır.
7.	Aşağı Kuluşağı	Su ve Kanal Hizmetleri	Sulama	KÖYDES	466.694,00	115.989,00	100%	% 75 İller Bankası
8.	Gemici	Su ve Kanal Hizmetleri	Sulama	KÖYDES	660.800,00	165.200,00	100%	% 75 İller Bankası

İli Elazığ
İlçesi Keban
Yatırımcı Keban Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

Sıra No	Yeri	Sektörü	Yatırımın Adı	Bütçe Türü	Proje Tutarı	Harcama Tutarı	Gerçekleşme	Düşünceler
1.	Altıyaya Köyü Cabbar Mezrası	Su ve Kanal Hiz.	İçmesuyu Temini	KÖYDES	34.166,67	22.438,88	100%	Proje Tamamlandı
2.	Köy ve Üniteler	Su ve Kanal Hiz.	43 Adet İçmesuyu Deposunun Fayans İle Kaplanması	KÖYDES	128.278,98	109.598,40		2011 Yılında Başlanacak
3.	Koyunuşağı köyü Kostandede mz. Bademli yolu-Beydeğirmeni Yukarı Demirli Mezrası	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	1.Kat Asfalt yapımı	KÖYDES	548.713,82	375.055,92		2011 Yılında Başlanacak
4.	Dürümlü Köyü	Su ve Kanal Hiz.	Kanalizasyon Tesisi Yapımı	İl Özel İdaresi İller Bankası	107.370,53	64.102,53	100%	41.900,00 TL İller Bankası Kredisi
5.	Beydeğirmeni Köyü	Su ve Kanal Hiz.	Sulama Suyu Tesisi Yapımı	İl Özel İdaresi	122.471,06	84.002,96	100%	Proje Tamamlandı
6.	Akgömlek Köyü	Spor Hizmetleri	Sulama Suyu Tesisi Yapımı	İl Özel İdaresi İller Bankası	71.374,90	54.235,06	100%	41.900,00 TL İller Bankası Kredisi
7.	Ulupınar Köyü	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Sanat Yapıları	İl Özel İdaresi İller Bankası	97.334,07	63.267,24	100%	47.853,41 TL İller Bankası Kredisi
8.	Keban İlçe ve Köyleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Araç Kiralama İşi	İl Özel İdaresi	145.252,10	108.825,00	100%	Proje Tamamlandı
9.	Keban İlçe ve Köyleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Araç Kiralama İşi	İl Özel İdaresi	29.736,00	24.780,00	100%	Proje Tamamlandı
10.	Üçpınar,Akçatepe,Altınkürek,Der ince,Akgömlek,Karaçor,Çoban mz.-Çalık Köyü,Ulupınar Köyü Ziyaret Yolu	Yol-Ulaşım Hiz.	1. ve 2. Kat Asfalt Yapım İşi	İl Özel İdaresi	429.954,05	276.238,00	100%	Proje Tamamlandı

İli Elazığ
İlçesi Kovancılar Köylere Hizmet
Yatırımcı Götürme Birliği Başkanlığı

Sıra No	Yeri	Sektörü	Yatırımın Adı	Bütçe Türü	Proje Tutarı	Harcama Tutarı	Gerçekleşme	Düşünceler
1.	Hacısam Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	Yeni Tesis Yapımı	KÖYDES	51.000,00	51.839,00	100%	Proje Tamamlanmıştır.
2.	Ekinözü Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	Tesis Geliştirme	KÖYDES	30.000,00	25.203,00	100%	Proje Tamamlanmıştır.
3.	Beşoluk Mezrası	Su ve Kanal Hizmetleri	Yeni Tesis Yapımı	KÖYDES	78.400,00	72.021,00	100%	Proje Tamamlanmıştır.
4.	Sütpınarı Mezrası	Su ve Kanal Hizmetleri	Yeni Tesis Yapımı	KÖYDES	0,00	56.401,00	100%	Proje Tamamlanmıştır.
5.	Şenova Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	Yeni Tesis Yapımı	KÖYDES İl Özel İdaresi	150.000,00	120.750,00	100%	Proje Tamamlanmıştır.
6.	Kaçar Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	Sulama Suyu Tesisi Yapımı	İller Bankası İl Özel İdaresi	118.000,00	100.000,00	100%	Proje Tamamlanmıştır.
7.	Şenova Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	Kanalizasyon Tesis Yapımı	KÖYDES İller Bankası	150.000,00	120.750,00	100%	Proje Tamamlanmıştır.
8.	Yazıbaşı Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	Sulama Suyu Tesisi Yapımı	İl Özel İdaresi	266.709,00	247.800,00	70%	Proje Devam Ediyor
9.	Tepebağ Köyü	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	1. Kat Asfalt	İl Özel İdaresi		35.000,00	100%	Proje Tamamlanmıştır.
10.	Taşcanak Köyü	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	1. Kat Asfalt	İl Özel İdaresi		35.000,00	100%	Proje Tamamlanmıştır.
11.	Gedikyurt Köyü	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	1. Kat Asfalt	İl Özel İdaresi		120.000,00	100%	Proje Tamamlanmıştır.
12.	Yazıbaşı Köyü	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	1. Kat Asfalt	İl Özel İdaresi		20.000,00	100%	Proje Tamamlanmıştır.
13.	Gözecik Köyü	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	2. Kat Asfalt	İl Özel İdaresi		23.877,00	100%	Proje Tamamlanmıştır.
14.	Payamlı Köyü	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	2. Kat Asfalt	İl Özel İdaresi		33.000,00	100%	Proje Tamamlanmıştır.
15.	Yeşilköy	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	2. Kat Asfalt	İl Özel İdaresi		111.000,00	50%	Proje Devam Ediyor
16.	Yamaçova Mezrası	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	2. Kat Asfalt	İl Özel İdaresi		111.000,00	50%	Proje Devam Ediyor
17.	Yenikaya Mezrası	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	2. Kat Asfalt	İl Özel İdaresi		64.400,00	50%	Proje Devam Ediyor
18.	İsaağa - Yoncalıbayır	Yol ve Ulaşım Hizmetleri					100%	Proje Tamamlanmıştır.
19.	Fahribey - Soğanlı - Uyandık	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Stabilize	İl Özel İdaresi			100%	Proje Tamamlanmıştır.
20.	Saraybahçe Köy İçi	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Stabilize	İl Özel İdaresi			100%	Proje Tamamlanmıştır.
21.	Tepebağ Köy İçi	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Stabilize	İl Özel İdaresi			100%	Proje Tamamlanmıştır.
22.	Gedikyurt Köyü	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Stabilize	KÖYDES			100%	Proje Tamamlanmıştır.
23.	Uzunova	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Stabilize	KÖYDES			100%	Proje Tamamlanmıştır.
24.	Okçular - Kayalık	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Stabilize	KÖYDES			100%	Proje Tamamlanmıştır.
25.	Yoncalıbayır	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Stabilize	KÖYDES			100%	Proje Tamamlanmıştır.
26.	Mustafaağa - Mirmehmet	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Stabilize	KÖYDES				Proje Tamamlanmıştır.
27.	Şenova Köyü	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Stabilize	KÖYDES				Proje Tamamlanmıştır.
28.	Kaşça	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Stabilize	KÖYDES				Proje Tamamlanmıştır.
29.		Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Stabilize	KÖYDES				Proje Tamamlanmıştır.
30.	Köprüdere	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Stabilize	KÖYDES				Proje Tamamlanmıştır.
31.	Tavdik	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Stabilize	KÖYDES				Proje Tamamlanmıştır.
32.	Ekinözü	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Stabilize	KÖYDES				Proje Tamamlanmıştır.
33.	Kavak	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Stabilize	KÖYDES				Proje Tamamlanmıştır.
34.	Yukarı Kanatlı	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Stabilize	KÖYDES		150.000,00		Proje Tamamlanmıştır.
35.	Hacısam	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Stabilize	İl Özel İdaresi			50%	Devam Ediyor
36.	Çelebi - Sultanbağı	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Stabilize	İl Özel İdaresi			100%	Proje Tamamlanmıştır.
37.	Kovancılar İlçe ve Köyleri	Eğitim Hizmetleri	Okul Bakım Onarımları	Birlik Bütçesi		103.000,00	100%	Proje Tamamlanmıştır.
38.	Kuşçu Köyü	İskan Hizmetleri	Köy Konağı	Birlik Bütçesi		12.000,00	80%	Devam Ediyor
39.	Çatakbaşı	İskan Hizmetleri	Köy Konağı	Birlik Bütçesi		15.000,00	90%	Devam Ediyor
40.	Yeniköy Mezrası	İskan Hizmetleri	Köy Konağı	Birlik Bütçesi		5.000,00	20%	Devam Ediyor

İli Elazığ
İlçesi Karakoçan
Karakoçan Köylere Hizmet
Yatırımcı Götürme Birliği Başkanlığı

Sıra No	Yeri	Sektörü	Yatırımın Adı	Bütçe Türü	Proje Tutarı	Harcama Tutarı	Gerçekleşme	Düşünceler
1.	Aşağı Ovacık Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	Tesis Geliştirme Yapımı	KÖYDES	70.071,11	79.060,00	100%	Proje Tamamlanmıştır.
2.	Çan Köyü Yıldız Mezrası	Su ve Kanal Hizmetleri	Yeni Tesis Yapımı	KÖYDES	43.916,12	48.970,00	100%	Proje Tamamlanmıştır.
3.	Karapınar Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	Tesis Geliştirme Yapımı	KÖYDES	70.186,08	70.800,00	85%	Devam Ediyor
4.	Kulundere Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	Tesis Geliştirme Yapımı	KÖYDES	11.346,33	10.620,00	80%	Devam Ediyor
5.	Yeniköy	Su ve Kanal Hizmetleri	Tesis Geliştirme Yapımı	KÖYDES	27.712,75	30.972,64	100%	Proje Tamamlanmıştır.
6.	Demirtaş Köyü Mollaşeftiyan Mezrası	Su ve Kanal Hizmetleri	Yeni Tesis Yapımı	KÖYDES	72.143,73	76.700,00	80%	Devam Ediyor
7.	Dumluyazı Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	Yeni Tesis Yapımı	KÖYDES	42.508,08	46.020,00	100%	Proje Tamamlanmıştır.
8.	Yukarı Ovacık Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	Tesis Geliştirme Yapımı	KÖYDES	19.223,56	18.880,00	100%	Proje Tamamlanmıştır.
9.	Gündeğidi Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	Tesis Geliştirme Yapımı	KÖYDES	13.801,70	12.980,00	100%	Proje Tamamlanmıştır.
10.	Kulundere Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	Tesis Geliştirme Yapımı	KÖYDES	70.514,16	75.520,00	100%	Proje Tamamlanmıştır.
11.	Hamzalı Ada Mahallesi	Su ve Kanal Hizmetleri	Yeni Tesis Yapımı	KÖYDES	96.215,61	79.650,00	10%	Devam Ediyor
12.	Kavakdere Düğünlü Mezrası	Su ve Kanal Hizmetleri	Sondaj	KÖYDES	23.619,92	24.000,00	90%	Devam Ediyor
13.	Okçular Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	Tesis Geliştirme Yapımı	KÖYDES	21.231,96	22.000,00	100%	Proje Tamamlanmıştır.
14.	Korudibi Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	Yeni Tesis Yapımı	KÖYDES İller Bankası	116.324,96	129.800,00	100%	Proje Tamamlanmıştır.
15.	Bulgurcuk Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	Tesis Geliştirme Yapımı					2011 Yılında Yapımına Başlanacak
16.	Kalecik Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	Tesis Geliştirme Yapımı					2011 Yılında Yapımına Başlanacak
17.	Köryusuf Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	Tesis Geliştirme Yapımı					2011 Yılında Yapımına Başlanacak
18.	Çanakçı - Kuşçu - Akyokuş Köyü Grup Yolu	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	1. Kat Asfalt	KÖYDES İller Bankası	504.659,75	427.419,60	100%	Proje Tamamlanmıştır.
19.	Bulgurcuk Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	Gölet	KÖYDES İller Bankası	80.827,55	90.270,00	100%	Proje Tamamlanmıştır.
20.	Yenikaya Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	Gölet	KÖYDES İller Bankası	145.532,45	153.390,96	100%	Proje Tamamlanmıştır.
21.	Yenice Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	Gölet	KÖYDES İller Bankası	84.013,92	92.040,00	100%	Proje Tamamlanmıştır.
22.	Bulgurcuk Köyü	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Köprü	KÖYDES İller Bankası	19.595,34	21.830,00	100%	Proje Tamamlanmıştır.
23.	Yeniköy Kesan Mahallesi	Su ve Kanal Hizmetleri	Kanalizasyon Tesisi Yapımı	İller Bankası	110.610,46	85.000,00	10%	Devam Ediyor
24.	Bulgurcuk Köyü - Kalecik - Gündeğdi Köyleri Mıcır Nakli Serme Sıkıştırma	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Stabilize Yol Çalışması	İl Özel İdaresi	116.025,78	100.257,52	100%	Proje Tamamlanmıştır.
25.	Kız Meslek Lisesi Kanalizasyon Yapım İşi	Eğitim Hizmetleri	Kanalizasyon Tesisi Yapımı	İl Özel İdaresi	10.357,41	11.210,00	100%	Proje Tamamlanmıştır.
26.	İmam Hatip Lisesi 4 Derslik Ek Bina Yapım İşi	Eğitim Hizmetleri	Ek Bina Yapımı	İl Özel İdaresi	40.998,06	39.530,00	10%	Devam Ediyor
27.	Bozçatı Jandarma Karkolu İçme suyu Tesisi Yapım İşi	Su ve Kanal Hizmetleri	Yeni Tesis Yapımı	İl Özel İdaresi	47.342,37	40.999,00	10%	Devam Ediyor

İli Elazığ
İlçesi Palu
Yatırımcı Palu Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

Sıra No	Yeri	Sektörü	Yatırımın Adı	Bütçe Türü	Proje Tutarı	Harcama Tutarı	Gerçekleşme	Düşünceler
1.	Üçdeğirmenler Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	Sulama Suyu Tesisi Yapımı	İller Bankası KÖYDES	320.197,53	283.222,50	90%	2011 Yılında Tamamlanacak
2.	Güllüce Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	İçmesuyu Tesisi Yapımı	KÖYDES	150.943,71	125.599,20	5%	2011 Yılında Tamamlanacak
3.	Gökdere Bölgesi	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Sanat Yapıları	İller Bankası KÖYDES	1.239.636,65	926.289,78	100%	Proje Tamamlanmıştır.
4.	Akyürek Köyü	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Sanat Yapıları	İller Bankası KÖYDES	60.120,02	46.071,25	100%	Proje Tamamlanmıştır.
5.	Seydili köyü	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	1.Kat Asfalt Yapımı	İller Bankası KÖYDES	176.676,83	152.904,40	100%	Proje Tamamlanmıştır.
6.	Kayaönü köyü	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	1.Kat Asfalt Yapımı	İller Bankası KÖYDES	75.154,97	61.213,68	100%	Proje Tamamlanmıştır.
7.	Keklikdere köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	Sulama Suyu Tesisi Yapımı	İller Bankası KÖYDES	154.063,41	111.631,30	100%	Proje Tamamlanmıştır.
8.	Hasbey köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	Sulama Suyu Tesisi Yapımı	KÖYDES	95.756,25	93.810,00	100%	Proje Tamamlanmıştır.
9.	Örgülü Köyü	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	1.Kat Asfalt Yapımı	KÖYDES	79.479,13	64.835,43	100%	Proje Tamamlanmıştır.
10.	Karasalkım pınarbaşı köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	İçmesuyu Tesisi Yapımı	KÖYDES	41.300,00	41.300,00	5%	2011 Yılında Tamamlanacak
11.	Köroğlu Mezrası	Su ve Kanal Hizmetleri	İçmesuyu Tesisi Yapımı	KÖYDES	24.898,00	24.898,00	100%	Proje Tamamlanmıştır.
12.	Akbulut Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	İçmesuyu Tesisi Yapımı	KÖYDES	23.482,00	23.482,00	100%	Proje Tamamlanmıştır.
13.	Kırkbulak Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	İçmesuyu Tesisi Yapımı	KÖYDES	42.039,86	42.039,86	100%	Proje Tamamlanmıştır.
14.	Karasalkım Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	Kanalizasyon Tesisi Yapımı	İller Bankası Köy Kalkınma Payı	440.504,98	440.504,98	1%	2011 Yılında Tamamlanacak
15.	Gömeçbağlar	Su ve Kanal Hizmetleri	Sulama Suyu Tesisi Yapımı	İller Bankası Köy Kalkınma Payı	290.497,65	290.497,65	1%	2011 Yılında Tamamlanacak
16.	Üçdeğirmenler Karataş Köyü	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	2. Kat Asfalt Yol Yapımı	KÖYDES	27.128,20	27.128,20	100%	Proje Tamamlanmıştır.
17.	Arındık-Akyürek ve Karataş köyü	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Araç Kiralanması	İl Özel İdaresi	30.000,00	30.000,00	100%	Proje Tamamlanmıştır.
18.	Gökdere Köyü	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Sanat Yapıları	İl Özel İdaresi	18.560,00	18.560,00	100%	Proje Tamamlanmıştır.
19.	Palu Murat İlköğretim Okulu İhata Duvarı yapımı	Eğitim Hizmetleri	İhata Duvarı Yapımı	İl Özel İdaresi	50.003,68	50.003,68	50%	2011 Yılında Tamamlanacak
20.	Gökdere Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	İçmesuyu Tesis Onarımı	İl Özel İdaresi	41.000,00	41.000,00	100%	Proje Tamamlanmıştır.

İli Elazığ
İlçesi Maden
Yatırımcı Maden Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

Sıra No	Yeri	Sektörü	Yatırımın Adı	Bütçe Türü	Proje Tutarı	Harcama Tutarı	Gerçekleşme	Düşünceler
1.	Cumhuriyetçi Behram Mezrası	Su ve Kanal Hizmetleri	İçmesuyu Tesisi Yapımı	KÖYDES	17.000,00	8.106,00	100%	Proje Tamamlanmıştır.
2.	Dutpınar Yörecik Mezrası	Su ve Kanal Hizmetleri	İçmesuyu Tesisi Yapımı	KÖYDES	8.000,00	5.605,70	100%	Proje Tamamlanmıştır.
3.	Yoncapınar Topağaç Mezrası	Su ve Kanal Hizmetleri	İçmesuyu Tesisi Yapımı	KÖYDES	41.000,00	70.782,06	100%	Proje Tamamlanmıştır.
4.	Tekevler Tavşanbağları Mezrası	Su ve Kanal Hizmetleri	İçmesuyu Tesisi Yapımı	KÖYDES	40.000,00	45.688,00	100%	Proje Tamamlanmıştır.
5.	Tekevler Tavşanbağları ENH	Su ve Kanal Hizmetleri	İçmesuyu Tesisi Yapımı	KÖYDES	25.000,00	0,00	0%	Proje Hazırlanıyor
6.	Çayırköy Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	İçmesuyu Tesisi Yapımı	KÖYDES	17.000,00	25.944,66	100%	Proje Tamamlanmıştır.
7.	Kaşlıca Köyü Bük Mezrası	Su ve Kanal Hizmetleri	İçmesuyu Tesisi Yapımı	KÖYDES İller Bankası	30.000,00	105.416,48	100%	Proje Tamamlanmıştır.
8.	Kaşlıca Köyü Haman Mevki	Su ve Kanal Hizmetleri	İçmesuyu Tesisi Yapımı	KÖYDES	30.000,00	26.550,00	100%	Proje Tamamlanmıştır.
9.	Sağrılı Köyü Küçükköm	Su ve Kanal Hizmetleri	İçmesuyu Tesisi Yapımı	KÖYDES	30.000,00	21.166,00	100%	Proje Tamamlanmıştır.
10.	Köylere Yönelik Hizmetler	Su ve Kanal Hizmetleri	İçmesuyu Tesisi Yapımı	İl Özel İdaresi	35.000,00	35.000,00	100%	Proje Tamamlanmıştır.
11.	Yıldızhan Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	Kanalizasyon Tesisi Yapımı	İl Özel İdaresi İller Bankası	102.542,00	102.542,00	100%	Proje Tamamlanmıştır.
12.	Koçkonağı Köyü	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Sanat Yapıları	İl Özel İdaresi İller Bankası	67.555,00	67.555,00	100%	Proje Tamamlanmıştır.
13.	Kaymakamlık Konutu yapım işi	İnşaat	Kaymakamlık Konutu	İl Özel İdaresi	250.000,00	307.008,00	100%	Proje Tamamlanmıştır.
14.	Gezin	Su ve Kanal Hizmetleri	Sulama Suyu Tesisi	KÖYDES İl Özel İdaresi	160.000,00	551.365,00	90%	Proje Devam Etmektedir.
15.	Yeşilova köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	Sulama Suyu Tesisi	İl Özel İdaresi İller Bankası	0,00	54.035,00	25%	Proje Devam Etmektedir.
16.	Kartaldere-Kumyazı-Sarıkamış	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Asfalt Kaplama Yol Yapımı	KÖYDES İller Bankası	335.000,00	1.137.554,00	100%	Proje Tamamlanmıştır.
17.	Kaşlıca ve Çitli köyleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	2. Kat Asfalt Yol Yapımı	İl Özel İdaresi	35.250,00	34.007,60	100%	Proje Tamamlanmıştır.
18.	İlçe Köy yolları	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Stabilize Yol Kaplama Yapımı	İl Özel İdaresi	102.000,00	101.020,00	100%	Proje Tamamlanmıştır.
19.	İlçe Köy yolları	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Stabilize Yol Kaplama Yapımı	İl Özel İdaresi	40.000,00	0,00	0%	Proje Hazırlanıyor

İli Elazığ
İlçesi Sivrice
Yatırımcı Sivrice Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

Sıra No	Yeri	Sektörü	Yatırımın Adı	Bütçe Türü	Proje Tutarı	Harcama Tutarı	Gerçekleşme	Düşünceler
1.	Sivrice	Eğitim Hizmetleri	Sivrice 12 Derslikli İlköğretim Okulu Yapım İşi	İl Özel İdaresi	1.629.550,22	517.596,05	100%	Proje Tamamlanmıştır.
2.	Sivrice	Eğitim Hizmetleri	Sivrice Atatürk İ.Ö.O. Ve Cumhuriyet YİBO onarım işi	İl Özel İdaresi	111.167,88	38.063,60	100%	Proje Tamamlanmıştır.
3.	Sivrice	Eğitim Hizmetleri	Sivrice 75. Yıl İMKB İ.Ö.O. Onarım işi	İl Özel İdaresi	29.205,35	30.182,76	100%	Proje Tamamlanmıştır.
4.	Sivrice	Eğitim Hizmetleri	Sivrice Başkaynak köyü İ.Ö.O. onarım işi	İl Özel İdaresi	24.853,35	0,00	100%	Proje Tamamlanmıştır.
5.	Sivrice	Eğitim Hizmetleri	Sivrice Gözeli Celal İlaldı YİBO onarım işi	İl Özel İdaresi	24.339,26	0,00	100%	Proje Tamamlanmıştır.
6.	Kürk Köyü	Su ve Kanal Hizmetleri	Tesis Geliştirme	İl Özel İdaresi	18.722,93	0,00	100%	Proje Tamamlanmıştır.
7.	Sivrice Köyleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	2. kat Asfalt yapım işi	İl Özel İdaresi	46.248,39	37.276,61	100%	Proje Tamamlanmıştır.
8.	Sivrice Köyleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Asfalt Bitum nakil işi	İl Özel İdaresi	35.220,64	22.747,21	100%	Proje Tamamlanmıştır.

İli Elazığ
İlçesi Merkez ve İlçeler
Yatırımcı Sağlık İl Müdürlüğü

S.No	Yeri	Sektörü	Yatırımın Adı	Bütçe Türü	Harcama Tutarı	Gerçekleşme
1.	Kovancılar	Sağlık Hizmetleri	Kovancılar Devlet Hastanesi Çevri Düzenlenmesi	Genel Bütçe	559.321,54	85%
2.	Alacakaya	Sağlık Hizmetleri	Sağlık Eğitim Merkezi Onarımı	Genel Bütçe	105.928,01	100%
3.	Merkez	Sağlık Hizmetleri	Sağlık Müdürlüğü Onarımı	Genel Bütçe	20.230,12	100%
4.	Merkez	Sağlık Hizmetleri	Fahribey Sağlık Evi Onarımı	Genel Bütçe	21.889,67	100%
5.	Kovancılar	Sağlık Hizmetleri	Yarımca 112 Acil Yardım İstasyonu Onarımı	Genel Bütçe	20.256,09	100%
6.	Palu	Sağlık Hizmetleri	Yedigöze Sağlık Evi	Genel Bütçe	22.265,94	100%
7.	Arıcak	Sağlık Hizmetleri	Cumhuriyet Aile Sağlığı Merkezi Lojmanlar	Genel Bütçe	77.151,76	100%
8.	Merkez	Sağlık Hizmetleri	Mollakendi Sağlık Evi ve Lojman Onarımı	Özel İdare	8.296,72	100%
9.	Maden	Sağlık Hizmetleri	Maden/Gezin 112 Acil Yardım İstasyonu Onarımı	Özel İdare	11.614,74	100%
10.	Kovancılar	Sağlık Hizmetleri	Kovancılar / Çakırkaş Aile Sağlığı Merkezi	Genel Bütçe	2.667,10	100%
11.	Merkez	Sağlık Hizmetleri	Şehit Yüksel Demir Aile Sağlığı Merkezi Onarımı	Genel Bütçe	13.763,25	100%
12.	Keban	Sağlık Hizmetleri	Ulukent Aile Sağlığı Merkezi Onarımı	Özel İdare	10.148,00	100%
13.	Sivrice	Sağlık Hizmetleri	Fevziçakmak Aile Sağlığı Merkezi Onarımı	Özel İdare	6.136,00	100%
14.	Keban	Sağlık Hizmetleri	Doğankuş Sağlık Evi Onarım	Özel İdare	7.965,00	100%
15.	Ağın	Sağlık Hizmetleri	Ağın Toplum Sağlığı Merkezi	Özel İdare	71.055,00	100%
16.	Alacakaya	Sağlık Hizmetleri	Alacakaya Lojman Yapımı	Özel İdare	70.000,00	100%
17.	Maden	Sağlık Hizmetleri	Maden/Hazar Aile Sağlığı Merkezi Onarımı	Özel İdare	34.386,82	100%
18.	Merkez	Sağlık Hizmetleri	Doğukent Toplum Sağlığı Merkezi Lojman Onarımı	Özel İdare	19.470,00	100%
19.	Merkez	Sağlık Hizmetleri	Karaali 112 Acil Yrd. İstasyonu	Özel İdare	13.688,00	100%
20.	Sivrice	Sağlık Hizmetleri	Sivrice Toplum Sağlığı Merkezi Onarımı	Özel İdare	13.570,00	100%
21.	Kovancılar	Sağlık Hizmetleri	Kovancılar Devlet Hastanesi Ek Bina Yapımı	Genel Bütçe	4.603.741,66	100%
22.	Karakoçan	Sağlık Hizmetleri	Karakoçan Toplum Sağlığı Merkezi Yapımı	Genel Bütçe	524.263,22	95%

İli Elazığ
İlçesi Merkez ve İlçeler
Yatırımcı Tarım İl Müdürlüğü

S.No	Yeri	Sektörü	Yatırımın Adı	Bütçe Türü	Harcama Tutarı	Gerçekleşme	Açıklama
1.	Elazığ Merkez ve İlçeleri	Tarım Hizmetleri	Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi	İl Özel İdaresi	50.888,00	100%	* 200 kg Arı Otu Alımı * 600 Adet Kivi Fidanı Alımı * 450.000 Adet Domates Fidesi Alımı * 2.000 Adet Nar Fidesi Alımı * 127 Torba Slajlık Mısır Tohumu
2.	Elazığ Merkez ve İlçeleri	Tarım Hizmetleri	Bitki Sağlığı ve Uygulamaları Kontrolü Projesi	İl Özel İdaresi	3.000,00	100%	Tarla Faresi ile mücadelede kullanılmak üzere 600 kğ zehirli buğday alımı
3.	Elazığ Merkez ve İlçeleri	Tarım Hizmetleri	Bitki Sağlığı ve Uygulamaları Kontrolü Projesi	Genel İdare	71.000,00	100%	Proje Tamamlanmıştır.
4.	Elazığ Merkez ve İlçeleri	Tarım Hizmetleri	Hayvan Hastalıkları ve Zararları ile Mücadele Projesi	Genel İdare	100.000,00	100%	Proje Tamamlanmıştır.
5.	Elazığ Merkez ve İlçeleri	Tarım Hizmetleri	Kontrol Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi	Genel İdare	6.500,00	100%	Proje Tamamlanmıştır.
6.	Elazığ Merkez ve İlçeleri	Tarım Hizmetleri	Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi	Genel İdare	21.000,00	100%	Bağcılık , buğday, yağlık mısır, sebze,sert çekirdekli meyveler, sert kabuklu meyveler, üzümsü meyveler ile yumuşak çekirdekli meyve demonstrasyonları yapılmıştır.
7.	Elazığ Merkez ve İlçeleri	Tarım Hizmetleri	Çayır Mera Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi	Genel İdare	6.000,00	100%	Silajlık mısır üretimi ve silaj yapımı faaliyetleri yapılmıştır.
8.	Elazığ Merkez ve İlçeleri	Tarım Hizmetleri	Hayvancılığı Geliştirme Projesi	Genel İdare	11.600,00	100%	Suni tohumlama ile önsoykütüğü faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.
9.	Elazığ Merkez ve İlçeleri	Tarım Hizmetleri	Su Ürünleri Üretimini Geliştirme Projesi	Genel İdare	11.800,00	100%	Su ürünleri tesislerinin denetimi, su ürünleri yetiştiricilik taleplerinin değerlendirilmesi ve su ürünleri istatistik çalışmaları.

İli Elazığ
İlçesi Merkez ve İlçeler
Yatırımcı İl Milli Eğitim Müdürlüğü

S.No	Yeri	Sektörü	Yatırımın Adı	Bütçe Türü	Harcama Tutarı	Gerçekleşme
1.	Elazığ-Merkez	Eğitim Hizmetleri	Sanayi Mah. Anaokulu	İl Özel İdaresi	172.089,24	30%
2.	Elazığ-Merkez	Eğitim Hizmetleri	Üniversite Kampüsü	İl Özel İdaresi	923.617,18	100%
3.	Elazığ-Arıcak İlçesi	Eğitim Hizmetleri	Yoğunbilek İlköğretim Okulu	İl Özel İdaresi	762.474,91	100%
4.	Elazığ- Baskil İlçesi	Eğitim Hizmetleri	Merkez İlköğretim Okulu	İl Özel İdaresi	671.291,26	100%
5.	Elazığ -Merkez	Eğitim Hizmetleri	TOBB İlköğretim Okulu	İl Özel İdaresi	31.742,00	100%
6.	Elazığ -Merkez	Eğitim Hizmetleri	Altınçevre İlköğretim Okulu	İl Özel İdaresi	95.286,35	100%
7.	Elazığ -Merkez	Eğitim Hizmetleri	Mustafa Kemal İlköğretim Okulu (Paket)	İl Özel İdaresi	105.905,00	100%
8.	Elazığ -Merkez	Eğitim Hizmetleri	Tuncay Küçüközer İlköğretim Okulu (Paket)			100%
9.	Elazığ- Merkez	Eğitim Hizmetleri	Atatürk İlköğretim Okulu (Paket)			100%
10.	Elazığ- Merkez	Eğitim Hizmetleri	İsmetpaşa İlköğretim Okulu	İl Özel İdaresi	87.927,62	100%
11.	Elazığ- Merkez	Eğitim Hizmetleri	Evrenpaşa İlköğretim Okulu			100%
12.	Elazığ- Merkez	Eğitim Hizmetleri	Cumhuriyet İlköğretim Okulu			100%
13.	Elazığ- Merkez	Eğitim Hizmetleri	Yücel İlköğretim Okulu	İl Özel İdaresi	80.830,00	100%
14.	Elazığ- Merkez	Eğitim Hizmetleri	Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu			100%
15.	Elazığ- Merkez	Eğitim Hizmetleri	İstiklal İlköğretim Okulu			100%
16.	Elazığ- Merkez	Eğitim Hizmetleri	Murat İlköğretim Okulu	İl Özel İdaresi	94.282,00	100%
17.	Elazığ- Merkez	Eğitim Hizmetleri	Namık Kemal İlköğretim Okulu			100%
18.	Elazığ- Merkez	Eğitim Hizmetleri	Elazığ İlköğretim Okulu			100%
19.	Elazığ- Merkez	Eğitim Hizmetleri	Mezre İlköğretim Okulu	İl Özel İdaresi	107.922,62	100%
20.	Elazığ- Merkez	Eğitim Hizmetleri	Şair Hayri İlköğretim Okulu			100%
21.	Elazığ- Merkez	Eğitim Hizmetleri	Dumlupınar İlköğretim Okulu			100%
22.	Elazığ- Merkez	Eğitim Hizmetleri	Selçuklular İlköğretim Okulu	İl Özel İdaresi	70.446,00	100%
23.	Elazığ- Merkez	Eğitim Hizmetleri	Gazi İlköğretim Okulu			100%
24.	Elazığ- Merkez	Eğitim Hizmetleri	Fatih Mehmet İlköğretim Okulu			100%
25.	Elazığ- Kovancılar İlçesi	Eğitim Hizmetleri	Mimar Sinan YİBO - Palu YİBO	İl Özel İdaresi	50.995,74	100%
26.	Elazığ- Karakoçan İlçesi	Eğitim Hizmetleri	YİBO	İl Özel İdaresi	377.040,78	100%
27.	Elazığ- Merkez	Eğitim Hizmetleri	Yünlüce İlköğretim Okulu	İl Özel İdaresi	39.127,88	100%
28.	Elazığ- Maden İlçesi	Eğitim Hizmetleri	Merkez Murat ve Aydın Arslan İlköğretim Okulu	İl Özel İdaresi	77.328,93	100%
29.	Elazığ- Merkez	Eğitim Hizmetleri	Yurtbaşı İlköğretim Okulu	İl Özel İdaresi	0,00	100%
30.	Elazığ- Merkez	Eğitim Hizmetleri	Fevzi Çakmak İlköğretim Okulu Ve Elazığ İlköğretim Okulu	İl Özel İdaresi	85.159,07	100%
31.	Elazığ- Merkez	Eğitim Hizmetleri	Av.İbrahim Gök İlköğretim Okulu	İl Özel İdaresi	99.651,00	100%
32.	Elazığ- Merkez	Eğitim Hizmetleri	Yünlüce İlköğretim Okulu	İl Özel İdaresi	39.127,06	100%
33.	Elazığ- Karakoçan İlçesi	Eğitim Hizmetleri	Başyurt İlköğretim Okulu	İl Özel İdaresi	151.288,64	100%
34.	Elazığ- Merkez	Eğitim Hizmetleri	Yazıkonak Anaokulu	İl Özel İdaresi	11.505,00	100%
35.	Elazığ- Merkez	Eğitim Hizmetleri	Atatürk Anaokulu ve Kadir Gökalp Anaokulu (Paket)	İl Özel İdaresi	44.777,61	100%
36.	Elazığ- Merkez	Eğitim Hizmetleri	Gazi Yıldızbağları Anaokulu (Paket)	İl Özel İdaresi	36.795,86	100%
37.	Elazığ- Merkez	Eğitim Hizmetleri	Elazığ Anaokulu	İl Özel İdaresi	0,00	Yer Teslimi Yapıldı

İli Elazığ
İlçesi Merkez ve İlçeler
Yatırımcı İl Milli Eğitim Müdürlüğü

S.No	Yeri	Sektörü	Yatırımın Adı	Bütçe Türü	Harcama Tutarı	Gerçekleşme
38.	Elazığ- Sivrice İlçesi	Eğitim Hizmetleri	Sivrice İlköğretim Okulu	İl Özel İdaresi	575.000,00	100%
39.	Elazığ- Karakoçan İlçesi	Eğitim Hizmetleri	YİBO Lojmanı	İl Özel İdaresi	105.042,69	100%
40.	Elazığ- Alacakaya İlçesi	Eğitim Hizmetleri	Merkez İlköğretim Okulu	İl Özel İdaresi	0,00	İhale Aşamasında
41.	Elazığ- Merkez	Eğitim Hizmetleri	Salkaya İlköğretim Okulu	İl Özel İdaresi	0,00	Yer Teslimi Yapıldı.
42.	Elazığ- Arıcak İlçesi	Eğitim Hizmetleri	Yaylabaşı İlköğretim Okulu	İl Özel İdaresi	0,00	Yer Teslimi Yapıldı.
43.	Elazığ- Merkez	Eğitim Hizmetleri	Kanuni Sultan Süleyman İlköğretim Okulu	İl Özel İdaresi	0,00	Yer Teslimi Yapıldı.
44.	Elazığ- Karakoçan İlçesi	Eğitim Hizmetleri	Bulgurcuk İlköğretim Okulu	İl Özel İdaresi	0,00	İhale Aşamasında
45.	Elazığ- Maden İlçesi	Eğitim Hizmetleri	Atatürk İlköğretim Okulu	İl Özel İdaresi	0,00	Yer Teslimi Yapıldı.
46.	Elazığ- Merkez	Eğitim Hizmetleri	Bahçelievler İlköğretim Okulu	İl Özel İdaresi	0,00	Yer Teslimi Yapıldı.
47.	Elazığ- Palu İlçesi	Eğitim Hizmetleri	YİBO Pansiyon	İl Özel İdaresi	0,00	İhale Aşamasında
48.	Elazığ- Merkez	Eğitim Hizmetleri	Yolüstü İlköğretim Okulu -Korucu Yurtbaşı Gurbet Mezrası	İl Özel İdaresi	0,00	İhale Aşamasında
49.	Elazığ- Baskil İlçesi	Eğitim Hizmetleri	Mustafa Bilbay İlköğretim Okulu	İl Özel İdaresi	0,00	İhale Aşamasında
50.	Elazığ- Merkez	Eğitim Hizmetleri	Şair Hayri İlköğretim Okulu	İl Özel İdaresi	0,00	İhale Aşamasında
51.	Elazığ- Palu İlçesi	Eğitim Hizmetleri	Palu Anaokulu	İl Özel İdaresi	0,00	İhale Aşamasında
52.	Elazığ- Karakoçan İlçesi	Eğitim Hizmetleri	Karakoçan 200 Öğrenci Kapasiteli Öğrenci Yurdu	İl Özel İdaresi	1.502.647,66	50%
53.	Elazığ- Karakoçan İlçesi	Eğitim Hizmetleri	Karakoçan Anadolu Lisesi	İl Özel İdaresi	0,00	İhale Aşamasında
54.	Elazığ- Merkez	Eğitim Hizmetleri	Merkez DAP Ortaöğretim Pansiyon	İl Özel İdaresi	0,00	Yer Teslimi Yapıldı.
55.	Elazığ- Merkez	Eğitim Hizmetleri	Spor Lisesi Spor Salonu	İl Özel İdaresi	453.431,00	99%
56.	Elazığ- Alacakaya İlçesi	Eğitim Hizmetleri	Alacakaya Mermer Cemil Yaşlı Lisesi	İl Özel İdaresi	76.051,00	100%
57.	Elazığ- Merkez	Eğitim Hizmetleri	Elazığ Lisesi	İl Özel İdaresi	96.983,74	100%
58.	Elazığ- Merkez	Eğitim Hizmetleri	Atatürk Lisesi (Paket)	İl Özel İdaresi	109.622,00	100%
59.	Elazığ- Merkez	Eğitim Hizmetleri	Gazi Lisesi (Paket)			100%
60.	Elazığ- Merkez	Eğitim Hizmetleri	Cumhuriyet Lisesi (Paket)			100%
61.	Elazığ- Merkez	Eğitim Hizmetleri	Koloğlu Anadolu Lisesi	İl Özel İdaresi	18.998,00	100%
62.	Elazığ- Maden İlçesi	Eğitim Hizmetleri	Maden Lesesi	İl Özel İdaresi	19.470,00	100%
63.	Elazığ- Palu İlçesi	Eğitim Hizmetleri	Palu Lisesi	İl Özel İdaresi	22.939,20	100%
64.	Elazığ- Merkez	Eğitim Hizmetleri	Cumhuriyet Anadolu Lisesi	İl Özel İdaresi	6.726,00	100%
65.	Elazığ- Merkez	Eğitim Hizmetleri	Hazar Lisesi	İl Özel İdaresi	10.300,00	100%
66.	Elazığ- Merkez	Eğitim Hizmetleri	Öğretmen Sıdıka Avar Kız Meslek Lisesi	İl Özel İdaresi	160.064,64	100%
67.	Elazığ- Merkez	Eğitim Hizmetleri	100. Yıl Endüstri Meslek Lisesi	İl Özel İdaresi	68.535,00	100%
68.	Elazığ- Merkez	Eğitim Hizmetleri	Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi	İl Özel İdaresi	107.455,07	100%
69.	Elazığ- Palu İlçesi	Eğitim Hizmetleri	Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi	İl Özel İdaresi	77.484,33	100%
70.	Elazığ- Merkez	Eğitim Hizmetleri	Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi	İl Özel İdaresi	46.229,22	100%
71.	Elazığ- Merkez	Eğitim Hizmetleri	Halk Eğitim Merkezi	İl Özel İdaresi	31.894,11	100%
72.	Elazığ- Palu İlçesi	Eğitim Hizmetleri	Halk Eğitim Merkezi	İl Özel İdaresi	0,00	100%
73.	Elazığ- Merkez	Eğitim Hizmetleri	Eğitim ve Uygulama İş Eğitim Merkezi	İl Özel İdaresi	54.464,19	100%
74.	Elazığ- Merkez	Eğitim Hizmetleri	Sağlık Meslek Lisesi	İl Özel İdaresi	7.670,00	100%
75.	Elazığ- Merkez	Eğitim Hizmetleri	İmam Hatip Lisesi	İl Özel İdaresi	99.631,05	100%

İli Elazığ
İlçesi Merkez ve İlçeler
Yatırımcı İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü

Sıra No	Yeri	Sektörü	Yatırımın Adı	Bütçe Türü	Proje Tutarı	Harcama Tutarı	Gerçekleşme
1.	Çocuk Evleri	Sosyal Hizmetler	Hizmet Alımları	İl Özel İdare	10.000,00	5.250,00	55%
2.	Çocuk Evleri	Sosyal Hizmetler	Mal Alımları	İl Özel İdare	22.000,00	21.747,00	100%
3.	Beyyurdu Bak. Reh. Ve ADM Müd-Hazar Baba Bak. Reh. Mrk. Müd.	Sosyal Hizmetler	Mal Alımları	Genel İdare	275.982,07	43.912,44	Proje Devam Etmektedir.
4.	Harput Yetiştirme Yurdu	Sosyal Hizmetler	Bina Onarımı	Genel İdare	1.174,00	0,00	Proje Devam Etmektedir.
5.	Çocuk ve Gençlik Merkezi	Sosyal Hizmetler	Spor Sahası Yapımı	Genel İdare	90.000,00	0,00	Proje Devam Etmektedir.
6.	Hazar Baba Bak. Reh. Merkezi	Sosyal Hizmetler	Onarım	Genel İdare	3.850,71	0,00	Proje Devam Etmektedir.
7.	Harput Yetiştirme Yurdu	Sosyal Hizmetler	Onarım	Genel İdare	70.240,36	0,00	Proje Devam Etmektedir.
8.	Hazar Baba Bak. Reh. Merkezi	Sosyal Hizmetler	Kira Bedeli	İl Özel İdare	10.000,00	0,00	Proje Devam Etmektedir.
9.	Beyyurdu Bak. Reh. Ve ADM	Sosyal Hizmetler	İnşaat Yapımı	Genel İdare	444.513,74	0,00	Proje Devam Etmektedir.
10.	Beyyurdu Bak. Reh. Ve ADM	Sosyal Hizmetler	Onarım	Genel İdare	2.308,60	0,00	Proje Devam Etmektedir.

İli Elazığ
İlçesi Merkez ve İlçeler
Yatırımcı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

Sıra No	Yeri	Sektörü	Yatırımın Adı	Bütçe Türü	Harcama Tutarı	Gerçekleşme
1.	Elazığ	Gençlik ve Spor Hizmetleri	Trafo Yapımı	İl Özel İdaresi	35.000,00	100%
	Toplam				**35.000,00**	

İli Elazığ
İlçesi Merkez ve İlçeler
Yatırımcı İl Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü

Sıra No	Yeri	Sektörü	Yatırımın Adı	Bütçe Türü	Harcama Tutarı
1.	Elazığ	Kültür Hizmetleri	Elazığ İli Tanıtım Amaçlı Çanta Afiş Broşür Yaptırılması	İl Özel İdaresi	94.089,99
2.	Elazığ	Kültür Hizmetleri	EMİTT 2011 Fuarı, İstanbul Yemek Fuarı, Ankara Fuarı Katılımı	İl Özel İdaresi	36.991,51
	Toplam				**131.081,50**








T.C. BAŞBAKANLIK
TOKİ
TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI
150 GÜNDE 577
KONUT BİTİRDİK
Çelikler

İli Elazığ
İlçesi Merkez
Yatırımcı İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü

S.No	Yeri	Sektörü	Yatırım Adı	Düşünceler
1	Merkez İlçeler	Kentsel İyileştirme	Köy Gelişim Alanı Tahsisi	201 yılı içerisinde Elazığ - Merkez ve İlçelerde 10 adet Köy yerleşim planı yapılmıştır. Köy Gelişme Alanı için 6 adet müracaat yapılmış olup, çalışmaları devam etmektedir. Elazığ Geneli Çevre Düzeni Planı çalışmaları ihale aşamasına gelmiştir.
2	Merkez İçeler	Ruhsatlandırma	Denetim-Kum Ocağı	2010 yılı içerisinde 9 adet yeni ocak ruhsatı verilmiş olup, yeni mürcaat 42, kamuya ait ruhsatlı ocak sayısı 20, 2010 Yılı İçerisinde toplam 77.101,46TL İdari Para Cezası kesilmiştir.
3	Merkez İlçeler	Ruhsatlandırma	İnşaat Ruhsatı	46 adet İnşaat Ruhsatı, 6 adet Yapı Kullanım İzin Belgesi, 14 adet Ruhsata Tabi Olmayan Yapılar İçin İskan İzni verilmiştir.
4	Merkez İlçeler	Kentsel İyileştirme	Denetin-Kaçak Yapı	2010 yılı içerisinde 31 adet inşaatın inşaat ruhsatı olmadığından Kaçak Yapı Tatil Tutanağı tutulmuş olup, 31 adet kaçak yapı için toplam 67.249,11TL Kaçak yapı Para Cezası uygulanmıştır. 6 adet ruhsatsız yapı için gerekli tebliğat yapılmıştır. 6 adet Yapı Tatil Tutanağı tutulmuştur.
5	Merkez İlçeler	Ruhsatlandırma	Denetim-GSM	2010 Yılı içerisinde 264 adet Sıhhi Müessese denetlenmiş olup, 240 sı uygun uygun 22 'ı uygun olmadığı, 238 adet Gayri Sihhi Müessese denetlenmiş 219 uygun, 20 uygun olmadığı görülmüştür. Toplam Müessese sayısı 313 adettir.

İli Elazığ
İlçesi Merkez
Yatırımcı İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü

S.No	Yeri	Sektörü	Yatırım Adı	Bütçe Türü	Proje Tutarı	Harcama Tutarı	Gerçekleşme	Düşünceler
1.	Elazığ Merkez	Hizmet Binası	Hükümet Binası Bakım Onarım	Genel İdare	80.000,00	80.000,00	100%	Proje Tamamlanmıştır.
2.	Elazığ Maden	Hizmet Binası	Maden Kaymakamlık Lojman Yapımı	Genel İdare	250.000,00	250.000,00	80%	Proje Devam Etmektedir.
3.	Elazığ Merkez	Spor Hizmetleri	Halı Saha Yapım İşi	İl Özel İdaresi	60.000,00			Proje Devam Etmektedir.
4.	Elazığ Merkez	Eğitim Hizmetleri	Anaokulu Yapım İşi	Genel İdare	50.000,00			Arsa Tahsis çalışmaları devam ediyor
5.	Elazığ Merkez	Sosyal Hizmetler	Harput Yetiştirme Yurdu Onarım İşi	Genel İdare	70.240,36	70.240,36	100%	Proje Tamamlanmıştır.

2010 YILI YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN
(AFET KONUT, ALTYAPI VE AFET ÖNLEM) İŞLERİNE AİT CETVELİ

İLİ	ELAZIĞ	YAPIM YÖNTEMİ	Anahtar Teslim Götürü Bedeli İnşaat Yapım İşi
İŞİN ADI	Palu İlçesi 1. Bölge 75 Adet Afet Konutları Yapım işi		
YÜKLENİCİNİN ADI SOYADI	Polat Kuyumculuk İnş. Gıd. İth. İhr. Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti.		
İHALE TARİHİ	07.07.2010	SÖZLEŞME TARİHİ	23.07.2010
SÖZLEŞMEYE GÖRE BİTİM TARİHİ	23.11.2010	SÜRELİ BİTİM TARİHİ	30.05.2011
İHALE TENZİLATI		KEŞİF ARTIŞ ORANI	
1.KEŞİF TUTARI		İHALE BEDELİ	5.100.000,00 TL
KEŞİF ARTIŞ TUTARI		ARTIŞIN İHALE BEDELİ	
TOPLAM KEŞİF TUTARI		TOPLAM İHALE BEDELİ	5.100.000,00 TL(KDV Hariç)
İŞİN BAŞINDAN 2010 YILI ARALIK AYI SONUNA KADAR TOPLAM HARCANAN	İHALE BEDELİ(Varsa Artış Dahil)	3.457.541,67 TL	
	KARARNAME FİYAT FARKI		
	TENZİLATA TABİ OLMAYAN MALZEME FİYAT FARKI		
	KDV	672.357,50 TL	
	TOPLAM	4.129.899,17 TL	
2011 YILI ÖDENEK İHTİYACI	İHALE BEDELİ(Varsa Artış Dahil)		
	KARARNAME FİYAT FARKI		
	TENZİLATA TABİ OLMAYAN MALZEME FİYAT FARKI		
	KDV	295.642,50 TL	
	TOPLAM	1.938.100,83 TL	
İŞİN	BİTİM TARİHİ	30.05.2011	
	GEÇİCİ KABUL TARİHİ		
	FİZİKİ GERÇEKLEŞME %80	NAKDİ GERÇEKLEŞME %68	

ELAZIĞ İLİ PALU İLÇESİ

YÜKLENİCİ : POLAT KUYUMCULUK — AYHAN POLAT

1.GRUP AFET KONUTLARI		İHALE SAYISI	YER TESLİMİ YAPILAN			İNŞAAT DURUMU		İnşaatın Tahmini Bitim Tarihi		AÇIKLAMALAR
SIRA NO	KÖYÜ		TOPLU ALAN	KENDİ YERİNDE	TOPLAM	BAŞLANILAN SAYISI	EKSİK FAZLA	BİTEN	DEVAM EDEN	
1	ÜÇDEĞİRMENLER KÖROĞLU MZ.	3		1	1	1		1	0	Teslim edildi
2	AKYÜREK	1		1	1	1		1	0	Teslim edildi
3	KARASALKIM	14		10	10	10		10	0	10 adet teslim edildi
4	GÜMÜŞKAYNAK	2		2	2	2		2	0	Teslim edildi
5	KAYAÖNÜ	15	16		16	16		16	0	Bitti
6	BALTAŞI ÇAYBAŞI MAH.	8		6	6	6		6	0	6adet teslim edildi
7	KEKLİKDERE	4		3	3	3		3	0	Teslim edildi
8	ÖRGÜLÜ	4		6	6	6		5	1	5 adet teslim edildi, 1 adet kapı takılıyor
9	CUMHURİYET	10		6	6	6		3	3	3 adet teslim edildi, 3 adet boyada
	DAMLAPINAR	11		0	0	0		0	0	Yer seçimi yapılan yere Beyhanlılar itiraz ettiğinden
10	ALTINÖLÇEK	2		2	2	2		2	0	konut yapımı başlatılamadı. Teslim edildi
11	GÖMEÇBAĞLARI	1		1	1	1		1	0	Teslim edildi
12	YK. PALU			7	7	7		6	1	6 adet teslim edildi, 1 adet kapıları takılıyor
13	KÜLTÜR			2	2	2		2	0	Teslim edildi
14	İSMETPAŞA			2	2	2		2	0	Teslim edildi
TOPLAM		75	16	49	65	65	-10	60	5	

2010 YILI YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN
(AFET KONUT, ALTYAPI VE AFET ÖNLEM) İŞLERİNE AİT CETVELİ

İLİ	ELAZIĞ	YAPIM YÖNTEMİ	
İŞİN ADI	Palu İlçesi 2. Bölge 81 Adet Afet Konutları Yapım işi		
YÜKLENİCİNİN ADI SOYADI	Ayhas İnş. San ve Tic.A.Ş.		Anahtar Teslim Götürü Bedeli İnşaat Yapım İşi
İHALE TARİHİ	07.07.2010	SÖZLEŞME TARİHİ	20.07.2010
SÖZLEŞMEYE GÖRE BİTİM TARİHİ	27.11.2010	SÜRELİ BİTİM TARİHİ	20.11.2010
İHALE TENZİLATI		KEŞİF ARTIŞ ORANI	
1.KEŞİF TUTARI		İHALE BEDELİ	5.800.000,00 TL
KEŞİF ARTIŞ TUTARI		ARTIŞIN İHALE BEDELİ	
TOPLAM KEŞİF TUTARI		TOPLAM İHALE BEDELİ	5.800.000,00 TL(KDV Hariç)
İŞİN BAŞINDAN 2010 YILI ARALIK AYI SONUNA KADAR TOPLAM HARCANAN	İHALE BEDELİ(Varsa Artış Dahil)	5,225.752,18 TL	
	KARARNAME FİYAT FARKI		
	TENZİLATA TABİ OLMAYAN MALZEME FİYAT FARKI		
	KDV	940.635,39 TL	
	TOPLAM	6.166.387,57 TL	
2011 YILI ÖDENEK İHTİYACI	İHALE BEDELİ(Varsa Artış Dahil)		
	KARARNAME FİYAT FARKI		
	TENZİLATA TABİ OLMAYAN MALZEME FİYAT FARKI		
	KDV	102.824,61 TL	
	TOPLAM	674.072,43 TL	
İŞİN	BİTİM TARİHİ	19.04.2011	
	GEÇİCİ KABUL TARİHİ		
	FİZİKİ GERÇEKLEŞME %95	NAKDİ GERÇEKLEŞME %90	

ELAZIĞ İLİ PALU İLÇESİ

YÜKLENİCİ: AYHAS İNŞ. — NİHAT AYDIN

2.GRUP AFET KONUTLARI		İHALE SAYISI	YER TESLİMİ YAPILAN			İNŞAAT DURUMU		İnşaatın Tahmini Bitim Tarihi		AÇIKLAMALAR
SIRA NO	KÖYÜ		TOPLU ALAN	KENDİ YERİNDE	TOPLAM	BAŞLANILAN SAYISI	EKSİK FAZLA	BİTEN	DEVAM EDEN	
1	ARINDIK	12		11	11	11		11	0	Tamamı bitti,3 adeti teslim edildi.
2	HASBEY	2		2	2	2		1	1	1 adet bitti, 1 ad.parke yapılıyor.
3	BEYHAN GÜNEY MAHALLESİ	45		43	43	43		41	2	9 adet teslim edildi, 30 ad. bitti, 2ad. parke yapılıyor
4	BEYHAN İSTASYON MAHALLESİ	15		20	20	20		19	1	3 adet teslim edildi, 16 ad. bitti, 1ad. parke yapılıyor
5	BEYHAN GİRNE MAHALLESİ	7		5	5	5		4	1	4 ad. Bitti, 1 ad. parke yapılıyor
TOPLAM		81		81	81	81	0	76	5	

2010 YILI YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN
(AFET KONUT, ALTYAPI VE AFET ÖNLEM) İŞLERİNE AİT CETVELİ

İLİ	ELAZIĞ	YAPIM YÖNTEMİ	Anahtar Teslim Götürü Bedeli İnşaat Yapım İşi
İŞİN ADI	Palu İlçesi 4. Bölge 77 Adet Afet Konutları Yapım işi Best Tasarım Peyzaj. İnş. Sul. İth. San. Tic. Ltd. Şti.		
İHALE TARİHİ	15.07.2010	SÖZLEŞME TARİHİ	26.07.2010
SÖZLEŞMEYE GÖRE BİTİM TARİHİ	30.11.2010	SÜRELİ BİTİM TARİHİ	30.11.2010
İHALE TENZİLATI		KEŞİF ARTIŞ ORANI	10%
1.KEŞİF TUTARI	5.380.000,00 TL	İHALE BEDELİ	5.380.000,00 TL
KEŞİF ARTIŞ TUTARI	489.090,00 TL	ARTIŞIN İHALE BEDELİ	489.090,00 TL
TOPLAM KEŞİF TUTARI	5.869.091,00 TL	TOPLAM İHALE BEDELİ	5.869.091,00 TL(KDV Hariç)
İŞİN BAŞINDAN 2010 YILI ARALIK AYI SONUNA KADAR TOPLAM HARCANAN	İHALE BEDELİ(Varsa Artış Dahil)	3.330.037,09 TL	
	KARARNAME FİYAT FARKI		
	TENZİLATA TABİ OLMAYAN MALZEME FİYAT FARKI		
	KDV	599.497,20 TL	
	TOPLAM	3.930.037,29 TL	
2011 YILI ÖDENEK İHTİYACI	İHALE BEDELİ(Varsa Artış Dahil)	2.538.551,00 TL	
	KARARNAME FİYAT FARKI		
	TENZİLATA TABİ OLMAYAN MALZEME FİYAT FARKI		
	KDV	456.939,18 TL	
	TOPLAM	2.995.490,18 TL	
İŞİN	BİTİM TARİHİ	03.06.2011	
	GEÇİCİ KABUL TARİHİ		
	FİZİKİ GERÇEKLEŞME %70	NAKDİ GERÇEKLEŞME %57	

YÜKLENİCİ: BEST TASARIM — AYHAN ÇİÇEK

ELAZIĞ İLİ PALU İLÇESİ

4.GRUP AFET KONUTLARI		İHALE SAYISI	YER TESLİMİ YAPILAN			İNŞAAT DURUMU		İnşaatın Tahmini Bitim Tarihi		AÇIKLAMALAR
SIRA NO	KÖYÜ		TOPLU ALAN	KENDİ YERİNDE	TOPLAM	BAŞLANILAN SAYISI	EKSİK FAZLA	BİTEN	DEVAM EDEN	
	KÖKLÜCE	16		0	0	0		0	0	YSP Yapılamadı.
1	AKBULUT	2		2	2	2		2	0	Yol sorunlu
2	AKBULUT Küçük Akbulut Mz.	2		2	2	2		2	0	Yol sorunlu
	BEYDOĞAN	1		0	0	0		0	0	VAZGEÇTİ
3	ATİK	6		3	3	3		3	0	Bitti
4	KÜÇÜKÇALTI	1		1	1	1		1	0	Bitti
5	GÖKDERE SİVRİKAYA	7		6	6	6		3	3	2 ad. Bitti Ahmet Oğur adında biri uygun yer gösteremedi.
6	GEMTEPE	10		9	9	9		0	9	Umut Acar uygun yer gösteremedi.Hisse problemi
7	KIRKBULAK	25		22	22	22		6	16	3 kişi ahır istiyor, 4 kişinin yer problemi var.
8	KIRKBULAK Payamlı Mz.	5		5	5	5		1	4	
9	KIRKBULAK Dutağacı Mz.	2		1	1	1		1	0	
10	**BÖLÜKELMA**			4	4	4		2	2	2 adet bitti,2 adet devam ediyor.
11	**GÜLLÜCE**			5	5	5		5	0	Bitti
12	**DOLUKÜÇÜK MZ.**			4	4	4		1	3	4 temel subasman seviyesi
13	**BEYHAN**			20	20	20		0	20	
TOPLAM		**77**	**0**	**84**	**84**	**84**	**7**	**27**	**57**	

2010 YILI YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN (AFET KONUT, ALTYAPI VE AFET ÖNLEM) İŞLERİNE AİT CETVELİ

İLİ	ELAZIĞ	YAPIM YÖNTEMİ	Anahtar Teslim Götürü Bedeli İnşaat Yapım İşi
İŞİN ADI	Karakoçan İlçesi 5. Bölge 56 Adet Afet Konutları Yapım İşi		
YÜKLENİCİNİN ADI SOYADI	FMŞ İnş. Telek. Müh. ve Turizm San. Tic.Şti.		
İHALE TARİHİ	07.07.2010	SÖZLEŞME TARİHİ	26.07.2010
SÖZLEŞMEYE GÖRE BİTİM TARİHİ	26.11.2010	SÜRELİ BİTİM TARİHİ	26.11.2010
İHALE TENZİLATI		KEŞİF ARTIŞ ORANI	7,14%
1.KEŞİF TUTARI		İHALE BEDELİ	4.108.000,00 TL
KEŞİF ARTIŞ TUTARI		ARTIŞIN İHALE BEDELİ	293.311,20 TL
TOPLAM KEŞİF TUTARI		TOPLAM İHALE BEDELİ	4.401.311,20-TL(KDV Hariç)
İŞİN BAŞINDAN 2010 YILI ARALIK AYI SONUNA KADAR TOPLAM HARCANAN	İHALE BEDELİ(Varsa Artış Dahil)	4.108.000,00 TL	
	KARARNAME FİYAT FARKI		
	TENZİLATA TABİ OLMAYAN MALZEME FİYAT FARKI		
	KDV	739.440,00 TL	
	TOPLAM	4.847.440,00 TL	3.767.064,68 TL
2011 YILI ÖDENEK İHTİYACI	İHALE BEDELİ(Varsa Artış Dahil)		
	KARARNAME FİYAT FARKI		
	TENZİLATA TABİ OLMAYAN MALZEME FİYAT FARKI		
	KDV		
	TOPLAM		1.426.482.54 TL
İŞİN	BİTİM TARİHİ	12.05.2011	
	GEÇİCİ KABUL TARİHİ		
	FİZİKİ GERÇEKLEŞME % 80	NAKDİ GERÇEKLEŞME % 78	

ELAZIĞ İLİ KARAKOÇAN İLÇESİ

YÜKLENİCİ: FMŞ İNŞ. — ALPER TUTAK

5.GRUP AFET KONUTLARI		İHALE SAYISI	YER TESLİMİ YAPILAN			İNŞAAT DURUMU		İnşaatın Tahmini Bitim Tarihi		AÇIKLAMALAR
SIRA NO	KÖYÜ		TOPLU ALAN	KENDİ YERİNDE	TOPLAM	BAŞLANILAN SAYISI	EKSİK FAZLA	BİTEN TESLİM EDİLEN	DEVAM EDEN	
1	YOĞUNAĞAÇ	4		4	4	4		0	4	2 ad.şap,boya,fayans ve parke yapılacak 2 ad. Duvar aş.
	ÇAYIRGÜLÜ	2		0	0	0		0	0	Muvafakat sorunu var. Çözülemedi.
	TEKARDIÇ	2		0	0	0		0	0	Muvafakat sorunu var. Çözülemedi.
2	ÜÇBUDAK	4		4	4	4		0	4	3 ad.şap,boya,fayans ve parke yapılacak. 1 ad. Tabliye
3	BARDAKLI	3		2	2	2		2	0	2 ad. Bitti.
4	KIRGIL	5		5	5	5		5	0	5 ad. Bitti.
5	SAĞIN	7		6	6	6		5	1	5 ad. Bitti. 1 ad. Perde aşamasında
6	BAŞYURT	4		5	5	5		4	1	4 ad. bitti, 1 ad.şap,boya,fayans ve parke yapılacak
7	GÜLLÜCE	7	9	1	10	10		7	3	1 adet teslim edildi, 6 ad. bitti, 3 ad.tabliyeyapılıyor
8	YK.OVACIK	4		1	1	1		0	1	1 ad.boya ve parke yapılacak
9	ÇANAKÇI	4	6	1	7	7		0	7	7 ad.boya,fayans ve parke yapılacak
10	MİRAHMET	4		1	1	1		0	1	1 ad.boya,fayans ve parke yapılacak
11	MAHMUTLU	3		1	1	1		0	1	1 ad.boya ve parke yapılacak
12	AŞ. OVACIK	3		3	3	3		0	3	1 ad.sıva,boya,fayans ve parke yapılacak
13	DEMİRTAŞ		11		11	11		11	0	BİTTİ
TOPLAM		56	26	34	60	60	4	34	26	

2010 YILI YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN
(AFET KONUT, ALTYAPI VE AFET ÖNLEM) İŞLERİNE AİT CETVELİ

İLİ	ELAZIĞ	YAPIM YÖNTEMİ	Anahtar Teslim Götürü Bedeli İnşaat Yapım İşi
İŞİN ADI	Karakoçan İlçesi 6. Bölge 64 Adet Afet Konutları Yapım İşi		
YÜKLENİCİNİN ADI SOYADI	HÜREL OTOMOTİV İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ		
İHALE TARİHİ	07.07.2010	SÖZLEŞME TARİHİ	20.07.2010
SÖZLEŞMEYE GÖRE BİTİM TARİHİ	20.11.2010	SÜRELİ BİTİM TARİHİ	23.04.2011
İHALE TENZİLATI		KEŞİF ARTIŞ ORANI	9,89%
1.KEŞİF TUTARI		İHALE BEDELİ	4.780.000,00 TL
KEŞİF ARTIŞ TUTARI		ARTIŞIN İHALE BEDELİ	472.903,00 TL
TOPLAM KEŞİF TUTARI		TOPLAM İHALE BEDELİ	5.252.903,00-TL(KDV Hariç)
İŞİN BAŞINDAN 2010 YILI ARALIK AYI SONUNA KADAR TOPLAM HARCANAN	İHALE BEDELİ(Varsa Artış Dahil)	4.473.473,28 TL	
	KARARNAME FİYAT FARKI		
	TENZİLATA TABİ OLMAYAN MALZEME FİYAT FARKI		
	,	805.225,19 TL	
	TOPLAM	5.278.698,47 TL	
2011 YILI ÖDENEK İHTİYACI	İHALE BEDELİ(Varsa Artış Dahil)	779.429,72 TL	
	KARARNAME FİYAT FARKI		
	TENZİLATA TABİ OLMAYAN MALZEME FİYAT FARKI		
	KDV	140.297,35 TL	
	TOPLAM	919.727,07 TL	
İŞİN	BİTİM TARİHİ	23.04.2011	
	GEÇİCİ KABUL TARİHİ		
	FİZİKİ GERÇEKLEŞME %90	NAKDİ GERÇEKLEŞME %85,16	

YÜKLENİCİ: HÜREL OTOMOTİV — MURAT AÇIKKAPI

ELAZIĞ İLİ KARAKOÇAN İLÇESİ

6.GRUP AFET KONUTLARI		İHALE SAYISI	YER TESLİMİ YAPILAN			İNŞAAT DURUMU		İnşaatın Tahmini Bitim Tarihi		AÇIKLAMALAR
SIRA NO	KÖYÜ		TOPLU ALAN	KENDİ YERİNDE	TOPLAM	BAŞLANILAN SAYISI	EKSİK FAZLA	BİTEN TESLİM EDİLEN	DEVAM EDEN	
1	ALTINOLUK	15	5	0	5	5		1	4	1 adet teslim edildi,4 ad.iç ve dış sıva bitti.
	SARICAN	1				0		0	0	Sorunlu,mülkiyet problemi çözülemedi.
2	ÇAYIRDAM	6		5	5	5		2	3	2 adet bitti, 3 ad.çatı ve duvar bitti.
3	SOĞUCAK	10	13	1	14	14		12	2	12 adet teslim edildi, 2ad.çatı, duvar ve sıva bitti.
4	BULGURCUK	4	9	1	10	10		0	10	10 ad.çatı, duvar bitti.
5	KULUNDERE	2		2	2	2		2	0	2 adet bitti.
6	DEMİRTEPE	3		2	2	2		2	0	2 adet bitti.
7	GÖZEREK	9	16		16	16		16	0	16 adet bitti.
8	BAHÇECİK	4		6	6	6		4	2	4 adet bitti, 2 ad.çatı, duvar ve sıva bitti.
9	YENİKÖY	9		9	9	9		8	1	8 adet bitti, 1ad.çatı, duvar bitti.
10	YENİKÖY KENGERLİ MZ.	1		1	1	1		1	0	1 adet bitti.
TOPLAM		64	43	27	70	70	6	48	22	

2010 YILI YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN
(AFET KONUT, ALTYAPI VE AFET ÖNLEM) İŞLERİNE AİT CETVELİ

İLİ	ELAZIĞ	YAPIM YÖNTEMİ	Anahtar Teslim Götürü Bedeli İnşaat Yapım İşi
İŞİN ADI	Karakoçan İlçesi 7. Bölge 52 Adet Afet Konutları Yapım İşi		
YÜKLENİCİNİN ADI SOYADI	TETİŞ YAPI İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ		
İHALE TARİHİ	07.07.2010	SÖZLEŞME TARİHİ	26.07.2010
SÖZLEŞMEYE GÖRE BİTİM TARİHİ	27.11.2010	SÜRELİ BİTİM TARİHİ	27.11.2010
İHALE TENZİLATI		KEŞİF ARTIŞ ORANI	
1.KEŞİF TUTARI		İHALE BEDELİ	3.975.000,00 TL
KEŞİF ARTIŞ TUTARI		ARTIŞIN İHALE BEDELİ	
TOPLAM KEŞİF TUTARI		TOPLAM İHALE BEDELİ	3.975.000,00 TL(KDV Hariç)
İŞİN BAŞINDAN 2010 YILI ARALIK AYI SONUNA KADAR TOPLAM HARCANAN	İHALE BEDELİ(Varsa Artış Dahil)	3.766.834,46 TL	
	KARARNAME FİYAT FARKI		
	TENZİLATA TABİ OLMAYAN MALZEME FİYAT FARKI		
	KDV	678.030,20 TL	
	TOPLAM	4.444.864,66 TL	
2011 YILI ÖDENEK İHTİYACI	İHALE BEDELİ(Varsa Artış Dahil)		
	KARARNAME FİYAT FARKI		
	TENZİLATA TABİ OLMAYAN MALZEME FİYAT FARKI		
	KDV	37.469,80 TL	
	TOPLAM	245.635,34 TL	
İŞİN	BİTİM TARİHİ	30.11.2010	
	GEÇİCİ KABUL TARİHİ		
	FİZİKİ GERÇEKLEŞME %98	NAKDİ GERÇEKLEŞME %95	

YÜKLENİCİ: TETİŞ İNŞ. YILMAZ TETİK

ELAZIĞ İLİ KARAKOÇAN İLÇESİ

7.GRUP AFET KONUTLARI		İHALE SAYISI	YER TESLİMİ YAPILAN			İNŞAAT DURUMU		İnşaatın Tahmini Bitim Tarihi		AÇIKLAMALAR
SIRA NO	KÖYÜ		TOPLU ALAN	KENDİ YERİNDE	TOPLAM	BAŞLANILAN SAYISI	EKSİK FAZLA	BİTEN	DEVAM EDEN	
1	AKYOKUŞ	5	6		6	6		6	0	Bitti.
2	İSABEY	9	9		9	9		9	0	Bitti.İçmesuyu 2011 de yapılacak. Kışın taşınmak
3	DEVECİ	5		5	5	5		5	0	istemiyorlar. Bitti.
4	KUŞÇU	15	3	10	13	13		13	0	4 adet teslim edildi, 9 ad. bitti,
5	KÖRYUSUF	2		1	1	1		1	0	1 adet teslim edildi.
6	CUMHURİYET	3	3		3	3		3	0	2 adet teslim edildi, 1 ad. bitti,
7	AKBULAK	4		2	2	2		2	0	Bitti.
8	KÜMBET	2	2		2	2		2	0	Bitti.
9	MAKSUTALİ	7	6		6	6		6	0	Bitti.
10	KARŞIYAKA			2	2	2		2	0	Bitti.
11	YENİMAHALLE			1	1	1		1	0	Bitti.
12	DURMUŞ			1	1	1		1	0	1 adet teslim edildi.
TOPLAM		52	29	22	51	51	-1	51	0	

2010 YILI YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN
(AFET KONUT, ALTYAPI VE AFET ÖNLEM) İŞLERİNE AİT CETVELİ

İLİ	ELAZIĞ		YAPIM YÖNTEMİ	Anahtar Teslim Götürü Bedeli İnşaat Yapım İşi
İŞİN ADI	Karakoçan İlçesi 8. Bölge 54 Adet Afet Konutları Yapım İşi			
YÜKLENİCİNİN ADI SOYADI	Tetiş Yapı İnş . San.ve Tic.Ltd.Şti.-Erhan ÖZHAN İnş.Müh.Ortak Girişim			
İHALE TARİHİ	15.07.2010	SÖZLEŞME TARİHİ		28.07.2010
SÖZLEŞMEYE GÖRE BİTİM TARİHİ	28.11.2010	SÜRELİ BİTİM TARİHİ		28.11.2010
İHALE TENZİLATI		KEŞİF ARTIŞ ORANI		
1.KEŞİF TUTARI		İHALE BEDELİ		3.368.000,00-TL
KEŞİF ARTIŞ TUTARI		ARTIŞIN İHALE BEDELİ		
TOPLAM KEŞİF TUTARI		TOPLAM İHALE BEDELİ		3.368.000,00-TL(KDV Hariç)
İŞİN BAŞINDAN 2010 YILI ARALIK AYI SONUNA KADAR TOPLAM HARCANAN	İHALE BEDELİ(Varsa Artış Dahil)	3.368.000,00 TL		
	KARARNAME FİYAT FARKI			
	TENZİLATA TABİ OLMAYAN MALZEME FİYAT FARKI			
	KDV	606.240,00 TL		
	TOPLAM	3.974.240,00 TL		2.654.087,25 TL
2011 YILI ÖDENEK İHTİYACI	İHALE BEDELİ(Varsa Artış Dahil)			
	KARARNAME FİYAT FARKI			
	TENZİLATA TABİ OLMAYAN MALZEME FİYAT FARKI			
	KDV			
	TOPLAM			1.320.152,75 TL
İŞİN	BİTİM TARİHİ	20.05.2011		
	GEÇİCİ KABUL TARİHİ			
	FİZİKİ GERÇEKLEŞME % 66	NAKDİ GERÇEKLEŞME %66		

YÜKLENİCİ: ERHAN ÖZHAN — YILMAZ TETİK

ELAZIĞ İLİ KARAKOÇAN İLÇESİ

8.GRUP AFET KONUTLARI		İHALE SAYISI	YER TESLİMİ YAPILAN			İNŞAAT DURUMU		İnşaatın Tahmini Bitim Tarihi		AÇIKLAMALAR
SIRA NO	KÖYÜ		TOPLU ALAN	KENDİ YERİNDE	TOPLAM	BAŞLANILAN SAYISI	EKSİK FAZLA	BİTEN TESLİM EDİLEN	DEVAM EDEN	
1	OKÇULAR	14		6	6	6		5	1	5 ad. Bitti,1 ad. Devam ediyor.
2	KIZILCA	15		15	15	15		12	3	12 adet bitti, 3 ad.çatı, duvar ve sıva bitti.
	HAMZALI	1		0	0	0		0	0	Varisli hisseli, hissedarlar yurtdışında, köyde oturmuyor.
3	YALINTAŞ	4		4	4	4		4	0	Bitti
4	YALINTAŞ SARICEVİZ MZ.	3		3	3	3		3	0	Bitti
5	AKARBAŞI	6		2	2	2		2	0	Bitti
6	AKARBAŞI ELİF YAYLASI MZ.	2		2	2	2		2	0	Bitti
7	KOÇYİĞİTLER	2		2	2	2		2	0	Bitti
	AKKUŞ	5		0	0	0		0	0	Yer seçimi ve muvafakat sorunu var.
	PAMUKLU	1		0	0	0		0	0	Yer seçimi ve muvafakat sorunu var.
8	BALCALI	2		2	2	2		2	0	Bitti
	BALCALI DEĞİRMENDÜZÜ MZ.	2		0	0	0		0	0	Yer seçimi ve muvafakat sorunu var.
9	YENİKAYA			9	9	9		0	9	Don oluştuğundan alçı yapılamıyor.
TOPLAM		57	0	45	45	45	-12	32	13	

2010 YILI YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN
(AFET KONUT, ALTYAPI VE AFET ÖNLEM) İŞLERİNE AİT CETVELİ

İLİ	ELAZIĞ	YAPIM YÖNTEMİ	Anahtar Teslim Götürü Bedeli İnşaat Yapım İşi
İŞİN ADI	Karakoçan İlçesi 9. Bölge 27 Adet Afet Konutları Yapım İşi		
YÜKLENİCİNİN ADI SOYADI	Ali Akın Nevruz İnş . Müh		
İHALE TARİHİ	07.07.2010	SÖZLEŞME TARİHİ	27.07.2010
SÖZLEŞMEYE GÖRE BİTİM TARİHİ	30.11.2010	SÜRELİ BİTİM TARİHİ	19.06.2011
İHALE TENZİLATI		KEŞİF ARTIŞ ORANI	4,24%
1.KEŞİF TUTARI	1.971.000,00 TL	İHALE BEDELİ	1.971.000,00-TL
KEŞİF ARTIŞ TUTARI	83.696,67	ARTIŞIN İHALE BEDELİ	83.696,67
TOPLAM KEŞİF TUTARI	2.054.696,67 TL (KDV Hariç)	TOPLAM İHALE BEDELİ	2.054.696,67 TL(KDV Hariç)
İŞİN BAŞINDAN 2010 YILI ARALIK AYI SONUNA KADAR TOPLAM HARCANAN	İHALE BEDELİ(Varsa Artış Dahil)	652.922,90-TL	
	KARARNAME FİYAT FARKI		
	TENZİLATA TABİ OLMAYAN MALZEME FİYAT FARKI		
	KDV	117.526,12 TL	
	TOPLAM	770.449,02 TL	
2011 YILI ÖDENEK İHTİYACI	İHALE BEDELİ(Varsa Artış Dahil)		
	KARARNAME FİYAT FARKI		
	TENZİLATA TABİ OLMAYAN MALZEME FİYAT FARKI		
	KDV	252.319,28 TL	
	TOPLAM	1.654.093,05 TL	
İŞİN	BİTİM TARİHİ	19.06.2011	
	GEÇİCİ KABUL TARİHİ		
	FİZİKİ GERÇEKLEŞME %35	NAKDİ GERÇEKLEŞME %32	

YÜKLENİCİ: ALİ AKIN NEVRUZ

ELAZIĞ İLİ KARAKOÇAN İLÇESİ

9.GRUP AFET KONUTLARI		İHALE SAYISI	YER TESLİMİ YAPILAN			İNŞAAT DURUMU		İnşaatın Tahmini Bitim Tarihi		AÇIKLAMALAR
SIRA NO	KÖYÜ		TOPLU ALAN	KENDİ YERİNDE	TOPLAM	BAŞLANILAN SAYISI	EKSİK FAZLA	BİTEN	DEVAM EDEN	
	KOCADAYI	4			0	0		0	0	Mağdur ve çadırda kalan yok, geneli il dışında olup yazlıkçı, yol problemindes
	PİLAVTEPE	1			0	0		0	0	Muvafakat ve YSP problemi var.
	ÇITAK	14			0	0		0	0	Muvafakat ve YSP problemi var.
	BAZLAMA	2			0	0		0	0	Muvafakat ve YSP problemi var.
	KARAPINAR	1			0	0		0	0	Muvafakat ve YSP problemi var.
	GÜNDEĞDİ	1			0	0		0	0	Muvafakat ve YSP problemi var.
	KARAKOÇAN	4			0	0		0	0	Muvafakat ve YSP problemi var.
1	KIZILPINAR		14		14	14		0	14	9 ad. Duvar örüldü, 3 ad. Kaba sıva bitti, 2 ad.
2	KIZILPINAR İNCELER MEZRASI		4		4	4		0	4	Subasman seviyesinde 4 ad. Subasman seviyesinde
3	KIZILPINAR TATLICA MEZRASI		5		5	5		0	5	3 ad. Duvar örüldü, 2 ad. Tabliye döküldü
4	BAŞYURT			3	3	3		0	3	Temel seviyesinde
5	KIRGIL			1	1	1		0	1	Duvar ve çatı bitti.
TOPLAM		27	23	4	27	27	0	0	27	

2010 YILI YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN
(AFET KONUT, ALTYAPI VE AFET ÖNLEM) İŞLERİNE AİT CETVELİ

İLİ	**ELAZIĞ**	YAPIM YÖNTEMİ	**Anahtar Teslim Götürü Bedeli İnşaat Yapım İşi**
İŞİN ADI	**Kovancılar İlçesi 10 Bölge 56 Adet Afet Konutları Yapım İşi**		
YÜKLENİCİNİN ADI SOYADI	**Erme İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti**		
İHALE TARİHİ	**07.07.2010**	SÖZLEŞME TARİHİ	**27.07.2010**
SÖZLEŞMEYE GÖRE BİTİM TARİHİ	**27.11.2010**	SÜRELİ BİTİM TARİHİ	**30.04.2011**
İHALE TENZİLATI		KEŞİF ARTIŞ ORANI	**5,36%**
1.KEŞİF TUTARI		İHALE BEDELİ	**4.150.000,00 TL**
KEŞİF ARTIŞ TUTARI		ARTIŞIN İHALE BEDELİ	**222.321,43 TL**
TOPLAM KEŞİF TUTARI		TOPLAM İHALE BEDELİ	**4.372.321,43 TL(KDV Hariç)**
İŞİN BAŞINDAN 2010 YILI ARALIK AYI SONUNA KADAR TOPLAM HARCANAN	İHALE BEDELİ(Varsa Artış Dahil)	**4.014.388,91 TL**	
	KARARNAME FİYAT FARKI		
	TENZİLATA TABİ OLMAYAN MALZEME FİYAT FARKI		
	KDV	**722.590,00 TL**	
	TOPLAM	**4.736.978,91 TL**	
2011 YILI ÖDENEK İHTİYACI	İHALE BEDELİ(Varsa Artış Dahil)	**353.491,07 TL**	
	KARARNAME FİYAT FARKI		
	TENZİLATA TABİ OLMAYAN MALZEME FİYAT FARKI		
	KDV	**63.628,40 TL**	
	TOPLAM	**417.119,47 TL**	
İŞİN	BİTİM TARİHİ	**30.04.2011**	
	GEÇİCİ KABUL TARİHİ		
	FİZİKİ GERÇEKLEŞME %97	**NAKDİ GERÇEKLEŞME %92**	

YÜKLENİCİ: ERME İNŞ. — **İLHAMİ KÜÇÜK**

10.GRUP AFET KONUTLARI

ELAZIĞ İLİ KOVANCILAR İLÇESİ

SIRA NO	KÖYÜ	İHALE SAYISI	YER TESLİMİ YAPILAN			İNŞAAT DURUMU		İnşaatın Tahmini Bitim Tarihi		AÇIKLAMALAR
			TOPLU ALAN	KENDİ YERİNDE	TOPLAM	BAŞLANILAN SAYISI	EKSİK FAZLA	BİTEN	DEVAM EDEN	
1	ÇATAKBAŞI	2		1	1	1		0	1	Kapı ve mutfak dolabı takılıyor.
2	FAHRİBEY MEZRASI	2		2	2	2		2	0	Bitti.
3	KAÇAR	1		1	1	1		0	1	Kapı ve mutfak dolabı takılıyor.
	ÇAYBAĞI	1		0	0	0		0	0	Muvafakat sorunu var.
	SALKIMLI	1		0	0	0		0	0	Kapı ve mutfak dolabı takılıyor.
4	EKİNBAĞI	1		1	1	1		0	1	Kapı ve mutfak dolabı takılıyor.
5	HACIMEKKE	4		3	3	3		3	0	Bitti.
6	AVLAĞI	11		11	11	11		11	0	Bitti.
7	İĞDELİ	3		3	3	3		3	0	Bitti.
8	İĞDELİ SÜTPINARI MZ.	3	6		6	6		6	0	Bitti.
9	KUŞÇU	14	12	2	14	14		14	0	Bitti.Kuralar çekildi.
10	KUŞÇU ARILAR MZ.	5	8		8	8		8	0	Bitti.Kuralar çekildi.
	YUKARIKAZAN	2		0	0	0		0	0	Muvafakat sorunu var.
11	ÇELEBİ	1	0		0	0		0	0	Toplu alan seçildi. İtirazdan 30 35 civarı gelebilir. 50 itiraz var. Yer
12	MURATBAĞI	3		3	3	3		3	0	Bitti.
13	UZUNOVA	2		2	2	2		0	2	Kapı ve mutfak dolabı takılıyor.
14	AŞ.YK KÖSE			4	4	4		0	4	Kapı ve mutfak dolabı takılıyor.
TOPLAM		**56**	**26**	**33**	**59**	**59**	**3**	**50**	**9**	

2010 YILI YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN
(AFET KONUT, ALTYAPI VE AFET ÖNLEM) İŞLERİNE AİT CETVELİ

İLİ	**ELAZIĞ**	YAPIM YÖNTEMİ	**Anahtar Teslim Götürü Bedeli İnşaat Yapım İşi**
İŞİN ADI	**Kovancılar İlçesi 11. Bölge 54 Adet Afet Konutları Yapım İşi**		
YÜKLENİCİNİN ADI SOYADI	**Özyapıcılar İnş. San. Ltd.Şti.**		
İHALE TARİHİ	**07.07.2010**	SÖZLEŞME TARİHİ	**20.07.2010**
SÖZLEŞMEYE GÖRE BİTİM TARİHİ	**20.11.2010**	SÜRELİ BİTİM TARİHİ	**17.01.2011**
İHALE TENZİLATI		KEŞİF ARTIŞ ORANI	
1.KEŞİF TUTARI		İHALE BEDELİ	**3.970.000,00 TL**
KEŞİF ARTIŞ TUTARI		ARTIŞIN İHALE BEDELİ	
TOPLAM KEŞİF TUTARI		TOPLAM İHALE BEDELİ	**3.970.000,00 TL(KDV Hariç)**
İŞİN BAŞINDAN 2010 YILI ARALIK AYI SONUNA KADAR TOPLAM HARCANAN	İHALE BEDELİ(Varsa Artış Dahil)	**3.490.693,49 TL**	
	KARARNAME FİYAT FARKI		
	TENZİLATA TABİ OLMAYAN MALZEME FİYAT FARKI		
	KDV	**626.324.83 TL**	
	TOPLAM	**4.117.018,32 TL**	
2011 YILI ÖDENEK İHTİYACI	İHALE BEDELİ(Varsa Artış Dahil)	**479.306,51 TL**	
	KARARNAME FİYAT FARKI		
	TENZİLATA TABİ OLMAYAN MALZEME FİYAT FARKI		
	KDV	**86.275,17 TL**	
	TOPLAM	**565.581,68**	
İŞİN	BİTİM TARİHİ	**17.01.2011**	
	GEÇİCİ KABUL TARİHİ		
	FİZİKİ GERÇEKLEŞME %100	**NAKDİ GERÇEKLEŞME %87,93**	

ELAZIĞ KOVANCILAR İLÇESİ

YÜKLENİCİ: ÖZYAPICILAR İNŞ. — AHMET KORKMAZ

11.GRUP AFET KONUTLARI		İHALE SAYISI	YER TESLİMİ YAPILAN			İNŞAAT DURUMU		İnşaatın Tahmini Bitim Tarihi		AÇIKLAMALAR
SIRA NO	KÖYÜ		TOPLU ALAN	KENDİ YERİNDE	TOPLAM	BAŞLANILAN SAYISI	EKSİK FAZLA	BİTEN	DEVAM EDEN	
	BİLALKÖY	3	0		0	0		0	0	Yer problemi var.İki arsa çakıştı.
1	YENİKÖY MEZ	1		1	1	1		1	0	Bitti. Hak sahibi yerleşti.
2	BEŞPINAR	7	5	2	7	7		7	0	Bitti. 2 kişi yerleşti. Diğerleri kura çekilecek,içmesuyu sorunu var.
3	TEPEBAĞ	16		4	4	4		4	0	Bitti.
4	KUŞAĞACI	12		12	12	12		12	0	Tamamı bitti, 8 hak sahibi taşındı.
5	DEĞİRMENTAŞI	5	5		5	5		5	0	Tamamı bitti.Kura çekilecek,içmesuyu sorunu var.
6	BAĞGÜLÜ	1		1	1	1		1	0	Bitti.
7	GÖZECİK	3		4	4	4		4	0	Bitti.
8	GÖKÇEDAL	6		6	6	6		6	0	Bitti.Elektrik direkleri dikilecek. Aboneler yapılacak.
9	İSMETPAŞA			14	14	14		14	0	Bitti.
TOPLAM		**54**	**10**	**44**	**54**	**54**	**0**	**54**	**0**	

İLİ	**ELAZIĞ**	YAPIM YÖNTEMİ	**Anahtar Teslim Götürü Bedeli İnşaat Yapım İşi**
İŞİN ADI	**Kovancılar İlçesi 12. Bölge 57 Adet Afet Konutları Yapım İşi**		
YÜKLENİCİNİN ADI SOYADI	**Atlı İnş. Gıda Canlı Hay. San. Tic. Ltd. Şti.**		
İHALE TARİHİ	**07.07.2010**	SÖZLEŞME TARİHİ	**21.07.2010**
SÖZLEŞMEYE GÖRE BİTİM TARİHİ	**21.11.2010**	SÜRELİ BİTİM TARİHİ	**22.06.2011**
İHALE TENZİLATI		KEŞİF ARTIŞ ORANI	
1.KEŞİF TUTARI		İHALE BEDELİ	**3.467.000,00 TL**
KEŞİF ARTIŞ TUTARI		ARTIŞIN İHALE BEDELİ	
TOPLAM KEŞİF TUTARI		TOPLAM İHALE BEDELİ	**3.467.000,00 TL(KDV Hariç)**
İŞİN BAŞINDAN 2010 YILI ARALIK AYI SONUNA KADAR TOPLAM HARCANAN	İHALE BEDELİ(Varsa Artış Dahil)	**2.318.498,53-TL**	
	KARARNAME FİYAT FARKI		
	TENZİLATA TABİ OLMAYAN MALZEME FİYAT FARKI		
	KDV	**417.329,74 TL**	
	TOPLAM	**2.735.828,27 TL**	
2011 YILI ÖDENEK İHTİYACI	İHALE BEDELİ(Varsa Artış Dahil)	**1.148.501,47 TL**	
	KARARNAME FİYAT FARKI		
	TENZİLATA TABİ OLMAYAN MALZEME FİYAT FARKI		
	KDV	**206.730,26 TL**	
	TOPLAM	**1.355.231,73 TL**	
İŞİN	BİTİM TARİHİ	**22.06.2011**	
	GEÇİCİ KABUL TARİHİ		
	FİZİKİ GERÇEKLEŞME %70	**NAKDİ GERÇEKLEŞME %66**	

ELAZIĞ İLİ KOVANCILAR İLÇESİ

YÜKLENİCİ: ATLI İNŞ. — ŞERİF ATLI

12.GRUP AFET KONUTLARI		**İHALE SAYISI**	**YER TESLİMİ YAPILAN**			**İNŞAAT DURUMU**		**İnşaatın Tahmini Bitim Tarihi**		**AÇIKLAMALAR**
SIRA NO	**KÖYÜ**		**TOPLU ALAN**	**KENDİ YERİNDE**	**TOPLAM**	**BAŞLANILAN SAYISI**	**EKSİK FAZLA**	**BİTEN**	**DEVAM EDEN**	
	GÖKÇEDAL AYRANIKARA MZ.	3		0	0	0		0	0	Muvafakat alınamıyor.
1	KARINCA	10		10	10	10		10	0	Tamamı bitti, hak sahipleri taşındı.
2	EKİNÖZÜ	9		9	9	9		9	0	Tamamı bitti, 8 hak sahibi taşındı.
	SOĞUKPINAR	2		0	0	0		0	0	Yol ve Muvafakat sorunu var.
	SOĞUKPINAR GÜLER MZ.	1		0	0	0		0	0	Muvafakat alınamıyor.
	SOĞUKPINAR KAMIŞLI MZ.	3		0	0	0		0	0	Muvafakat alınamıyor.
	KARABÖRK	1		0	0	0		0	0	Muvafakat alınamıyor.
3	GEDİKYURT	13	15		15	15		12	3	12 ad. Bitti,kura çekilecek,3 ad.subasman s.
4	YAZIBAŞI	6		4	4	4		4	0	Tamamı bitti, 3 hak sahibi taşındı.
5	PINARTEPE	9		6	6	6		2	4	2 ad. bitti ve hak sahipleri taşındı. 4 ad.tabliye döküldü.
6	GÜLTEPE	0		2	2	2		0	2	1 ad duvar ve çatı yapıldı, 1 ad. Tabliye döküldü.
7	HEYBET	0		2	2	2		0	2	2 ad duvar örüldü ve çatı yapıldı.
TOPLAM		**57**	**15**	**33**	**48**	**48**	**-9**	**37**	**11**	

2010 YILI YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN
(AFET KONUT, ALTYAPI VE AFET ÖNLEM) İŞLERİNE AİT CETVELİ

İLİ	ELAZIĞ	YAPIM YÖNTEMİ	Anahtar Teslim Götürü Bedeli İnşaat Yapım İşi
İŞİN ADI	Kovancılar İlçesi 13. Bölge 40 Adet Afet Konutları Yapım İşi		
YÜKLENİCİNİN ADI SOYADI	Hatipoğulları İnş. Taah. Tic. Ltd. şti.		
İHALE TARİHİ	07.07.2010	SÖZLEŞME TARİHİ	20.07.2010
SÖZLEŞMEYE GÖRE BİTİM TARİHİ	20.11.2010	SÜRELİ BİTİM TARİHİ	20.11.2010
İHALE TENZİLATI		KEŞİF ARTIŞ ORANI	
1.KEŞİF TUTARI		İHALE BEDELİ	2.813.000,00 TL
KEŞİF ARTIŞ TUTARI		ARTIŞIN İHALE BEDELİ	
TOPLAM KEŞİF TUTARI		TOPLAM İHALE BEDELİ	2.813.000,00 TL(KDV Hariç)
İŞİN BAŞINDAN 2010 YILI ARALIK AYI SONUNA KADAR TOPLAM HARCANAN	İHALE BEDELİ(Varsa Artış Dahil)		
	KARARNAME FİYAT FARKI		
	TENZİLATA TABİ OLMAYAN MALZEME FİYAT FARKI		
	KDV		
	TOPLAM		3.254.530,22 TL
2011 YILI ÖDENEK İHTİYACI	İHALE BEDELİ(Varsa Artış Dahil)		
	KARARNAME FİYAT FARKI		
	TENZİLATA TABİ OLMAYAN MALZEME FİYAT FARKI		
	KDV		
	TOPLAM		64.809.78 TL
İŞİN	BİTİM TARİHİ	27.11.2010	
	GEÇİCİ KABUL TARİHİ		
	FİZİKİ GERÇEKLEŞME % 100	NAKDİ GERÇEKLEŞME % 100	

ELAZIĞ İLİ KOVANCILAR İLÇESİ

YÜKLENİCİ: HATİPOĞULLARI İNŞ. — CEMAL KARATAŞ

13.GRUP AFET KONUTLARI		İHALE SAYISI	YER TESLİMİ YAPILAN			İNŞAAT DURUMU		İnşaatın Tahmini Bitim Tarihi		AÇIKLAMALAR
SIRA NO	KÖYÜ		TOPLU ALAN	KENDİ YERİNDE	TOPLAM	BAŞLANILAN SAYISI	EKSİK FAZLA	BİTEN	DEVAM EDEN	
1	KÖPRÜDERE	5		5	5	5		5	0	Tamamı bitti, haksahipleri taşındı
2	SARAYBAHÇE	18		18	18	18		18	0	Tamamı bitti, haksahipleri taşındı
3	ŞENOVA	10		14	14	14		14	0	Tamamı bitti, haksahipleri taşındı
4	KARAMAN	5		3	3	3		3	0	Tamamı bitti, haksahipleri taşındı
	KARAMAN YAMAÇOVA MZ.	2						0	0	1kişi Toplu alan istiyor. 1kişi ise konutunu 3 katlı kendi yaptı.
TOPLAM		40	0	40	40	40	0	40	0	

2010 YILI YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN
(AFET KONUT, ALTYAPI VE AFET ÖNLEM) İŞLERİNE AİT CETVELİ

İLİ	ELAZIĞ	YAPIM YÖNTEMİ	Anahtar Teslim Götürü Bedeli İnşaat Yapım İşi
İŞİN ADI	Kovancılar İlçesi 14. Bölge 54 Adet Afet Konutları Yapım İşi		
YÜKLENİCİNİN ADI SOYADI	Gür-Hal Yapı İnş . Ltd. Şti. ve Gökçedal İnş. Tic. Ltd. Şti (İş Ortaklığı)		
İHALE TARİHİ	07.07.2010	SÖZLEŞME TARİHİ	28.07.2010
SÖZLEŞMEYE GÖRE BİTİM TARİHİ	28.11.2010	SÜRELİ BİTİM TARİHİ	28.11.2010
İHALE TENZİLATI		KEŞİF ARTIŞ ORANI	
1.KEŞİF TUTARI		İHALE BEDELİ	3.900.000,00 TL
KEŞİF ARTIŞ TUTARI		ARTIŞIN İHALE BEDELİ	
TOPLAM KEŞİF TUTARI		TOPLAM İHALE BEDELİ	3.900.000,00-TL(KDV Hariç)
İŞİN BAŞINDAN 2010 YILI ARALIK AYI SONUNA KADAR TOPLAM HARCANAN	İHALE BEDELİ(Varsa Artış Dahil)		
	KARARNAME FİYAT FARKI		
	TENZİLATA TABİ OLMAYAN MALZEME FİYAT FARKI		
	KDV		
	TOPLAM		3.245.574,69 TL
2011 YILI ÖDENEK İHTİYACI	İHALE BEDELİ(Varsa Artış Dahil)		
	KARARNAME FİYAT FARKI		
	TENZİLATA TABİ OLMAYAN MALZEME FİYAT FARKI		
	KDV		
	TOPLAM		1.356.425,31 TL
İŞİN	BİTİM TARİHİ	30.04.2011	
	GEÇİCİ KABUL TARİHİ		
	FİZİKİ GERÇEKLEŞME % 70	NAKDİ GERÇEKLEŞME %70	

ELAZIĞ İLİ KOVANCILAR İLÇESİ

YÜKLENİCİ: GÜRHAL-GÖKÇEDAL İNŞ. — İLHAMİ YILDIRIM

14.GRUP AFET KONUTLARI		İHALE SAYISI	YER TESLİMİ YAPILAN			İNŞAAT DURUMU		İnşaatın Tahmini Bitim Tarihi		AÇIKLAMALAR
SIRA NO	KÖYÜ		TOPLU ALAN	KENDİ YERİNDE	TOPLAM	BAŞLANILAN SAYISI	EKSİK FAZLA	BİTEN TESLİM	DEVAM EDEN	
	DURMUŞLAR	4		0	0	0		0	0	Mülkiyet sorunu var. Çözülemedi.
	DURMUŞLAR İNCEDAL MZ.	10		0	0	0		0	0	Mülkiyet sorunu var. Çözülemedi.
1	BAYRAMYAZI	14		16	16	16		14	2	14 ad. bitti ve 6 hak sahibi taşındı. 2 ad.mutfak dolapları takıldı, fayanslar yapıldı.
2	DEMİRCİ	17		9	9	9		7	2	7 ad. bitti ve 5 hak sahibi taşındı. 2 ad.duvarlar örüldü.
3	AŞ. MİRAHMET YALNIZÇAM MZ.	9		6	6	6		6	0	Tamamı bitti ve 6 hak sahibi taşındı.
4	ÇAKIRKAŞ CUMHURİYET MAH.	0		10	10	10		0	10	7 ad.duvar,sıva ve dış boya bitti. 3 ad. Duvarlar örüldü
5	ÇAKIRKAŞ DUVALLI MAH.	0		2	2	2		0	2	2 ad.duvar ve çatı bitti.
6	ÇAKIRKAŞ HOŞMAT MAH.	0		1	1	1		0	1	Tabliye dökülecek.
7	FATİH	0		4	4	4		0	4	4 ad.duvar, çatı ve kaba sıva bitti.
8	ÇAYBAŞI	0		2	2	2		0	1	1 ad.duvar ve çatı bitti. 1 ad. Temel seviyesi
TOPLAM		54		50	50	50	-4	27	22	

2010 YILI YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN
(AFET KONUT, ALTYAPI VE AFET ÖNLEM) İŞLERİNE AİT CETVELİ

İLİ	ELAZIĞ	YAPIM YÖNTEMİ	Anahtar Teslim Götürü Bedeli İnşaat Yapım İşi
İŞİN ADI	Kovancılar İlçesi 15. Bölge 67 Adet Afet Konutları Yapım İşi		
YÜKLENİCİNİN ADI SOYADI	Mega Açılmİnş. Mad. Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti. ve Çetin İnş. Teks. Tur. Ürt. San. Tic. Ltd. Şti (İş Ortaklığı)		
İHALE TARİHİ	07.07.2010	SÖZLEŞME TARİHİ	27.07.2010
SÖZLEŞMEYE GÖRE BİTİM TARİHİ	27.11.2010	SÜRELİ BİTİM TARİHİ	27.11.2010
İHALE TENZİLATI		KEŞİF ARTIŞ ORANI	
1.KEŞİF TUTARI		İHALE BEDELİ	4.155.000,00 TL
KEŞİF ARTIŞ TUTARI		ARTIŞIN İHALE BEDELİ	
TOPLAM KEŞİF TUTARI		TOPLAM İHALE BEDELİ	4.155.000,00 TL(KDV Hariç)
İŞİN BAŞINDAN 2010 YILI ARALIK AYI SONUNA KADAR TOPLAM HARCANAN	İHALE BEDELİ(Varsa Artış Dahil)		
	KARARNAME FİYAT FARKI		
	TENZİLATA TABİ OLMAYAN MALZEME FİYAT FARKI		
	KDV		
	TOPLAM		4.037.513,17 TL
2011 YILI ÖDENEK İHTİYACI	İHALE BEDELİ(Varsa Artış Dahil)		
	KARARNAME FİYAT FARKI		
	TENZİLATA TABİ OLMAYAN MALZEME FİYAT FARKI		
	KDV		
	TOPLAM		865.386,83 TL
İŞİN	BİTİM TARİHİ	24.05.2011	
	GEÇİCİ KABUL TARİHİ		
	FİZİKİ GERÇEKLEŞME % 87	NAKDİ GERÇEKLEŞME %82,35	

ELAZIĞ İLİ KOVANCILAR İLÇESİ

YÜKLENİCİ: MEGA AÇILIM-ÇETİN İNŞ. — SEFA BOZDAĞ

15.GRUP AFET KONUTLARI		İHALE SAYISI	YER TESLİMİ YAPILAN			İNŞAAT DURUMU		İnşaatın Tahmini Bitim Tarihi		AÇIKLAMALAR
SIRA NO	KÖYÜ		TOPLU ALAN	KENDİ YERİNDE	TOPLAM	BAŞLANILAN SAYISI	EKSİK FAZLA	BİTEN	DEVAM EDEN	
1	AŞ. MİRAHMET	12		9	9	9		9	0	Bitti. 4 haksahibi taşındı.
2	AŞ. MİRAHMET ALUÇ MZ.	3		1	1	1		1	0	Bitti, haksahibi taşındı.
3	YK. MİRAHMET	4		4	4	4		4	0	Bitti.
4	KARASUNGUR	21	19	4	24	24		24	0	Bitti. 12 haksahibi taşındı.içmesuyu sorunu
5	İSAAĞA MEZRASI	11		10	10	10		10	0	Bitti. 3 haksahibi taşındı.
	YONCALIBAYIR	16			0	0		0	0	Yerseçimi ve zemin problemi var. Toplu alan beğenilmedi. Muvafakat getirmediler. Altı ahır,üstü konut istiyorlar
6	ÇAKIRKAŞ YOLBÜKÜ MAH.		12	7	19	19		12	7	12 ad. toplu alanda boya yapılıyor,dolaplar takılıyor,5tanesi tabliye,2 ad subasman seviyesinde.
TOPLAM		67	31	35	67	67	0	60	7	

2010 YILI YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN
(AFET KONUT, ALTYAPI VE AFET ÖNLEM) İŞLERİNE AİT CETVELİ

İLİ	ELAZIĞ	YAPIM YÖNTEMİ	Anahtar Teslim Götürü Bedeli İnşaat Yapım İşi
İŞİN ADI	Kovancılar İlçesi 16. Bölge 62 Adet Afet Konutları Yapım İşi		
YÜKLENİCİNİN ADI SOYADI	Cezayir AYDIN İnş . Müt.		
İHALE TARİHİ	07.07.2010	SÖZLEŞME TARİHİ	22.07.2010
SÖZLEŞMEYE GÖRE BİTİM TARİHİ	23.11.2010	SÜRELİ BİTİM TARİHİ	25.05.2011
İHALE TENZİLATI		KEŞİF ARTIŞ ORANI	9,72%
1.KEŞİF TUTARI		İHALE BEDELİ	4.470.000,00 TL
KEŞİF ARTIŞ TUTARI		ARTIŞIN İHALE BEDELİ	434.422,70 TL
TOPLAM KEŞİF TUTARI		TOPLAM İHALE BEDELİ	4.904.422,70 TL(KDV Hariç)
İŞİN BAŞINDAN 2010 YILI ARALIK AYI SONUNA KADAR TOPLAM HARCANAN	İHALE BEDELİ(Varsa Artış Dahil)	3.467.778,90 TL	
	KARARNAME FİYAT FARKI		
	TENZİLATA TABİ OLMAYAN MALZEME FİYAT FARKI		
	KDV	761.219,77 TL	
	TOPLAM	4.228.998,67 TL	
2011 YILI ÖDENEK İHTİYACI	İHALE BEDELİ(Varsa Artış Dahil)		
	KARARNAME FİYAT FARKI		
	TENZİLATA TABİ OLMAYAN MALZEME FİYAT FARKI		
	KDV	121.576,33 TL	
	TOPLAM	797.000,36 TL	
İŞİN	BİTİM TARİHİ	25.05.2011	
	GEÇİCİ KABUL TARİHİ		
	FİZİKİ GERÇEKLEŞME %95	NAKDİ GERÇEKLEŞME %86	

ELAZIĞ İLİ KOVANCILAR İLÇESİ

YÜKLENİCİ: CEZAYİR AYDIN — BÜLENT AYDIN

16.GRUP AFET KONUTLARI		İHALE SAYISI	YER TESLİMİ YAPILAN			İNŞAAT DURUMU		İnşaatın Tahmini Bitim Tarihi		AÇIKLAMALAR
SIRA NO	KÖYÜ		TOPLU ALAN	KENDİ YERİNDE	TOPLAM	BAŞLANILAN SAYISI	EKSİK FAZLA	BİTEN TESLİM EDİLEN	DEVAM EDEN	
1	KAYALIK	29		29	29	29		29	0	Tamamı bitti, 14 haksahibi taşındı
2	YILBAŞI	4		3	3	3		3	0	Tamamı bitti, 3 haksahibi taşındı
3	GÖÇMEZLER	8		8	8	8		8	0	Tamamı bitti, 4 haksahibi taşındı
4	AŞ. DEMİRCİ	6		5	5	5		5	0	Tamamı bitti, 5 haksahibi taşındı
5	YK. KANATLI	15		15	15	15		15	0	5 haksahibi taşındı, diğerleri bitmek üzere.
6	YK. DEMİRCİ			7	7	7		0	7	iç ve dış sıvalar yapıldı,alçı sıva duruyor.
	ŞENOVA			1	1	1		0	1	Temel seviyesinde
TOPLAM		62		68	68	68	6	60	8	

08. 03. 2010 TARİHİNDE ELAZIĞ KARAKOÇAN BAŞYURT MERKEZLİ 6.0 ŞİDDETİNDE MEYDANA GELEN DEPREM NEDENİYLE ELAZIĞ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜNCE HAKSAHİBİ AİLELER İÇİN İHALE EDİLEN AFET KONUTLARI DURUM İCMALİ (11.01.2011)

İLÇESİ	İHALE GRUP ADI	YERLEŞİM YERİ SAYISI	İHALE EDİLEN KONUT SAYISI	BİTEN	DEVAM EDEN	TOPLAM	BAŞLANILMAYAN KONUT SAYISI
PALU	1.GRUP AFET KONUTLARI	13	75	60	5	65	-10
PALU	2.GRUP AFET KONUTLARI	5	81	76	5	81	0
PALU	3.GRUP AFET KONUTLARI	İHALE İPTAL EDİLDİ					
PALU	4.GRUP AFET KONUTLARI	13	77	26	58	84	7
TOPLAM		31	233	162	68	230	-3
KARAKOÇAN	5.GRUP AFET KONUTLARI	13	56	34	26	60	4
KARAKOÇAN	6.GRUP AFET KONUTLARI	10	64	48	22	70	6
KARAKOÇAN	7.GRUP AFET KONUTLARI	12	52	51	0	51	-1
KARAKOÇAN	8.GRUP AFET KONUTLARI	9	54	32	13	45	-9
KARAKOÇAN	9.GRUP AFET KONUTLARI	5	27	0	27	27	0
TOPLAM		49	253	165	88	253	0
KOVANCILAR	10.GRUP AFET KONUTLARI	14	56	50	9	59	3
KOVANCILAR	11.GRUP AFET KONUTLARI	9	54	54	0	54	0
KOVANCILAR	12.GRUP AFET KONUTLARI	7	57	37	11	48	-9
KOVANCILAR	13.GRUP AFET KONUTLARI	4	40	40	0	40	0
KOVANCILAR	14.GRUP AFET KONUTLARI	8	54	27	22	49	-5
KOVANCILAR	15.GRUP AFET KONUTLARI	6	67	60	7	67	0
KOVANCILAR	16.GRUP AFET KONUTLARI	6	62	60	8	68	6
	TOPLAM	54	390	328	57	385	-5

GENEL TOPLAM	134	876	655	213	868	-8



İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, benden önceki harcama yetkilisinden almış olduğum bilgiler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Elazığ …./…./2011

Nazif BİLGİNOĞLU
Genel Sekreter

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, benden önceki harcama yetkilisinden almış olduğum bilgiler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Elazığ …./…./2011

Cemil YATKIN
Genel Sekreter Yardımcısı

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, benden önceki harcama yetkilisinden almış olduğum bilgiler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Elazığ …./…./2011

Mustafa PRİNÇCİ
Genel Sekreter Yardımcısı

MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde;

Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.

İdaremizin 2008 Mali yılı Faaliyet Raporunun "III/A- Mali Bilgiler" bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. …./…../2011

Ömer YALÇIN
Mali Hizmetler Müdürü

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, benden önceki harcama yetkilisinden almış olduğum bilgiler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Elazığ …./…./2011

Ömer YALÇIN
Mali Hizmetler Müdürü

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, benden önceki harcama yetkilisinden almış olduğum bilgiler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Elazığ …./…./2011

Sabahattin UÇAR
Plan Proje Yatırım ve
İnşaat Müdürü

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, benden önceki harcama yetkilisinden almış olduğum bilgiler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Elazığ …./…./2011

Toraman ÖZPOLAT
Yazı İşleri Müdürü

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, benden önceki harcama yetkilisinden almış olduğum bilgiler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Elazığ …./…./2011

Yavuz POLAT
Destek Hizmetleri Müdürü

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, benden önceki harcama yetkilisinden almış olduğum bilgiler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Elazığ …./…./2011

Selin Deniz AKDENİZ
Hukuk Müşaviri

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, benden önceki harcama yetkilisinden almış olduğum bilgiler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Elazığ …./…./2011

Müfid ERDEM
İnsan Kaynakları
ve
Eğitim Müdürü

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, benden önceki harcama yetkilisinden almış olduğum bilgiler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Elazığ …. / …. / 2011

İlhami ŞAHİN
Emlak ve İstimlak Müdürü

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, benden önceki harcama yetkilisinden almış olduğum bilgiler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Elazığ …. / …. / 2011

Adnan ÇEKER
İmar ve Kentsel
İyileştirme Müdürü

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, benden önceki harcama yetkilisinden almış olduğum bilgiler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Elazığ …./…./2011

Nebi ÇAĞRAŞ
Yol ve Ulaşım Hiz.Müd.

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, benden önceki harcama yetkilisinden almış olduğum bilgiler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Elazığ …./…./2011

H.Ulvi ALTAŞ
Su Kanal Hiz.Müdürü



6 Ocak 2010 Çarşamba Yıl: 24 Sayı: 7154 Fiyatı : 30 Kr

FIRAT

ATATÜRKÇÜLÜK ÖLMEZ BİR ESER, YÜKSELEN BİR SEREFTİR.

GÜNLÜK BAĞIMSIZ SİYASİ GAZETE

Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Altınyuva'yı ziyaret eden Bilginoğlu:

Desteğe hazırız

Bilginoğlu, İl Özel İdaresi olarak talep edilen her konuda ajansın çalışmalarına destek vereceklerini belirtti.

Deniz Aslan / İl özel İdaresi Genel Sekreter Naşit Bilginoğlu ve AB Proje Ofisi yöneticileri, merkez Malatya'da bulunan Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği'ne atanan hemşehrimiz Fethi Altınyuva'yı yeni görevinde kutlamak ziyaretinde bulunmak üzere Malatya'da makamında ziyaret ettiler.

Devamı 2'de



ULUOVA

"Hakimiyet Milletindir."

ELAZIĞ'I SEVENLERİN GÜNLÜK BAĞIMSIZ SİYASİ GAZETESİ

YIL : 58 SAYI: 17641 29 NİSAN 2010 PERŞEMBE FİYATI: 30 KR

DAİMA EN İYİ HİZMET

şarkgaz selçukgaz

ÖZ MALINIZ

Özel İdare personeline eğitim semineri



● Uluova – İl Özel İdaresi teknik personeline Netcad firmasının eğitmen hocası Ümit Yiğit tarafından Ebeoğlu Halk Eğitim Merkezi'nin bilgisayar odasında bilgisayarlarında hafta içi her gün saat 09.00 seminerleri verdiğini. Eğitim seminerleri İl Özel İdaresi'nin konuşlu ilçelerden ve ilde proje yapım ekibi kullanıcı için teknik personeli katılıyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Naşit Bilginoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğimizde kurumsal kapasite artırımı çalışmalarımız devam etmekte olup, bu anlamdaki çalışmalarımız toplam kalite yönetimi ve ISO 9001 ve ISO 14001 ve OHSAS belgelerini almaya çalışmaktayız ve bilgisayarlarımızın elektrik ateşe çalışmalarını devam ettirmekteyiz. **Devamı Sayfa 2'de**

108 proje gündemde



2010 yılı KÖYDES ödenek ve programları açıklandı. Naşit Bilginoğlu

● Uluova – İl Özel İdaresi 2010 yılı KÖYDES ödeneği ve programları açıklandı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Naşit Bilginoğlu yaptığı yazılı açıklamada şöyle dedi: "Valimizin girişim ve himayeleri, İl Genel Meclis Başkanımız ve Meclisimizin de bu yönlü düşünce ve kararı neticesinde; İl Genel Meclisimizin 09.07.2009 tarih ve 052 nolu aldığı kararla İlimizdeki yoksulların desteklenmesi, yönlendirilmesi ve öncelikli olarak yoksul kadınların girişimci hale getirilmesi ve meslek edinmelerinin sağlanması amacıyla İl Özel İdaresi 2009 yılı bütçesinden, Elazığ İl Özel İdaresi ile Türkiye İnsanı Önleme Vakfı (TİSVA) arasında düzenlenecek protokol çerçevesinde 100.000 TL mikrokredi verilmesi uygun görülmüştür.

Bilginoğlu açıklamasında, kullanılacak kaynak ve dağıtım hakkında da şu bilgileri verdi: "2010 yılında KÖYDES (Köylere Hizmet Götürme Projesi) programının Dağıtılmasına yönelik yapılan İdrisi esasları çerçevesinde 67 proje ve köy yolları projeleri kapsamında 108 proje için 6 milyon 579 bin 280 TL kaynak kullanılacak.

Bilginoğlu açıklamasında, kullanılacak kaynak ve dağıtım hakkında şu bilgileri verdi: "2010 yılında KÖYDES ödenek ve programları açıklandı. Naşit Bilginoğlu yaptığı yazılı açıklamada şöyle dedi: "İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Naşit Bilginoğlu yaptığı yazılı açıklamada, İl Özel İdaresi'nin 2010 yılı KÖYDES ödeneği ve programları hakkında bilgiler verdi. Buna göre, KÖYDES Programı çerçevesinde içme suyu projesi kapsamında 67 proje ve köy yolları projeleri kapsamında 108 proje için 6 milyon 579 bin 280 TL kaynak kullanılacak.

Bilginoğlu açıklamasında, kullanılacak kaynak ve dağıtım hakkında şu bilgileri verdi: "2010 yılında KÖYDES (Köylere Hizmet Götürme Projesi) programının Dağıtılmasına yönelik yapılan İdrisi esasları çerçevesinde 67 proje ve köy yolları projeleri kapsamında 108 proje için 6 milyon 579 bin 280 TL kaynak kullanılacak.

Yeni Çağ

e-mail: birlikmedya@gmail.com

YIL: 10 SAYI: 3663 Fiyatı: 30 KR

"Hizm Sarsılmaz" Günlük Bağımsız Siyasi Gazete 11 ARALIK 2010 CUMA

Tarla fareleri ile toplu mücadele için 600 kilo zehirli buğday dağıtıldı. Tarım İl Müdürü Emir:

Özel İdare kaynaklı bir proje hazırladık

Bahtiyar Ersoy / Elazığ Tarım İl Müdürü Ragıb Emir, Elazığ'da hızla çoğalan tarla farelerinin neden olduğu ürün kayıplarının önüne geçmek için 600 kilo zehirli buğday dağıtılmasına yapıldığını söyledi. Tarla farelerine karşı tek çözüm yolunun toplu mücadele olduğunu ifade eden Emir, şunları söyledi: "Son yıllarda Ülkemiz genelinde ve ilimizde hızla çoğalan tarla farileri tarım alanlarında ve ürünlerde önemli kayıplara yol açmaktadır. Bu kayıpların önüne geçmek için 600 kilo zehirli buğday dağıtılmasına yapılmaktadır. Dağıtılacak zehirli buğdaylar Bitki Koruma Şube Müdürlüğümüzde imhaya gönderilecek şekilde muhafaza edilmektedir."



Emir, "Hedef bölgemizdeki çiftçilerimizin bilinçsiz dağıtılan hurda zehirli buğday tanesini almaları mümkündür. Ayrıntılı bilgi almak için Bitki Koruma Şube Müdürlüğümüzün imhaya gönderilecek çalışmalarımız devam etmektedir. Tarla fareleri kültürbitkileri ile çayır ve mera bitkilerinin yeşil aksam, tohum ve meyvelerini ayrıca meyvelik ve ormanlarda fidanların gövdelerini (özellikle kök boğaz) yemek, kemirmek, tırpmek ve kotarmak suretiyle zarar yaparlar. Devamı Sayfa 2'de

29 Nisan 2010 Perşembe Yıl: 24 Sayı: 7251 Fiyatı : 30 Kr

FIRAT

ATATÜRKÇÜLÜK ÖLMEZ BİR ESER, YÜKSELEN BİR SEREFTİR.

GÜNLÜK BAĞIMSIZ SİYASİ GAZETE

İl Özel İdaresi 2010 yılı KÖYDES ödenek ve programları açıklandı

2010 ödeneği 6.5 milyon TL

Deniz Aslan / Bazı Vatandaşlarımız İl Özel İdaresi 2010 yılı KÖYDES ödeneği ve programları açıklandı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Naşit Bilginoğlu yaptığı yazılı açıklamada, İl Özel İdaresi'nin 2010 yılı KÖYDES ödeneği ve programları hakkında bilgiler verdi. Buna göre, KÖYDES Programı çerçevesinde içme suyu projesi kapsamında 67 proje ve köy yolları projeleri kapsamında 108 proje için 6 milyon 579 bin 280 TL kaynak kullanılacak.

Bilginoğlu açıklamasında, kullanılacak kaynak ve dağıtım hakkında da şu bilgileri verdi: "2010 yılında KÖYDES (Köylere Hizmet Götürme Projesi) programının Dağıtılmasına yönelik yapılan İdrisi esasları çerçevesinde 67 proje ve köy yolları projeleri kapsamında 108 proje için 6 milyon 579 bin 280 TL kaynak kullanılacak. Bilginoğlu açıklamasında, kullanılacak kaynak ve dağıtım hakkında da şu bilgileri



İl Özel İdaresi'nin 2010 yılı KÖYDES ödenek ve programları açıklanırken, KÖYDES Programı çerçevesinde içme suyu projesi kapsamında 67 proje ve köy yolları projeleri kapsamında 108 proje için 6 milyon 579 bin 280 TL kaynak kullanılacak.



Devamı 2.Sayfada

NURHAK

Günlük Siyasi Gazete

Yıl: 38 Sayı: 11335 12 EKİM 2010 PAZARTESİ Fiyatı: 30 KR Kuruluş : 31.07.1972

İl Özel İdaresi ve Türkiye İsrafı Önleme Vakfı işbirliği neticesinde

Mikrokredi projesi hayata geçirilecek

Bilginoğlu, "Mikrokredi iş yapma fikri olup gelir getirici bir faaliyette bulunmak üzere küçük bir başlangıç sermayesine ihtiyacı olan dar gelirli bayanlara imkan verilmesidir. İlk başladığında sadece tek kredi çeşidi ile uygulanan mikro kredi şu an temel (iş) kredisi, girişimci kredisi, hayvancılık kredisi ve mücadeleci üye (dikenci) kredisi ile dört ayrı kredi çeşidi ile ihtiyaç sahiplerine hizmet vermektedir" dedi.



Neslihan Kaya - İl Özel İdaresi'nin katkılarıyla hayata geçirilen, asıl amacı yoksulları mikrokredi vererek iş ittihamı sağlamak olan Türkiye İsrafı Önleme Vakfı'nın Elazığ Merkez ve Kovancılar ilçe şubelerinin açılışı 17 Ekim'de yapılacak.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Naşit Bilginoğlu, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Valimizin girişim ve himayeleri, İl Genel Meclis Başkanımız ve Meclisimizin de bu yönlü düşünce ve kararı neticesinde; İl Genel Meclisimizin 09.07.2009 tarih ve 052 nolu aldığı kararla İlimizdeki yoksulların desteklenmesi, yönlendirilmesi ve öncelikli olarak yoksul kadınların girişimci hale getirilmesi ve meslek edinmelerinin sağlanması amacıyla İl Özel İdaresi 2009 yılı bütçesinden, Elazığ İl Özel İdaresi ile Türkiye İnsanı Önleme Vakfı (TİSVA) arasında düzenlenecek protokol çerçevesinde 100.000 TL mikrokredi verilmesi uygun görülmüştür.

Devamı Sayfa 2'de



KURUMSAL KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Güçlü Yönler

* İl yönetiminin (Vali) desteği.
* Kurum yöneticilerinin idari becerilerinin iyi olması.
* Bütçesini kendisinin yapması ve kendi meclisinin onaylaması.
* Hizmet binalarının fiziki bakımdan yeterli olması.
* Toprak ve su analiz laboratuar varlığı.
* Eğitim ve Sağlık hizmetlerinin yeterli seviyede olması.
* Makine parkının (iş ve tarım) sayısal olarak yeterli olması.
* Hedef kitle ve diğer ilgililerden gelen görüş ve şikâyetlerin değerlendirilmesi.
* Ulaşım ağ sisteminin yeterli olması.

Zayıf Yönler

* Yatırım tercihlerinin yerinde kullanılamaması.
* Meslek içi eğitim yetersizliği.
* Tarım arazileri envanterinin olmaması.
* Kaynak yetersizliği.
* Ücret dengesizliği, aynı işi yapan kişilerin farklı ücret alması.
* Nitelikli personel eksikliği.
* Olumsuzlukların çabuk unutulması (deprem gibi).
* İlçeler arası ve merkez ile ilçeler arası hizmet düzeyi farkı.
* Turizm çeşitlerinin yeterince tanıtılamaması.
* Kırsal alanda gelir düzeyinin düşük oluşu.
* İl Özel İdaresi ile ilçe yönetimleri ve belediyeler arasında organizasyon eksikliği.
* Tarımsal sulama projelerinin yavaş ilerlemesi.
* 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planının olmaması.
* Hayvansal üretimin yeterince desteklenmemesi.
* AR-GE, pazarlama, halkla ilişkilerdeki eksiklik.
* Toplam kalite yönetiminin kurum içinde yeterince uygulanmaması.
* Üst ve benzer kurumlardaki yetki ve görev çakışmaları.
* Halk sağlığı, AÇS - AP hizmet binasının fiziki bakımdan yetersiz olması.

Fırsatlar

* İlin istihdama yönelik Teşvik Yasası kapsamında olması.
* Tarım arazilerinin verimli olması.
* Halkın teknolojiye ve yeniliklere duyarlı olması.
* Eğitime %100 Destek Kampanyası vergi indirimi.
* Gelişmeye uygun coğrafyasının olması (iklim, toprak, turizm).
* İlin doğalgaz projesi kapsamına alınması ve projesinin hayata geçirilmesi.
* İnşaat malzemelerinin temininde ilin uygun konumda olması (taş, çimento).
* Güçlü bir yerel basının varlığı.
* Sanayiye yönelik üzüm üretimine uygun olması.
* Hızlı gelişen işbirliğine açık, bölge ihtiyaçlarına duyarlı üniversitenin varlığı.
* Yeraltı zenginlikleri.
* Tarihi - turistik alanların varlığı.
* İlde küçük ve büyük ölçekli sanayi sitesinin bulunması.
* Tarım arazilerinin organik tarıma elverişli olması.
* İlin bir yarımada olması nedeniyle sulu tarım ve su ürünleri yetiştirilirciğine uygun olması.
* Genel sağlık sektöründe bölgeye hizmet verebilecek şekilde hastahane kapasitesine sahip olması.
* Sokakta yaşayan veya çalışan çocuklara yönelik rehabilitasyon merkezinin olması.

Tehditler

* İlin birinci derecede deprem kuşağında olması.
* Çarpık şehirleşme ve dağınık yerleşim alanları.
* Çevre kirliliği (su, hava, toprak).
* Verimli tarım arazilerinin yerleşim ve sanayi alanları olarak kullanılması.
* Tarımsal ilaç ve gübre tüketiminin kontrol edilememesi (ilaçların reçeteye bağlanmaması).
* Sürekli değişen mevzuat.
* Merkez ilçenin aşırı hızlı büyümesi ve sürekli göç alması buna bağlı olarak işsizliğin artması.
* Doğal afetler (don, dolu, sel, yangın).
* Yerel baskı gruplarının ihtiyaç analizine dayalı olmayan yeni yatırım beklentileri (okul-yol-sulama-tarım-hayvancılık gibi).
* Tarım arazilerin parçalı ve küçük olması, arazi toplulaştırmasının yetersizliği.
* Halkın sosyal güvencesinin eksikliği.
* Siyasal baskılar (genel).
* Fizibilitesiz yatırımlar.
* İl içi gelir dağılımı eşitsizliği.
* İhale süresinin uzun olması nedeniyle mal ve hizmet alımının gecikmesi.
* Tarım arazilerinin erozyon tehdidi altında olması.
* Hazar gölüne evsel atıkların deşarjı.
* Bakanlık ödeneklerinin zamanında tahsis edilmemesi.
* Uygun bitki desenlerinin yerleşmemiş olması.
* Çevre bilincinin yetersiz oluşu.

Değerlendirme

İş disiplini, planlı çalışma mantığı, kurum kültürü ve liderlik vasıfları güçlü bir Özel İdare yaratmak için tüm eğitim faaliyetleri desteklenmeli, uygun işe uygun personel yönetim anlayışı üzerinde odaklanılmalıdır. Görev ve yetki çakışmasının önlenmesi için süreç akışlarının doğru tespit edilmeli hizmet etkinliğinin sağlanması için toplam kalite yönetimi prensiplerinin kurumda esas alınmalıdır.

Birimler arasında iletişimi güçlendirmek için toplantılar, sosyal faaliyetler ile takım çalışması ruhu personele aşılanmalıdır. Dikey hiyerarşik yapılanmadan uzaklaşılmalı iş ve işlemlerin akışkanlığının artırılması için gerekli tedbirler alınmalıdır.

İdaremiz stratejik planda bulunan “Kurumsal Kapasitenin Oluşturulması ve Geliştirilmesi” stratejik amacı çerçevesinde gerçekleştirmeyi planladığı Yönetim Bilgi Sistemi içersinde bir "Performans Bilgi Sistemi" oluşturmak hedefleri arasına almalı bununla birlikte “ Kurum Ortak Veri Tabanı “ ve “ Coğrafi Bilgi Sistemi “ çalışmalarını biran önce tamamlamalıdır. Bunlar tamamlandığı takdirde; daha kolay ve güvenilir veri elde edilmesine olanak sağlanacaktır.

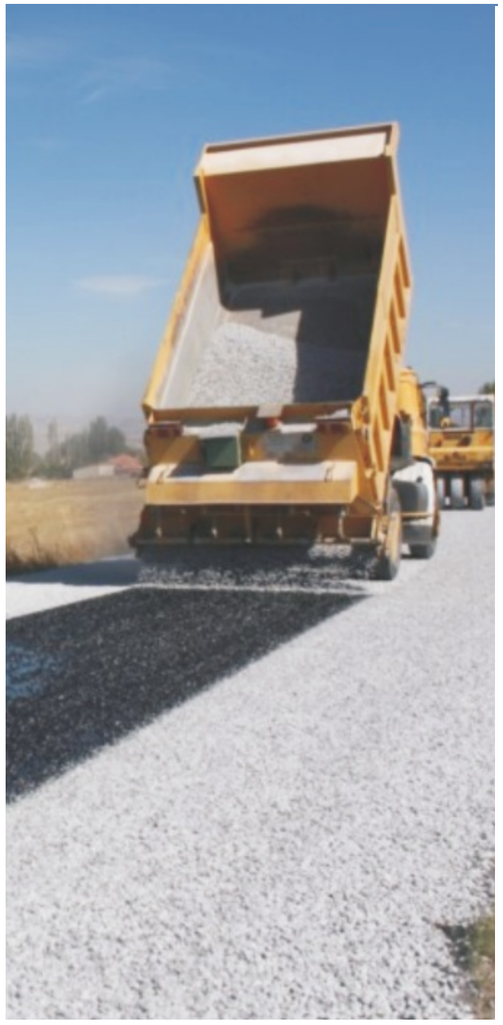





İL ÖZEL İDARESİ
"HARPUT SÖT KALESİ"
ELAZIĞ

Elazığ İl Özel İdaresi

Malatya Yolu 3. Km ELAZIĞ
Tel : (0 424) 247 53 27 - Fax : (0 424) 247 47 96
www.elazigozelidaresi.gov.tr
